

旁站监理记录

DAAK-B14

项目名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 007

日期及气候: 2016 年 8 月 17 日 晴 27°C

工程地点: 大安市舍力镇


旁站监理部位: 车库、水泵房屋面砼浇筑

旁站监理开始时间: 8:15

旁站监理结束时间: 12:00

施工情况:

施工人员 11 人 (技术员 1 人、木工 2 人、钢筋工 2 人、瓦工 5 人, 现场指挥人员 1 人), 插入式震动棒一台, 泵车一台, 砼车 6 辆不间断向泵车提供混凝土, 使用白城市恒达建筑材料责任有限公司商品砼 75m³, 砼标号为 C30。先浇筑车库, 再浇筑水泵房, 一台插入式震动棒及时跟随振捣密实, 振捣后瓦工及时抹平覆膜保湿。

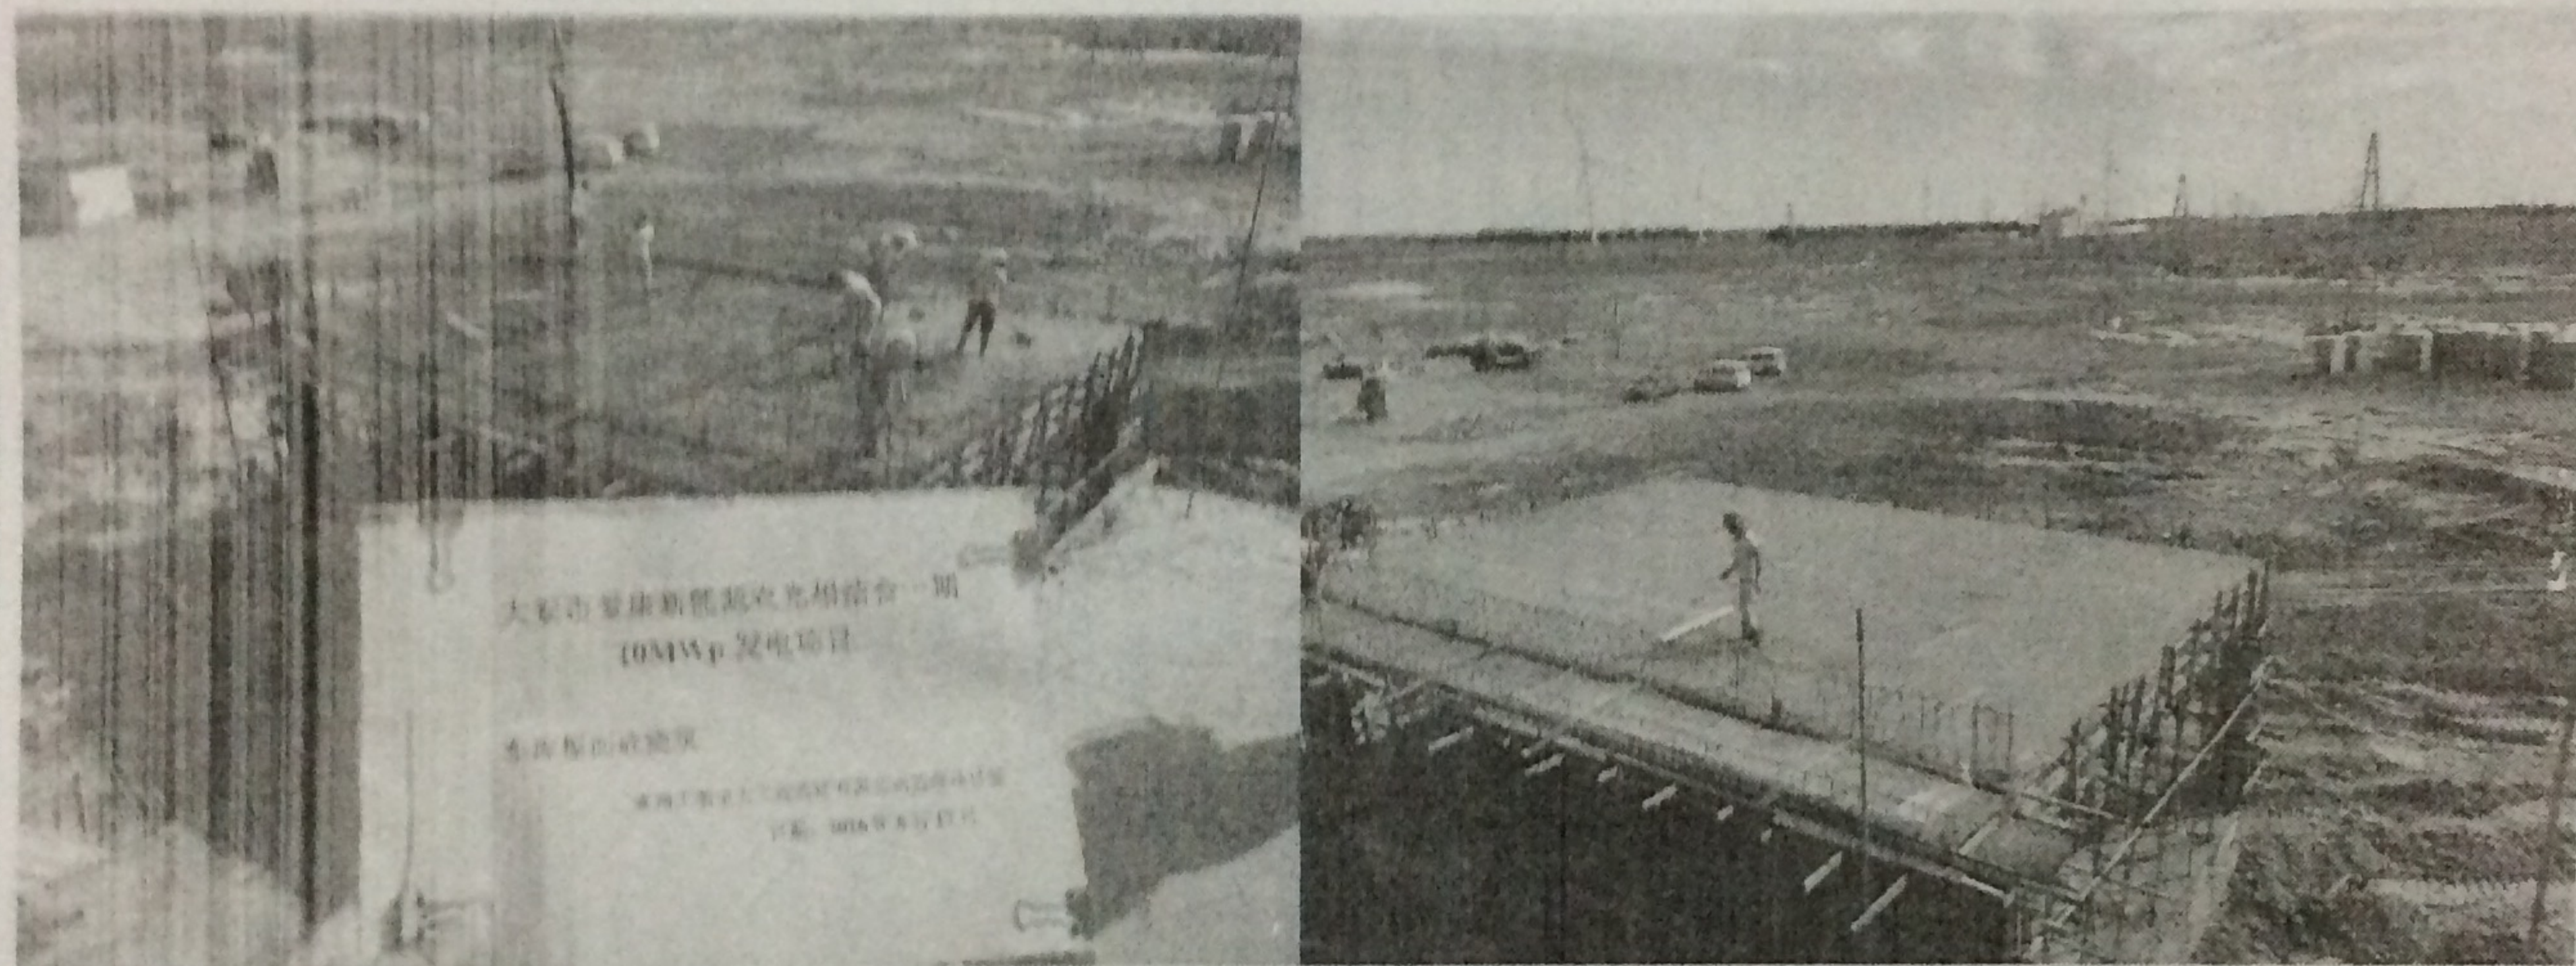

监理情况:

浇筑前检查屋面钢筋型号, 规格, 搭接长度, 符合图纸要求。检查到场商品砼随车料单, 砼标号为 C30, 现场见证取样预留砼试件 2 组。

发现问题及处理方法: 浇筑前现马镫不够, 要求加垫马镫。

备注:

项目部: 吉林白城地建建筑工程股份有限公司松

质检员:

(Signature)

2016 年 08 月 17 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: *(Signature)*

2016 年 08 月 17 日

本表一式三份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存一份, 项目监理机构存一份、承包单位存一份。
