

旁站监理记录

DAAK-B14

项目名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：009

日期及气候：2016 年 10 月 10 日 晴 12℃

工程地点：大安市舍力镇


旁站监理的部位或工序：1#、2#、3#、4#箱逆变基础砼浇筑

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：12:30

施工情况：

现场施工人员 20 人（技术员 1 人、木工 8 人、瓦工 6 人、钢筋工 5 人），技术人员及施工人员均到位。插入式振动棒一台，吊车一辆，砼车 5 辆不间断提供混凝土，使用白城市恒达建筑材料责任有限公司商品砼 65m³，砼标号为 C30。从 1#到 4#依次浇筑，先浇基础柱，后浇基础梁板，浇筑时分层振捣，振捣完成后放入预埋件，技术员复测预埋件标高及位置完后压光抹平。

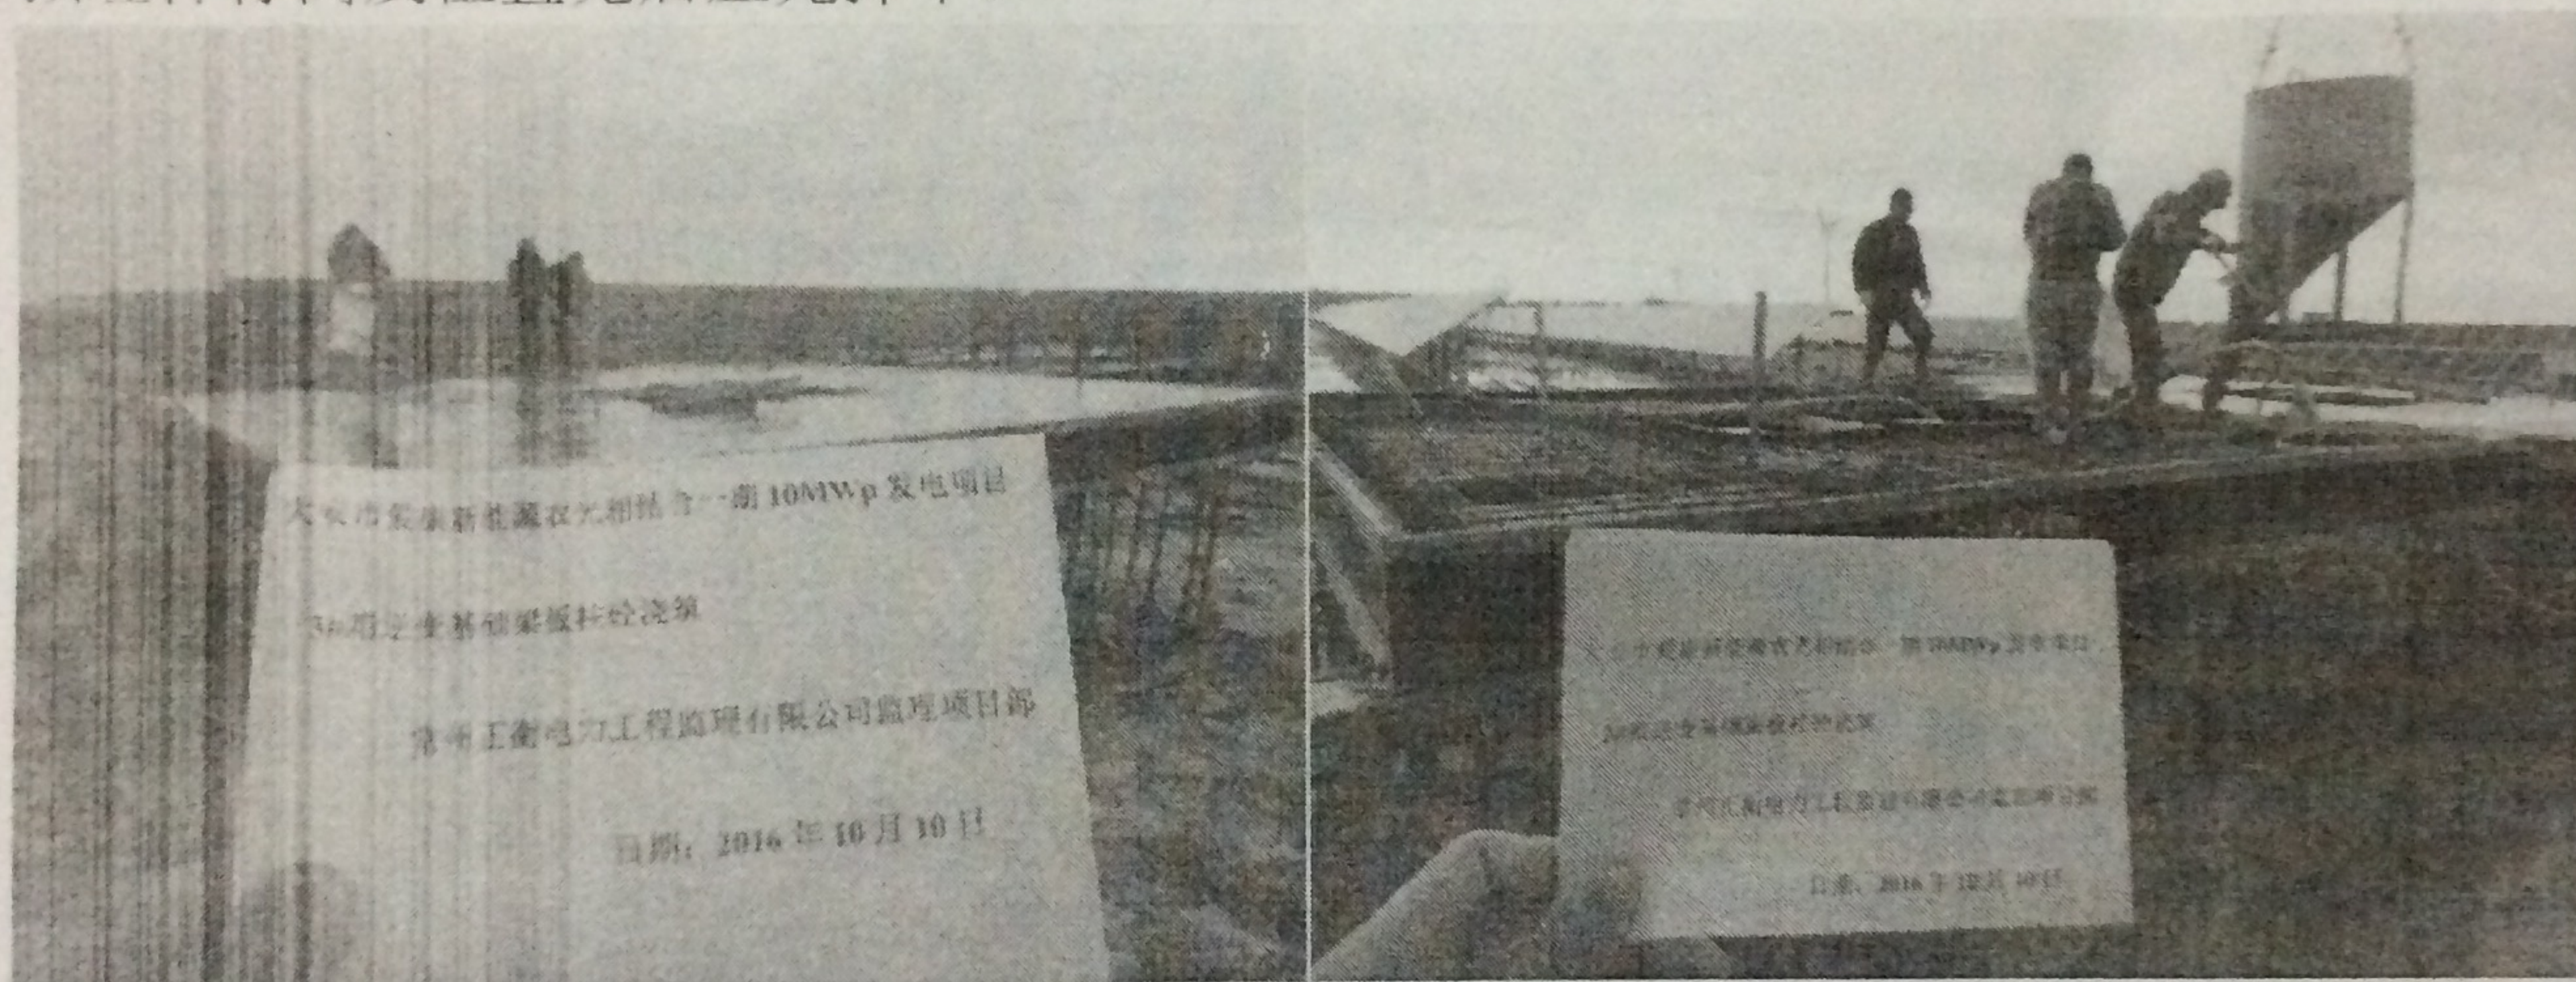

监理情况：

浇筑前检查钢筋绑扎质量，模板支护质量，复核模板尺寸，现场见证取样砼试件 1 组。

发现问题及处理方法：无

备注：

项目部：吉林白城地建建筑工程股份有限公司

质检员：李峰

2016 年 10 月 10 日

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：王有光

一期 10MWp 发电项目

2016 年 10 月 10 日

本表一式三份，由项目监理机构填写，建设管理单位存一份，项目监理机构存一份、承包单位存一份。
