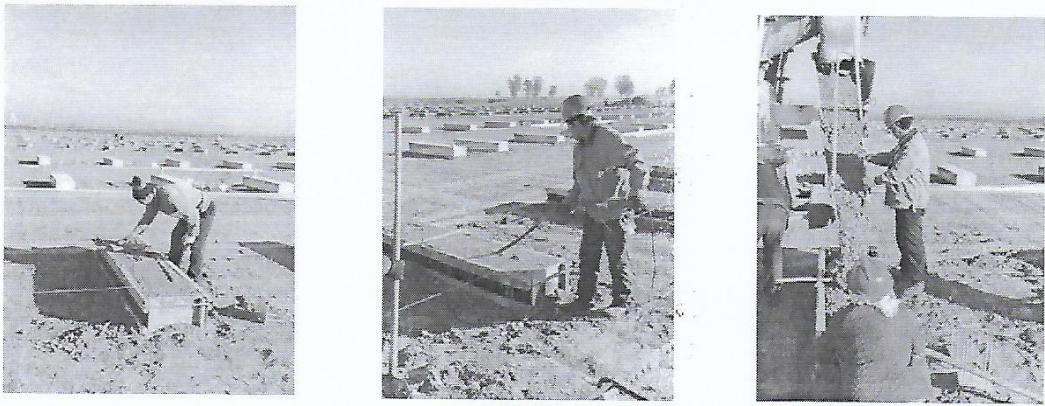


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-022

日期及气候：2016 年 11 月 8 日	晴	施工地点：光伏区 B1 区
旁站监理的部位和工序：光伏区 B1 区条基浇筑		
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：16:00
施工情况：1、混凝土强度 C30，商品混凝土；2、插入振动棒震捣密实，表面压平抹光；3、施工过程中符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象；4、共浇筑条基 185 个。		
监理情况：1、8:00—16:00 对光伏区光伏区 B1 区条基浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；4、集配料符合设计要求；5、混凝土浇筑过程符合规范要求；		
		
发现问题：		
处理意见：		
备注（包括处理结果）：		
承包单位（章）：<u>中国葛洲坝集团电力有限责任公司</u> 大城县 15MW 光伏发电项目部 质 检 员：<u>孔庆金</u> 日 期：<u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>8</u> 日		项目监理机构（章）：<u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员：<u>张子元</u> 日 期：<u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>8</u> 日

本表共肆份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存贰份。附：现场旁站照片
