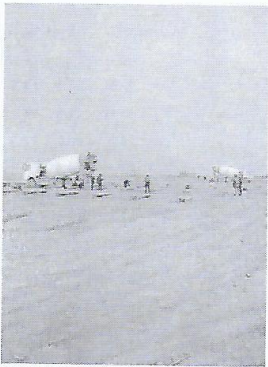


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF\CZZH-TJ-027

日期及气候: 2016 年 11 月 16 日		晴	施工地点: 光伏区 C1 区
旁站监理的部位和工序: 光伏区 C1 区条基浇筑			
旁站监理开始时间: 8: 00		旁站监理结束时间: 16:00	
施工情况: 1、混凝土强度 C30, 商品混凝土; 2、插入振动棒震捣密实, 表面压平抹光; 3、施工过程符合要求, 安全措施到位, 浇筑过程没有发生胀模现象; 4、共浇筑条基 262 个。			
监理情况: 1、8:00--16:00 对光伏区 C1 区条基浇筑; 2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差; 3、浇筑前清理干净, 确保无杂物; 4、集配料符合设计要求; 5、混凝土浇筑过程符合规范要求;			
  			
发现问题:			
处理意见:			
备注 (包括处理结果):			
承包单位 (章): 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 质检员: <u>孔庆金</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>16</u> 日		项目监理单位 (章): 常州正衡电力工程监理有限公司大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员: <u>张子兴</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>16</u> 日	

本表共 肆 份, 建设单位一份, 总承包单位一份, 项目监理单位存 贰 份。附: 现场旁站照片
