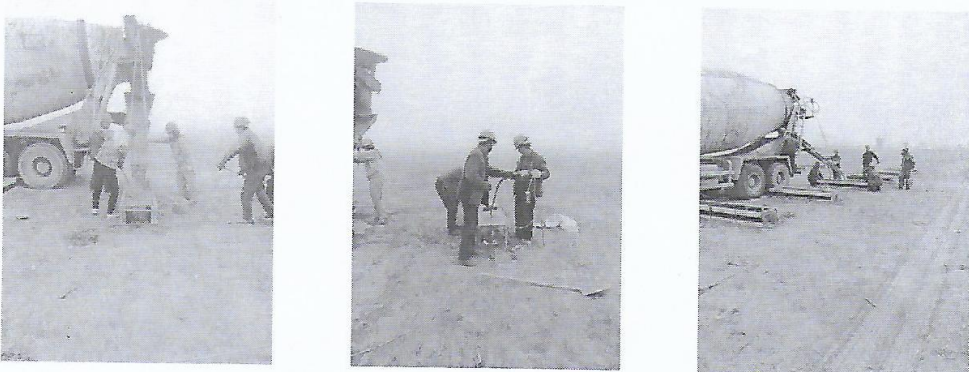


## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-029

|                                                                                                       |   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016 年 11 月 18 日                                                                                | 霾 | 施工地点：光伏区 C1 区                                                                                             |
| 旁站监理的部位和工序：光伏区 C1 区条基浇筑                                                                               |   |                                                                                                           |
| 旁站监理开始时间：8:00                                                                                         |   | 旁站监理结束时间：15:30                                                                                            |
| <p>施工情况：1、混凝土强度 C30，商品混凝土；2、插入振动棒震捣密实，表面压平抹光；3、施工过程符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象；4、共浇筑条基 412 个。</p>        |   |                                                                                                           |
| <p>监理情况：1、8:00—15:30 对光伏区 C1 区条基浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；4、集配料符合设计要求；5、混凝土浇筑过程符合规范要求；</p> |   |                                                                                                           |
|                    |   |                                                                                                           |
| 发现问题：                                                                                                 |   |                                                                                                           |
| 处理意见：                                                                                                 |   |                                                                                                           |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                           |   |                                                                                                           |
| <p>承包单位（章）：中国葛洲坝集团电力有限责任公司<br/>大城县 15MW 光伏发电项目部</p> <p>质检员： <u>孔庆金</u></p> <p>日期：2016 年 11 月 18 日</p> |   | <p>项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司<br/>大城县 15MW 光伏发电项目部</p> <p>旁站监理人员： <u>张子兴</u></p> <p>日期：2016 年 11 月 18 日</p> |

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片
