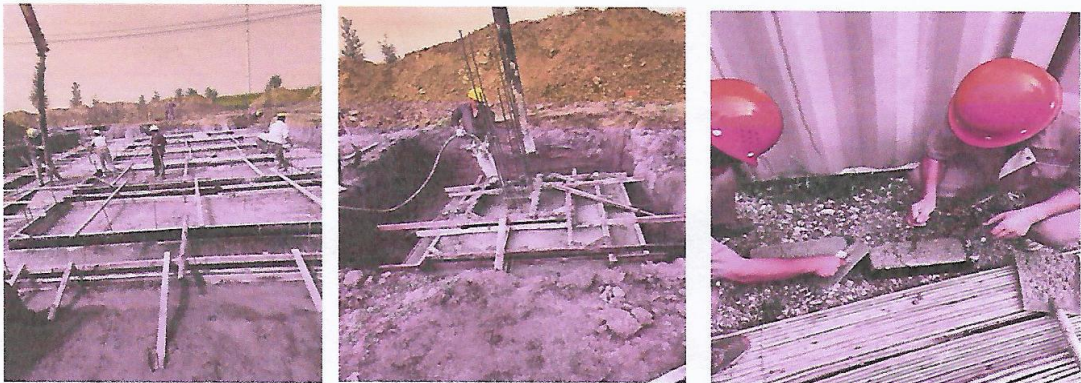


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-001

日期及气候：2016 年 9 月 11 日	雷阵雨	施工地点：开关站/综合楼
旁站监理的部位和工序：开关站/综合楼基础砼筑		
旁站监理开始时间：06:30		旁站监理结束时间：11:00
施工情况：1、砼配合比 C30，商品混凝土；2、插入振动棒捣密实，表面压平抹光；施工过程符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象。		
监理情况：1、06：30—11：00 对开关站和综合楼基础进行砼浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差；3、基坑内打扫清理干净，确保无杂物；4、监理人员现场见证取样，制作试块两组；5、混凝土浇筑过程符合规范要求；6、浇筑期间村民阻拦道路限高处停顿半小时，后由业主协商解决。		
		
发现问题：无		
处理意见：无		
备注（包括处理结果）：		
承包单位（章）：中国葛洲坝集团电力有限责任公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 质 检 员：孔庆金 日 期：2016 年 9 月 11 日		项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2016 年 9 月 11 日

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片
