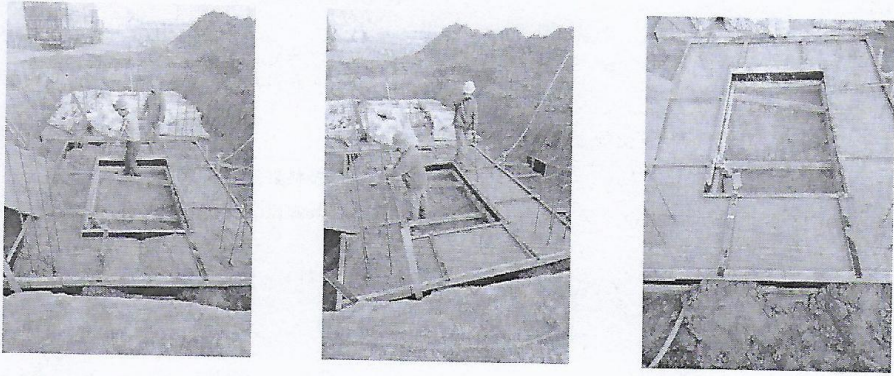



表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-037

日期及气候：2016 年 12 月 08 日		晴	施工地点：光伏区 A 区 A-#2
旁站监理的部位和工序：光伏区 A 区 A-#2 箱逆变基础浇筑			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：9:30	
施工情况：1、砼配合比 C30，现场搅拌砼、小运输车运送到基坑内；2、插入振动棒捣密实，表面压平抹光；3、搅拌站机械设备运转正常，安全通道畅通合理，施工过程符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象； 监理情况：1、8:00--9:30 对光伏区 A 区 A-#2 箱逆变基础浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；3、混凝土浇筑过程符合规范要求；			
			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）：中国葛洲坝集团电力有限责任公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 质 检 员：  日 期：2016 年 12 月 8 日		项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员：  日 期：2016 年 12 月 8 日	

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片
