

旁站监理记录表


工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司6MW分布式光伏发电项目
 编号：JL-PZ-05

日期及气候：2016年11月04日 晴 | 工程地点：河北邯郸大名县羽祥电动车厂

旁站监理的部位及工序：开关站及SVG底板浇筑

旁站监理开始时间： 9: 00 | 旁站监理结束时间： 11: 00

施工情况：现场施工人员8人（技术员1人、木工3人、瓦工2人、钢筋工2人），技术人员及施工人员均到位。插入式振动棒一台，砼车3辆不间断提供混凝土，，砼标号为C30。从1#到4#依次浇筑，，振捣完成后放入预埋钢筋笼，技术员复测混凝土标高后压光抹平。

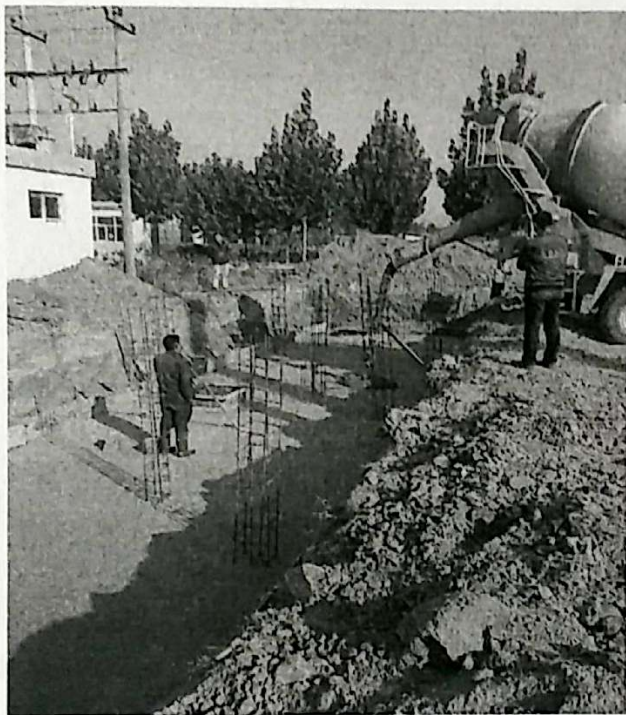

监理情况：

浇筑前检查钢筋绑扎质量，模板支护质量，复核模板尺寸，现场见证取样砼试件1组。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：秦皇岛港城电力工程有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：谢时进

旁站监理人员（签字）：张进大

2016 年 11 月 04 日

2016 年 11 月 04 日
