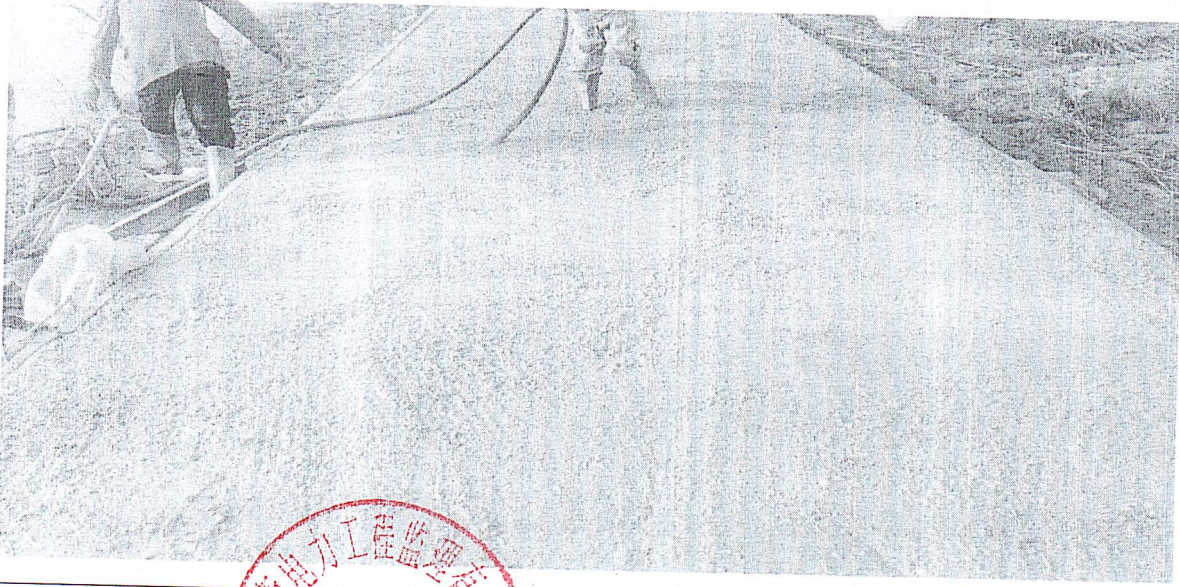


旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-144

日期及天气：2017 年 10 月 1 日 天气：晴多云 23℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏场区主道路施工	
旁站监理开始时间：2017.10.1 8: 30	旁站监理结束时间：2017.10.1 15: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、施工情况： 1.施工人员 6 人,质检员已就位，施工前对施工人员进行安全、技术交底。 2.施工材料/器具：2 台商混车、4 把铁锹、2 台振动棒，等。 3.施工顺序：找标高、弹面层水平线 → 基层处理→定位放线→模板安装→商混车浇筑→抹面→养护。 2、监理情况： 1.旁站监理 1 人，施工前检查施工单位准备情况；核对混凝土配比资料； 2.检查人员到岗情况符合事前安排，满足要求。 3.检查模板夹固支撑情况，满足要求。 4.检查混凝土坍落度检查（控制在 140±30、150、150、150）基本符合要求，并按要求留置同条件、标养试块。 5.检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。	
	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）： 	
2017 年 10 月 1 日	
