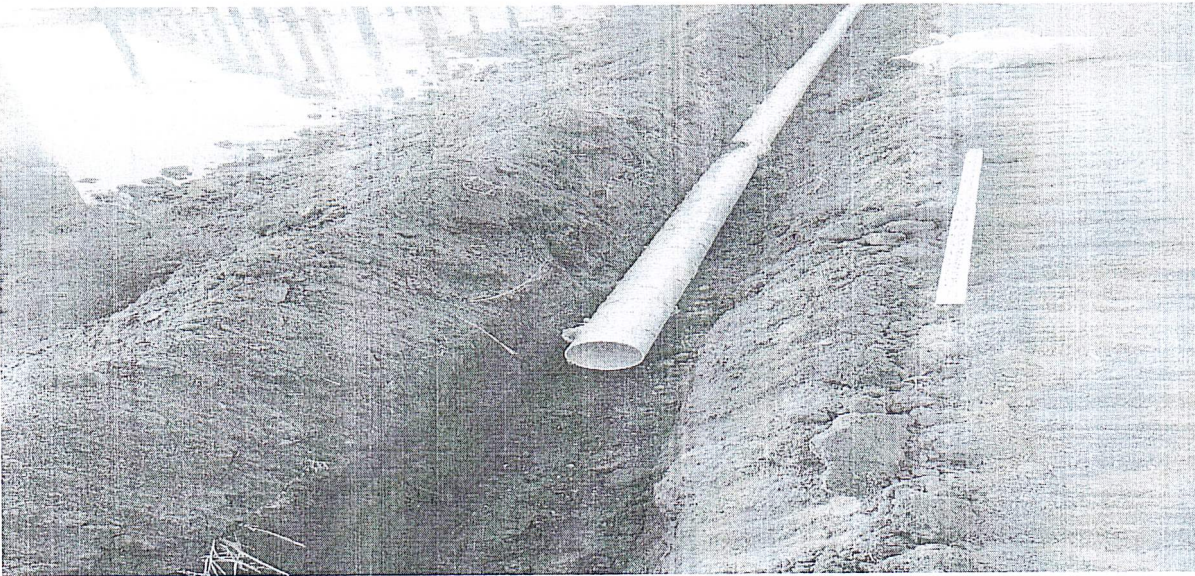



旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-146

日期及天气：2017 年 11 月 27 日 天气：多云 5℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：3#北埂至 20#池塘渔业设施排污管道回填	
旁站监理开始时间：2017.11.27 7: 30	旁站监理结束时间：2017.11.27 15: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工情况： 1.施工人员 6 人,质检员已就位，施工前对施工人员进行安全、技术交底。 2.施工材料/器具：4 把铁锹、1 台挖掘机。 3.施工顺序：定位放线测量—开挖排污沟渠—测量沟渠深度—沟渠底部平整—敷设排污管—回填。 2、监理情况： 1.旁站监理 1 人，施工前检查施工单位准备情况； 2.电缆沟深度沟深符合要求。 3.电缆沟宽度沟宽 0.8m；。 4.电缆沟内无施工、建筑垃圾； 5.回填土已分层夯实；	
	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：   2017 年 11 月 27 日	
