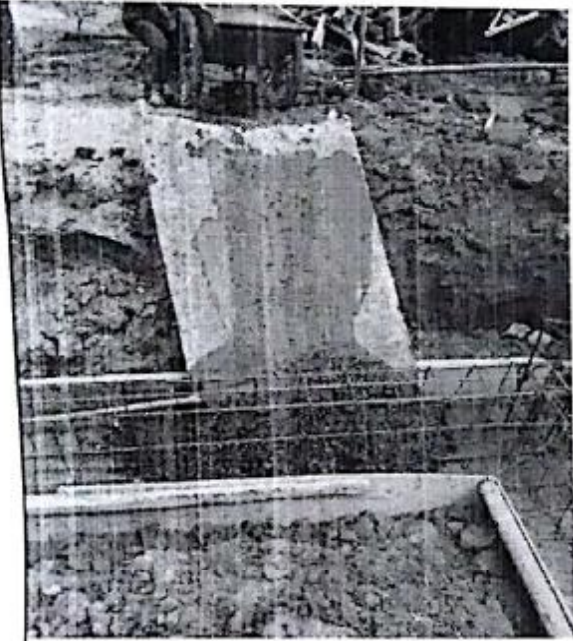


表 B·5 旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-045

日期及气候: 2017 年 4 月 16 日 阴 17-27℃		工程地点: 耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序: 电控楼基础浇筑			
旁站监理开始时间: 13:00		旁站监理结束时间: 20:00	
施工情况: • 施工单位浇筑人员 11 人, 三辆手推车。			
			
监理情况: 1、检查浇筑人员安全帽佩戴情况 2、要求为 C30 商品混凝土, 但搅拌车无法进场用自拌混凝土。 3、检查钢筋的数量、规格等 4、检查立模情况符合图纸要求			
发现问题: 部分人员未佩戴安全帽			
处理意见: 已通知施工管理人员			
备 注: 已整改			
施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: 于启华		旁站监理人员: 赵俊	
日 期: 2017 年 4 月 17 日		日 期: 2017 年 4 月 16 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存档。
