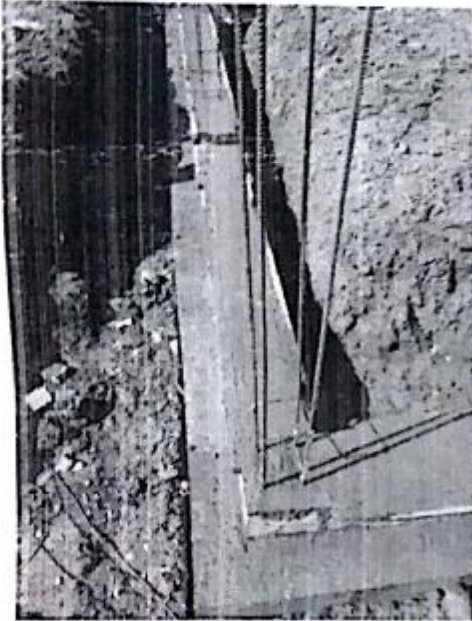


表 B·5 旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-047

日期及气候: 2017 年 4 月 19 日 小雨 19-30℃		工程地点: 耒阳淝田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序: 电控楼基础浇筑			
旁站监理开始时间: 7:00		旁站监理结束时间: 18:00	
施工情况: • 施工单位浇筑人员 18 人, 一个搅拌机, 三辆手推车。  			
监理情况: 1、检查浇筑人员安全帽佩戴情况 2、要求为 C30 商品混凝土, 但搅拌车无法进场用自拌混凝土。 3、检查钢筋的数量、规格等 4、检查立模情况符合图纸要求			
发现问题:			
处理意见:			
备 注:			
施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: 		旁站监理人员: 	
日 期: 2017 年 4 月 20 日		日 期: 2017 年 4 月 19 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。
