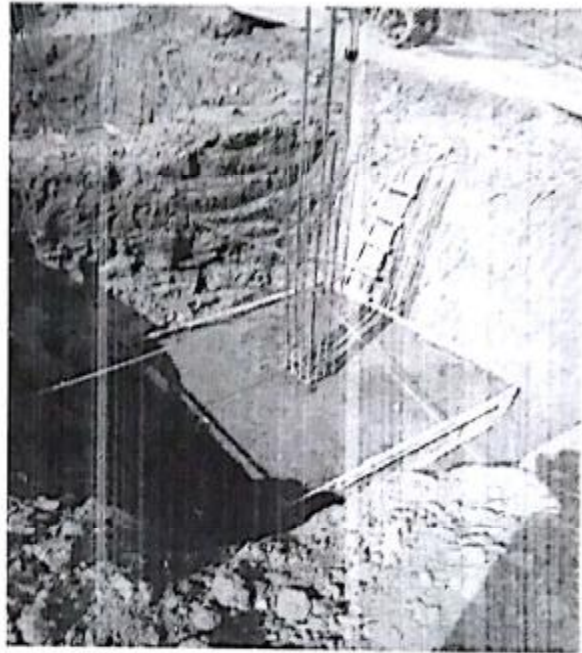



表 B·5 旁站监理记录表

工程名称: 未阳市源田镇 30.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-049

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候: 2017 年 4 月 24 日 多云 17~28℃                                                                                                                                        |  | 工程地点: 未阳源田镇利荆村、五岳村                                                                           |  |
| 旁站监理的部位或工序: 综合楼基础浇筑                                                                                                                                                     |  |                                                                                              |  |
| 旁站监理开始时间: 7:00                                                                                                                                                          |  | 旁站监理结束时间: 18:00                                                                              |  |
| <p>施工情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工单位浇筑人员 22 人, 一个搅拌机, 三辆手推车。</li> </ul>                                                                           |  |                                                                                              |  |
|                                                                                       |  |           |  |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查浇筑人员安全帽佩戴情况</li> <li>2、要求为 C30 商品混凝土, 但搅拌车无法进场用自拌混凝土。</li> <li>3、检查钢筋的数量、规格等</li> <li>4、检查立模情况符合图纸要求</li> </ol> |  |                                                                                              |  |
| 发现问题:                                                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |
| 处理意见:                                                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |
| 备 注:                                                                                                                                                                    |  |                                                                                              |  |
| 施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司                                                                                                                                                     |  | 监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                        |  |
| 质 检 员:                                                                               |  | 旁站监理人员:  |  |
| 日 期: 2017 年 月 日                                                                                                                                                         |  | 日 期: 2017 年 4 月 24 日                                                                         |  |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。
