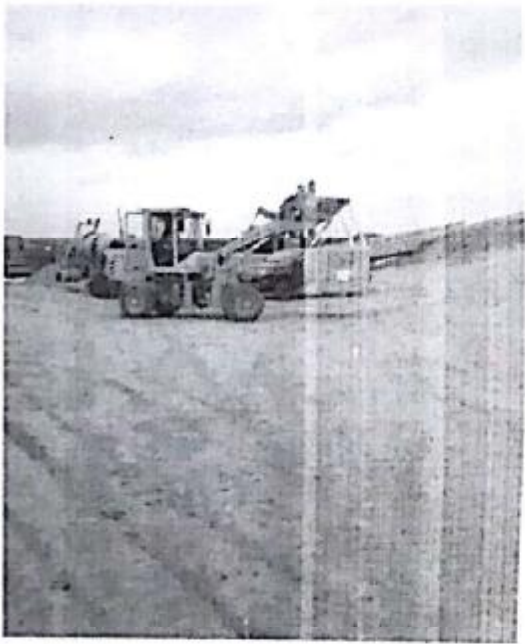


表 B·5 旁站监理记录表

工程名称：未阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号：ZHLJ-PZJL-041

日期及气候：2017 年 4 月 6 日 阵雨 20-27℃		工程地点：未阳澧田镇利荆村、五岳村	
旁站监理的部位或工序：组件卸货			
旁站监理开始时间：7:00		旁站监理结束时间：17:00	
施工情况： • 施工单位卸货人员 10 人，一辆铲车，一辆吊车，一辆叉车，六车组件。  			
监理情况： 1、检查卸货人员安全帽佩戴情况，特种作业证均符合要求。 2、检查组件出场合格证、外观均良好。 3、组件在卸货中轻拿轻放，避免组件损坏。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
施工项目部：武汉烽火富华电气有限公司		监理项目部：常州正德工程监理有限公司	
质 检 员：吴晓生		旁站监理人员：赵红忠	
日 期：2017 年 4 月 7 日		日 期：2017 年 4 月 6 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。
