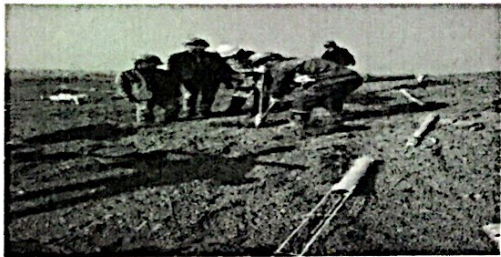
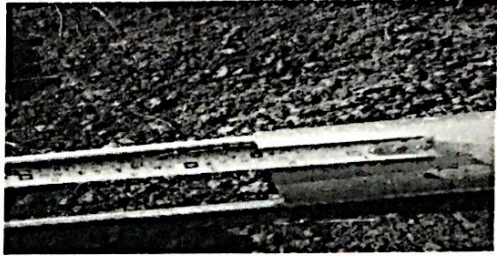


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：耒阳宏拓新能源科技有限公司耒阳淝田镇 39.6 兆瓦并网光伏发电项

目编号：PZ-Z-07

日期及气候：2016 年 12 月 7 日 多云 6-19℃	施工地点：耒阳淝田镇利荆村、五岳村
旁站监理的部位和工序：3#区灌注桩	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：17: 00
施工情况： • 施工单位施工人员 22 人，施工员、安全员、技术员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为自拌混凝土，等级为 C25。0.11 兆瓦  	
监理情况： • 检查桩孔工程质量和施工单位人、料、机具准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题 • 桩头管不垂直、移位。 • 预埋钢管沾染水泥。	
处理意见： 1、安排人即整改。 2、安排人清理。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改。	
承包单位：武汉烽火富华电气有限公司 质检员：李东升 日期：2016 年 12 月 7 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日期：2016 年 12 月 7 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份
