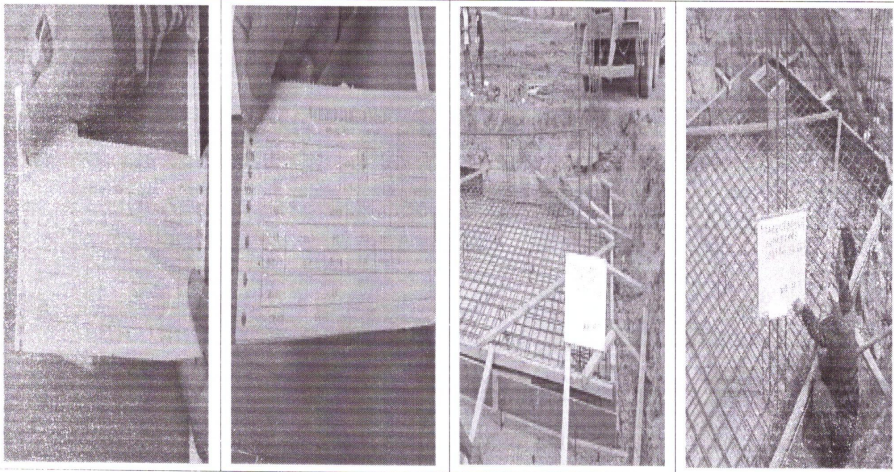


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目 编号：JZL6-001

日期及天气：2016、10、5 日多云东风 2~3 级 17~27℃	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：5#8#10#12#箱变基础底板砼浇筑	
旁站监理开始时间：11.30 分	旁站监理结束时间：13.25 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用鲁山县信宝商品砼有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20；浇筑总计方量：25.19m³；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了两组试块，一组同条件，一组拆模。	
	
发现的问题及处理情况： 保护层垫块布置的稀少。 把保护层垫块增补合格，再进行砼浇筑。 经复验合格，允许砼浇筑。	
旁站监理人员（签字）： 	 2016 年 10 月 5 日
