

## 旁站监理记录表


工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-012

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 日期及天气：2016、11、25 日多云东风 2~3 级 1~5℃ | 施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：2#、3#箱变基础梁、板、柱混凝土浇筑旁站  |                     |
| 旁站监理开始时间：14 点 07 分                | 旁站监理结束时间：16 点 22 分  |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用鲁山县信宝商品砼有限公司供应 C30 级、塌落度  $180 \pm 20$ ；浇筑总计方量： $9.7\text{m}^3$ ；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。

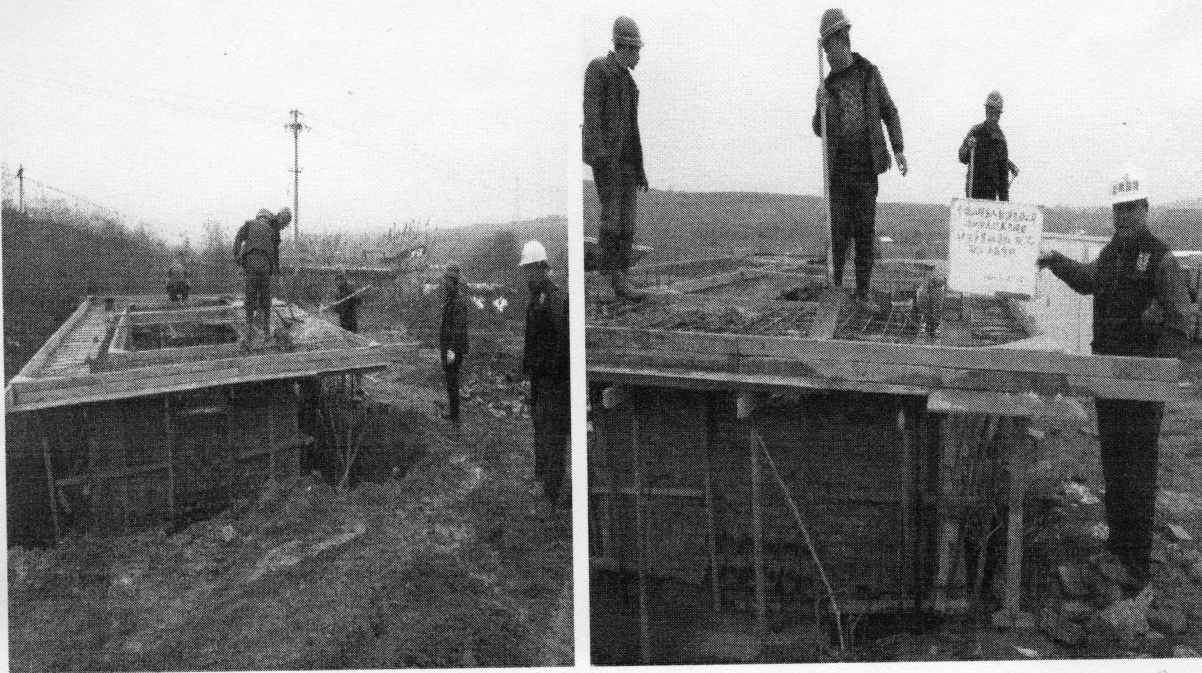

发现的问题及处理情况：

基础梁板中泥土和积雪没有清理干净，垫块以及辐射筋没有放置。

浇筑时没有进行报验，并通知其项目经理及施工班组负责人到现场，要求其立即进行整改，经监理员复查合格后，进行了混凝土浇筑。

旁站监理人员（签字）：

陈继德

