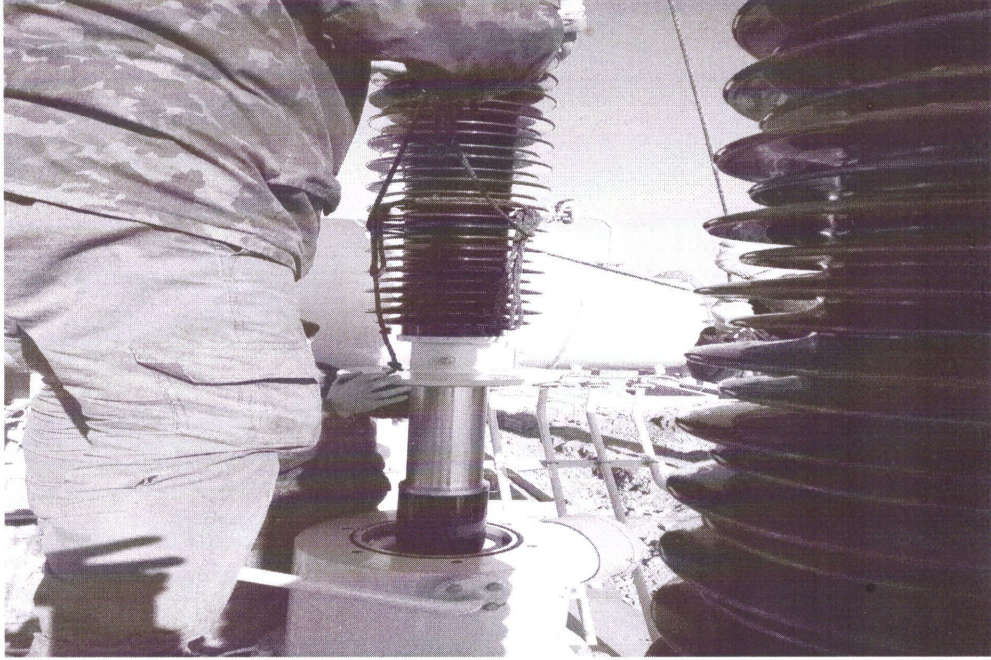


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-019

日期及天气：2016、12、 27	晴 -3~7℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#主变高压套管安装		
旁站监理开始时间：13 点 40 分		旁站监理结束时间：16 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1#、2#主变高压套管安装，采用西安西电高压套管有限公司生产的高压套管，出厂合格证及检测报告齐全，瓷套表面无裂缝、伤痕，套管、法兰颈部及均压球内壁均擦拭干净，高压套管用布袋进行吊装，高压套管穿缆的应力锥进入套管的均压罩内，引出端口与套管顶部接线柱连接处擦拭干净、接触紧密，套管顶部的密封垫安装正确，密封良好，法兰螺栓全部紧固到位。		
		
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）：张昭武		
