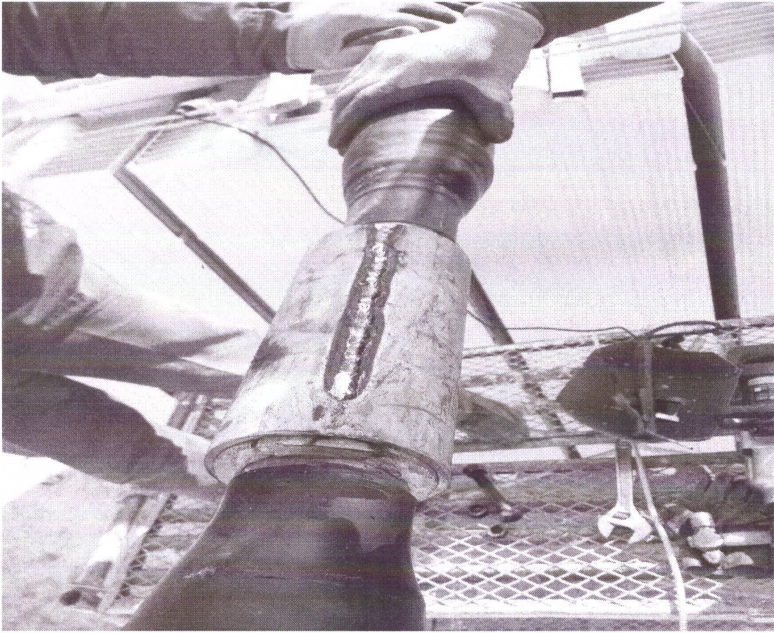


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-024

日期及天气：2016、12、30	晴 -2~9℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：主变绝缘铜管母线中间接头焊接		
旁站监理开始时间：上午 9 点 10 分		旁站监理结束时间：上午 11 点 30 分
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工人员的相关上岗证书齐全；2、使用的铜套管及不锈钢套管规格符合设计及规范要求；3、对铜管接头部分进行了彻底清理，并涂导电油膏；4、在工装夹具进行有效固定后，进行不锈钢套管的焊接，焊缝成型美观，并进行认真清理；5、最后进行热缩管的安装。</p>		
		
<p>发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。</p>		
旁站监理人员（签字）：张昭武		
