


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-028

日期及天气：2017、1、12	晴 0~8℃	施工单位：平顶山华辰电力集团有限公司
旁站监理的部位或工序：耐张导线的压接，设备线夹压接		
旁站监理开始时间：上午 8 点 10 分		旁站监理结束时间：上午 11 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、压接工全部具有相关操作证书；2、所使用的导线、线夹型号及材质符合设计要求；3、压接前对线夹内外进行了彻底清理，并测量了线夹的外形尺寸，满足压接要求；4、液压机运行正常，磨具和线夹型号匹配；5、对压接试件进行现场见证取样；6、压接完成后，现场对线夹进行外观检查，耐张管没有裂纹、鼓肚、变形，导线没有破损、断股等现象。		
		
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）：张昭武		

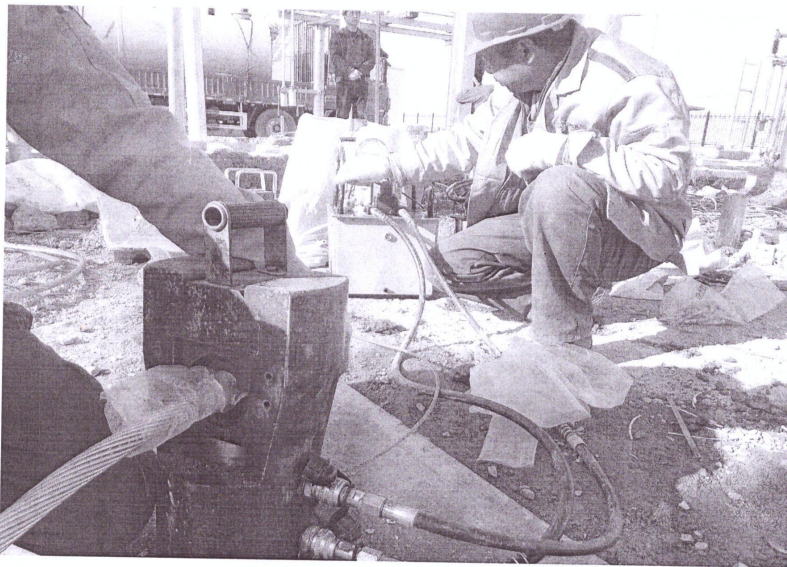
