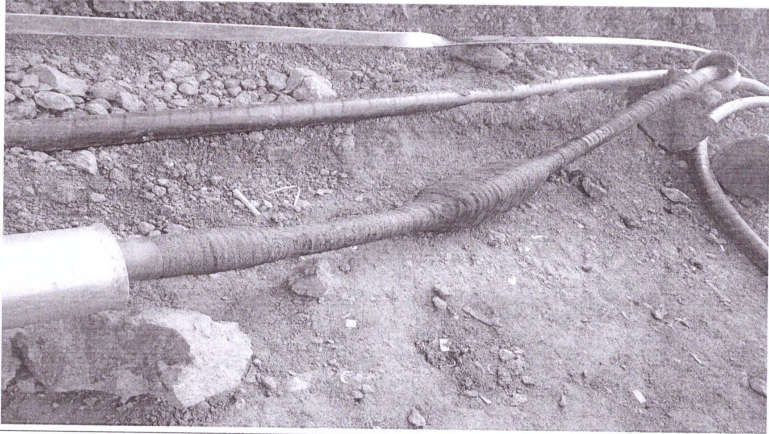


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-029

日期及天气：2017、1、12	晴 0~8℃	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 电缆中间接头制作		
旁站监理开始时间：下午 13 点 40 分		旁站监理结束时间：下午 16 点 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1 对施工现场工作环境进行检查，无明显粉尘，空气湿度不大于 75%； 2 对施工人员的相关证书进行核实； 3 对压接钳的型号进行确认，满足施工需要； 4 对电缆中间接头的型号及出厂合格证进行确认； 5 确认电缆头干燥、清洁； 6 确认电缆头的相序，并有明显相序标识； 7 对电缆中间接头的制作程序及制作工艺进行监督； 8 确认电缆摆放时，中间接头没有受力。 		
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）： 
