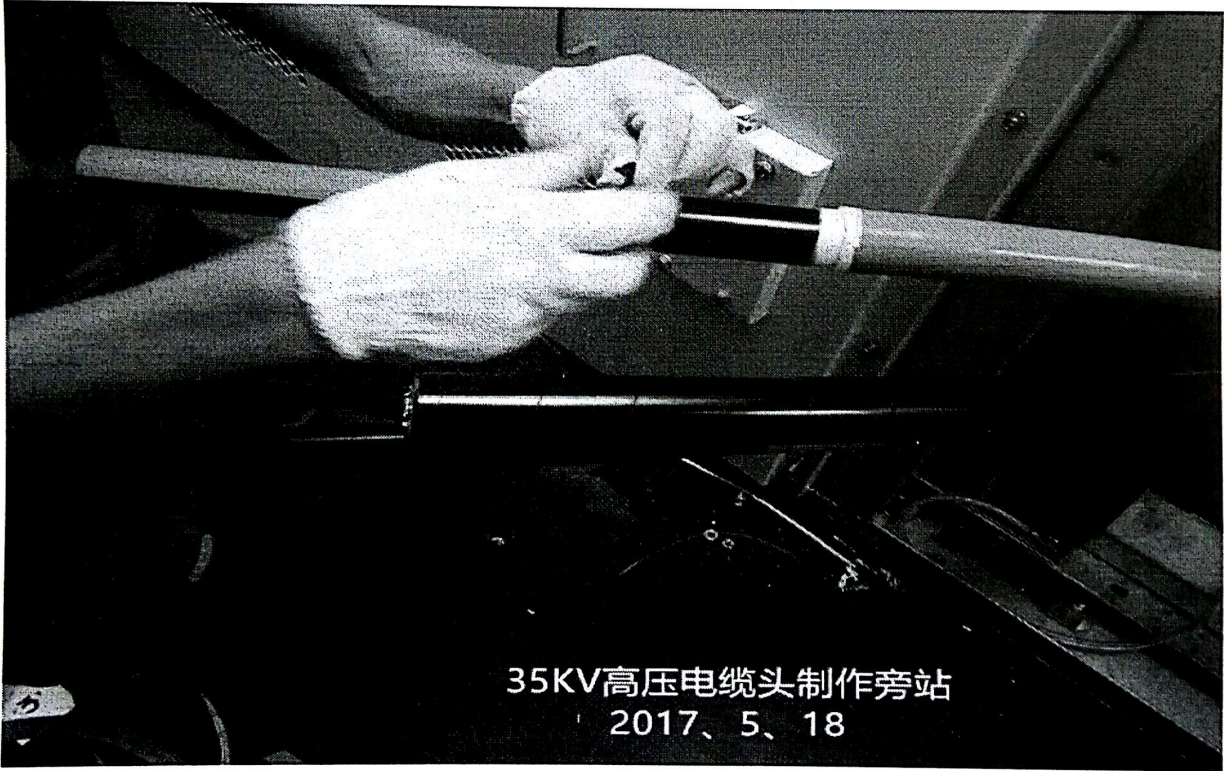


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-036

日期及天气：2017、5、 18	晴 17~28℃	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：预制舱 35KV 高压开关柜		
旁站监理开始时间：14 点 20 分		旁站监理结束时间：17 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 35KV 高压开关柜进线电缆头制作，现场施工人员 2 人，具有高压电工操作证书。采用 YOK-240 液压钳进行压接，满足施工需要。选用长缆电工科技股份有限公司生产的 35KV 硅橡胶户内终端，出厂合格证及检测报告齐全。铠装层已按要求接地，相序标识分明，硅橡胶冷缩套管安装规范，铜鼻子压接牢固，连接螺栓安装牢固，施工现场没有粉尘，环境干燥，满足高压电缆头制作需要。整个施工程序符合设计及规范要求。		
 35KV高压电缆头制作旁站 2017、5、18		
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）： 
