

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-037

日期及天气：2017、5、22 多云 17~30℃ 施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司


旁站监理的部位或工序：光伏区电缆耐压测试

旁站监理开始时间：上午 8 点 30 分

旁站监理结束时间：上午 11 点 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、实验单位及人员相关证书齐全；2、现场设置警示带并有专人现场监护；3、确定电缆线路相序正确；4、实验耐受电压标准为 2.5 倍 U_0 ；5、试验时间为 60 分钟；6、测试后绝缘电阻没有明显下降。

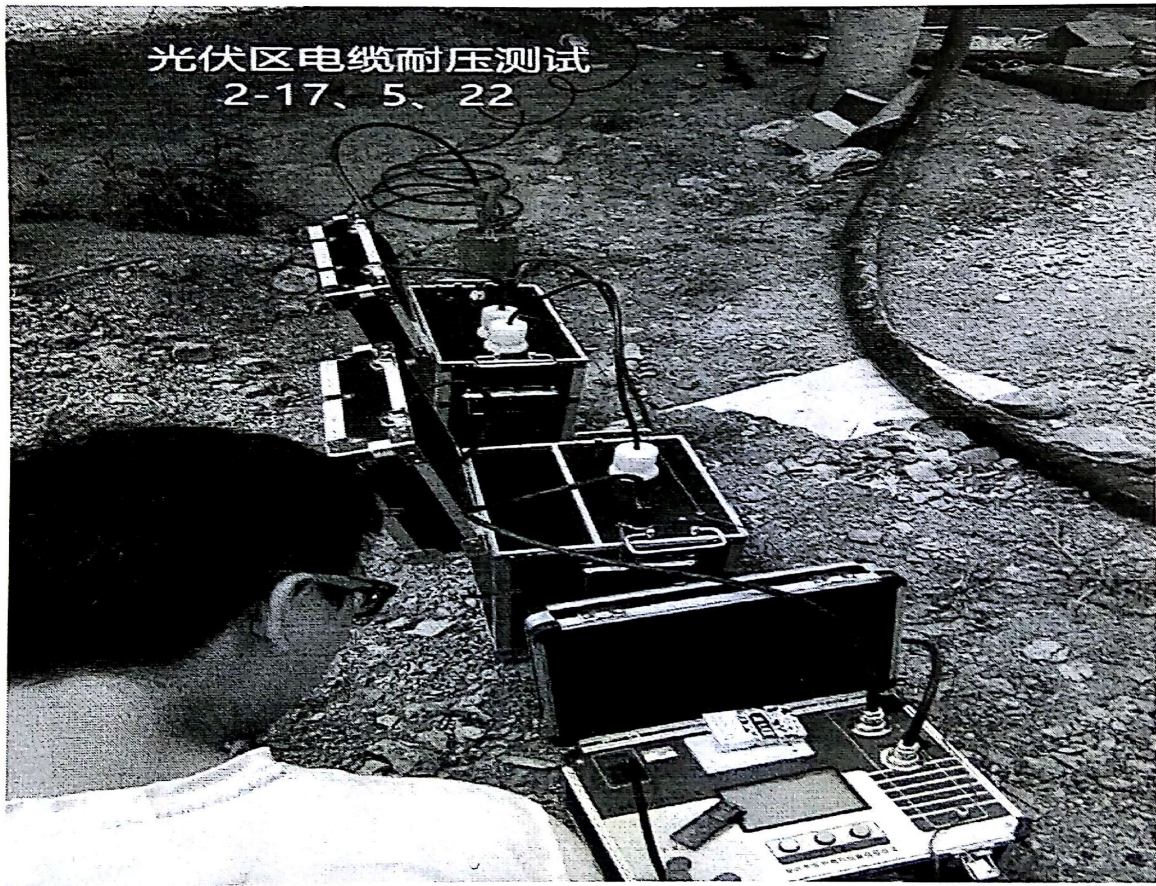

发现的问题及处理情况：

整个实验程序符合规范要求。

旁站监理人员（签字）：

赵晓冰

