
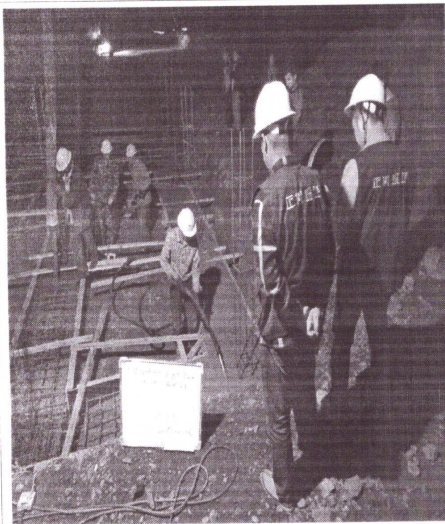


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JZL6-004

日期及天气：2016、10、16 日多云东风 2~3 级 12~25℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站、综合楼基础底板混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：19.20 分	旁站监理结束时间：21.56 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用鲁山县信宝商品砼有限公司供应 C30 级、塌落度 180±20；浇筑总计方量：55m³；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。	
	
监理人员进行现场旁站	对现场试块制作全过程进行监督
发现的问题及处理情况： 整个混凝土浇筑过程正常。	
旁站监理人员（签字）：周辉	2016 年 10 月 16 日

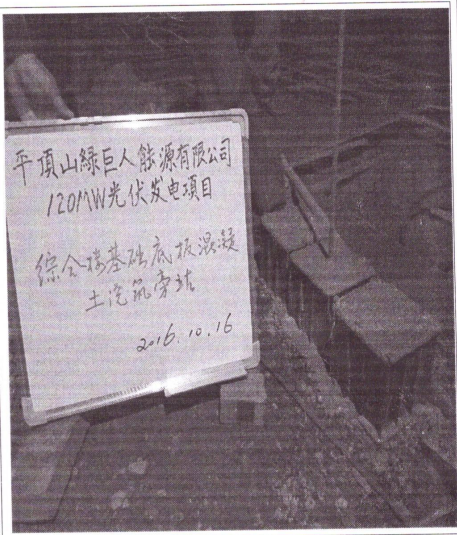
