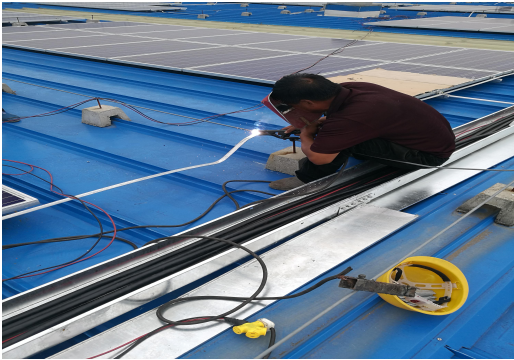


旁站监理记录表

工程名称：中航工业陕西飞机有限公司3.45MW分布式光伏发电项目 编号：QY-QJ-1

日期及气候:2016年09月16日 晴		工程地点：中航陕飞	
旁站监理的部位及工序： 防雷接地焊接			
旁站监理开始时间： 09：00		旁站监理结束时间： 11：30	
施工情况： 施工人员一人，设备一台，工器具准备完毕。首先我部人员对防雷接地材料规格型号、焊缝饱满程度、接地体搭接面长度进行检查，经合格后由施工领班作施工交底，然后开始工作。  附图：			
监理情况： 现场现有我部监理人员对防雷接地的规格型号、焊缝饱满程度、接地体搭接面进行抽查，经抽查对不合格的进行调整，再由施工人员开始焊接作业。 我部监理人员要求施工人员对接地体焊接中的任意部位的焊缝要饱满、搭接面要达到接地体的2.5倍以上。对以焊接好的防雷接地要求施工单位安排专门质检人员进行检查，若对有焊缝不饱满、搭接面不够的地方及时调整			
发生情况：			
处理意见：			
项目经理部：江阴市富仁电力设备安装有限公司		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：		旁站监理人员（签字）：	
年 月 日		年 月 日	
