



旁站监理记录表



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 01

日期及气候: 2016 年 12 月 09 天气: 多云 温度 21~5℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 1~4 区箱变基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 15: 00		旁站监理结束时间: 17: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>有无</u> 钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ .			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑量: <u>5.0m³</u> . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> / <u> </u> 组; 试块编号: <u>01</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ .			
15、其他: <u> </u> / <u> </u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>马付存</u>		旁站监理人员: <u> </u>	
日 期: <u>2016 年 12 月 09 日</u>		日 期: <u>2016 年 12 月 09 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

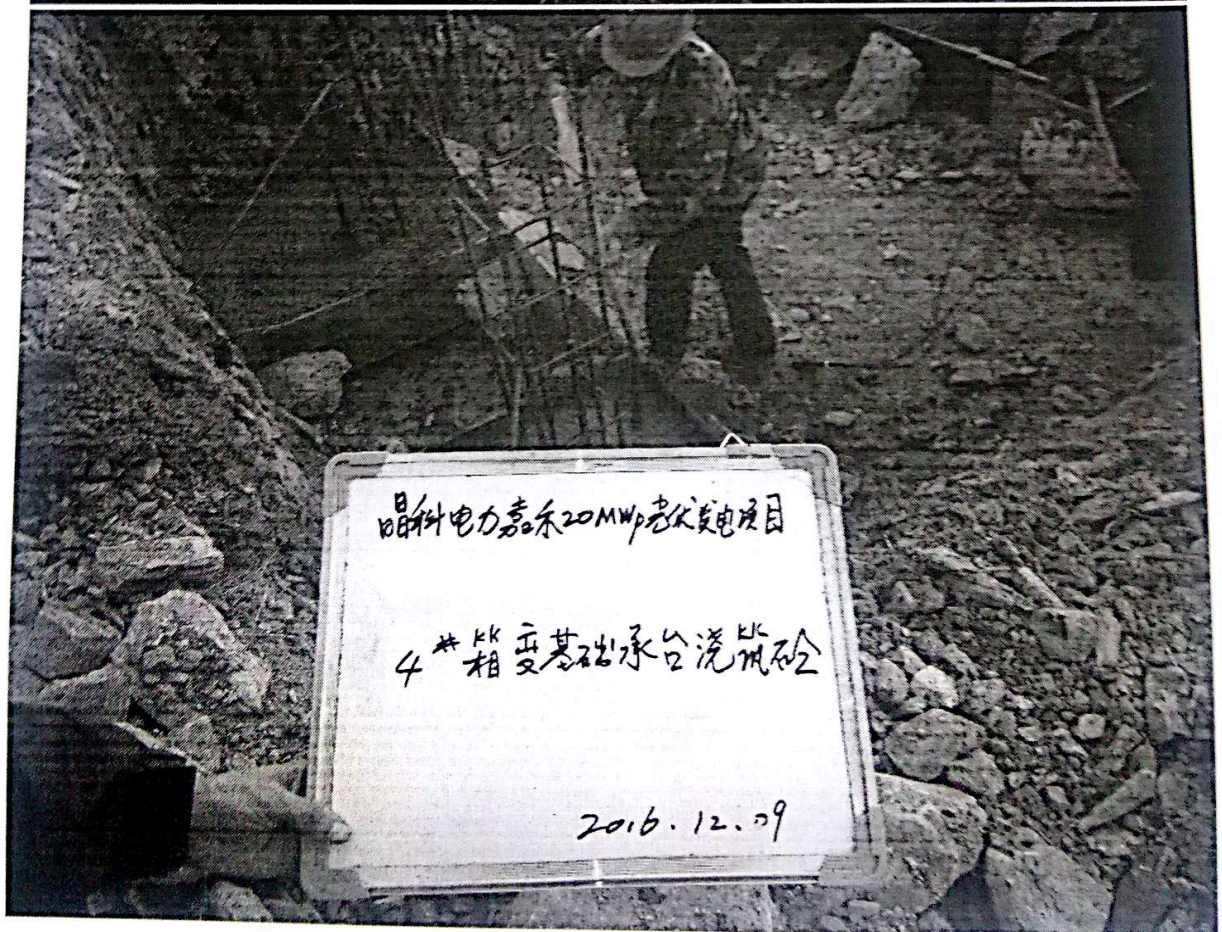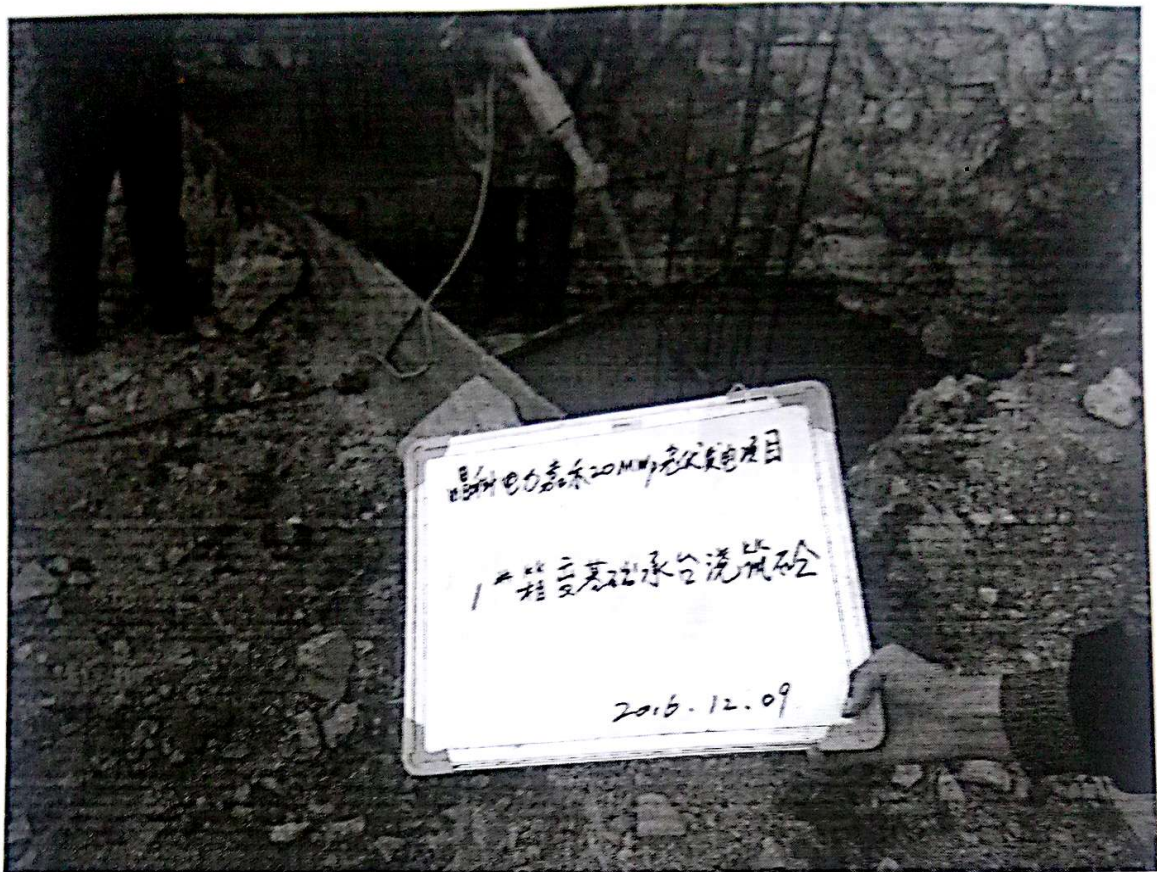

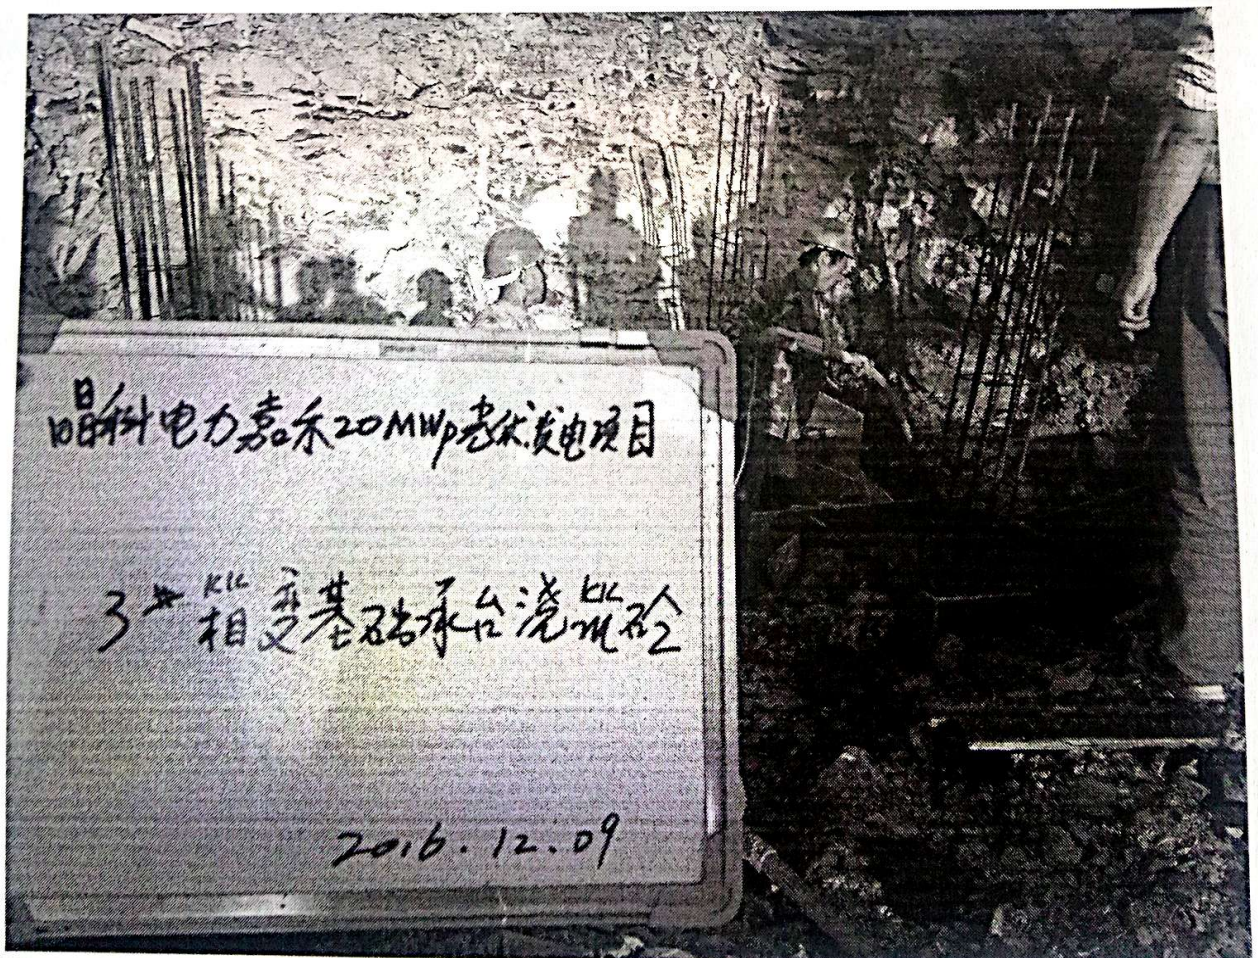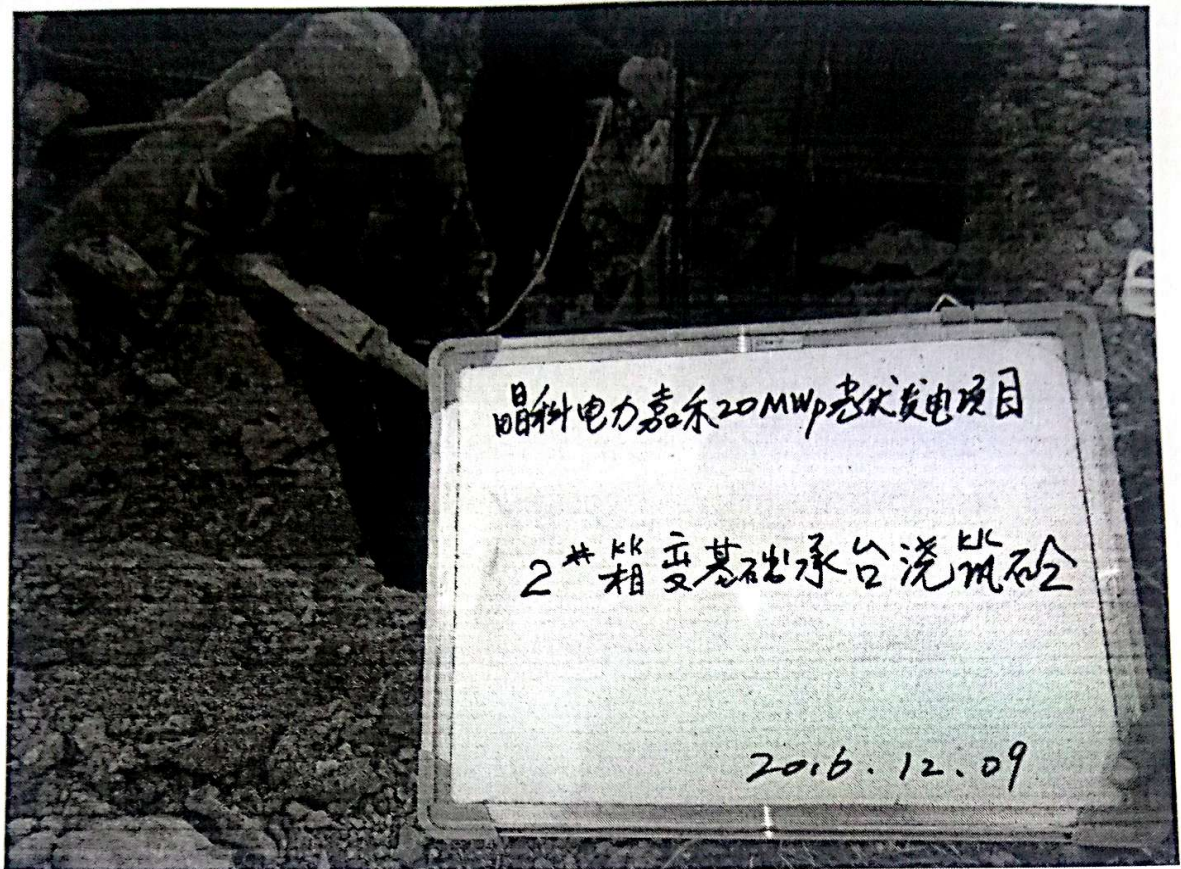


旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目


编号: 02


日期及气候: 2016 年 12 月 12 日 天气: 多云 温度: 16~5℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 5~11 区箱变基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 14: 00		旁站监理结束时间: 16: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ .			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑量: <u>7.0m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> 组; 试块编号: <u>02</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ .			
15、其他: <u> / </u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>李付有</u>		旁站监理人员: <u>李付有</u>	
日 期: <u>2016 年 12 月 12 日</u>		日 期: <u>2016 年 12 月 12 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

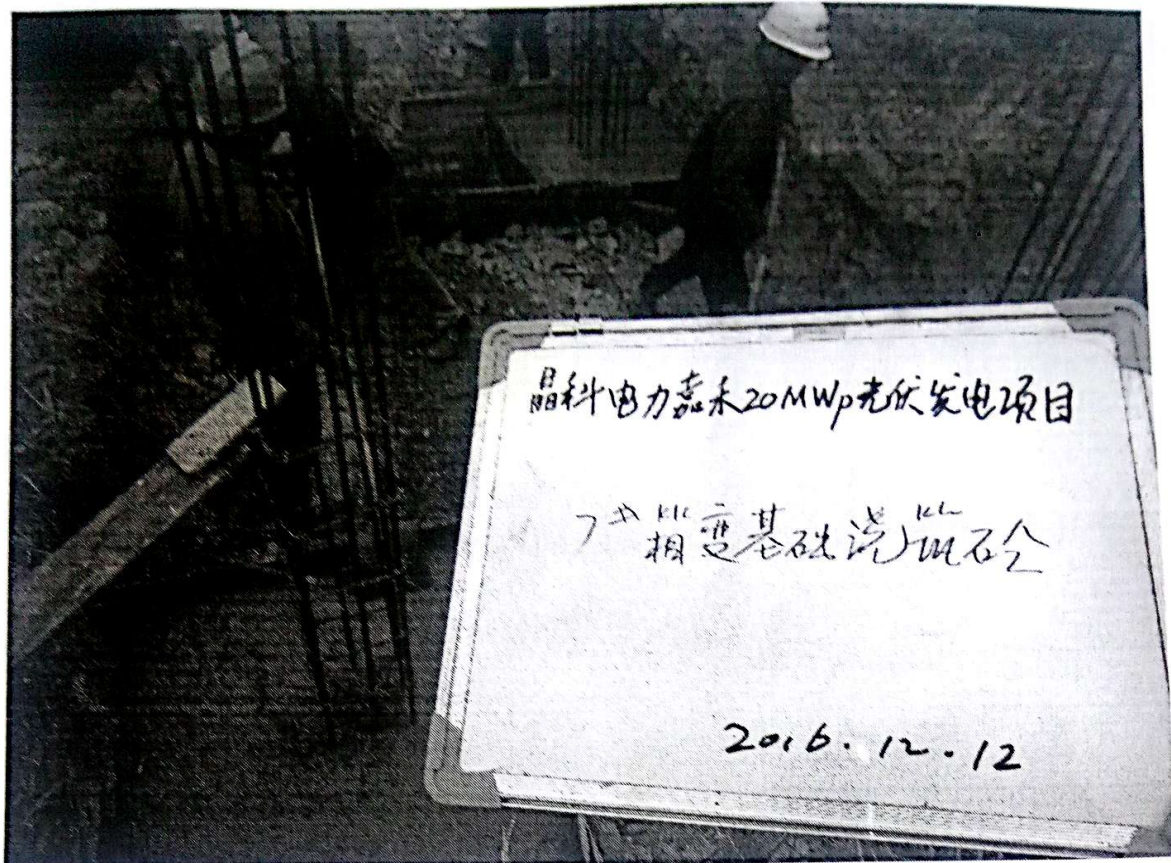



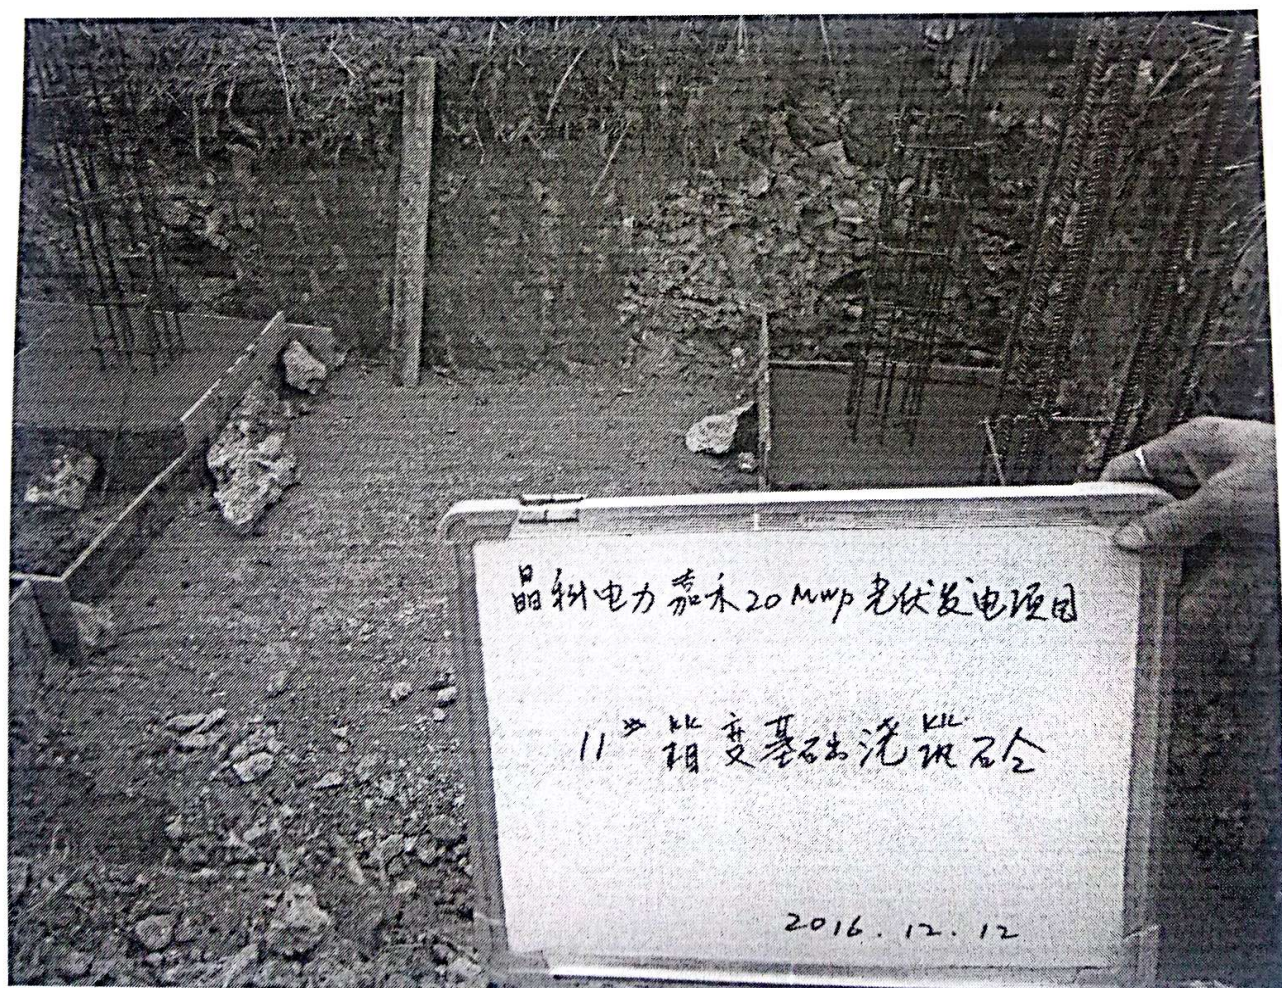

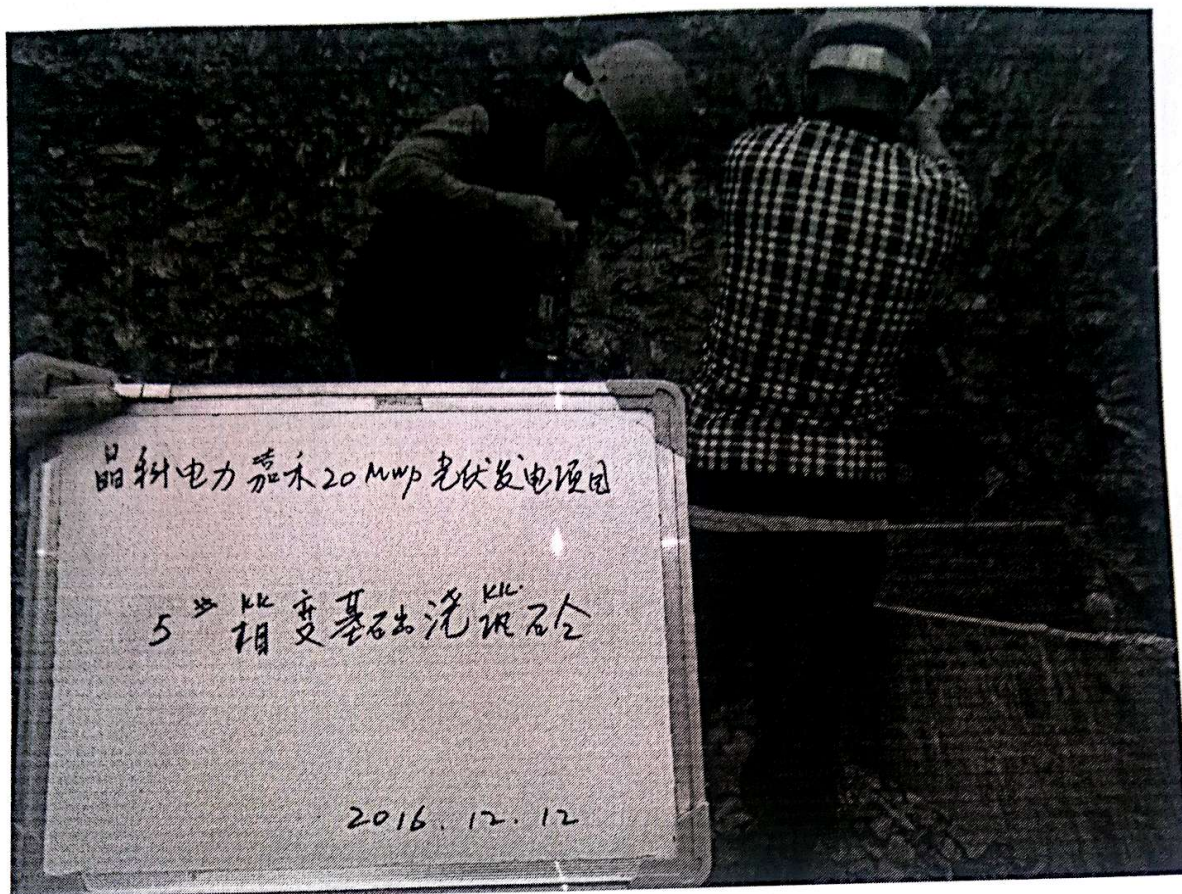

日新电力嘉禾20Mwp光伏发电项目

5^{kk}相变基础浇筑完成

2016.12.12

旁站监理记录表



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 03

日期及气候: 2016 年 12 月 17 天气: 晴 温度 16~8℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 1、2、3 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 14: 00		旁站监理结束时间: 16: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u>有无</u> 钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☒, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>12.0m³</u>. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> / <u> </u> 组; 试块编号: <u>03</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☒. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒. 15、其他: <u> </u> / <u> </u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u> 质 检 员: <u>马付有</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 17 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李月海</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 17 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。



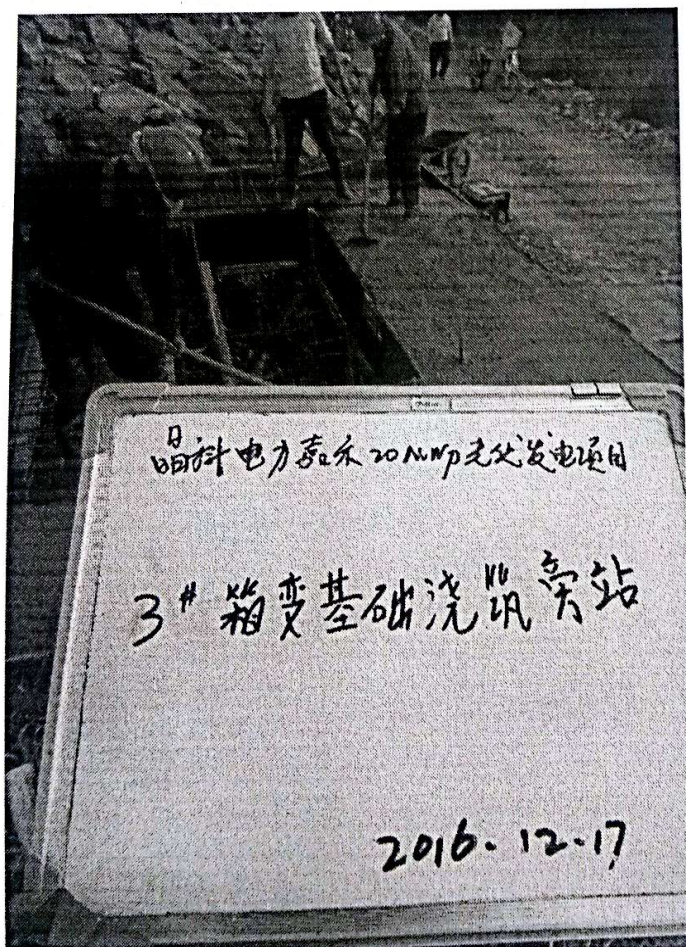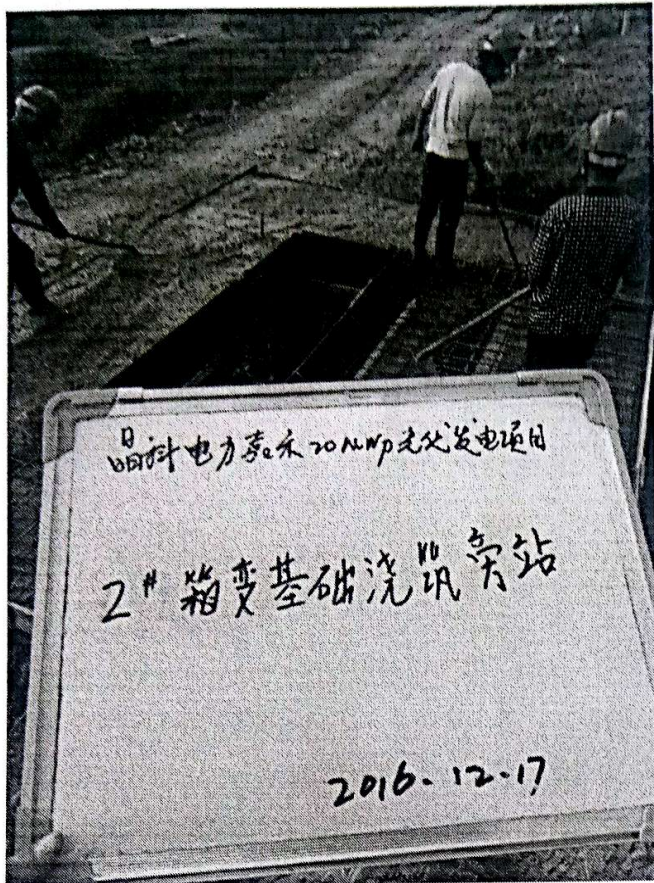


旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 04

日期及气候: 2016 年 12 月 23 天气: 晴 温度 16~7℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 4、5 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 10: 00		旁站监理结束时间: 14: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑量: <u>10.0m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>/</u> 组; 试块编号: <u>04</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☒ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u>/</u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u> 质 检 员: <u>马付有</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 23 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李丹海</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 23 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

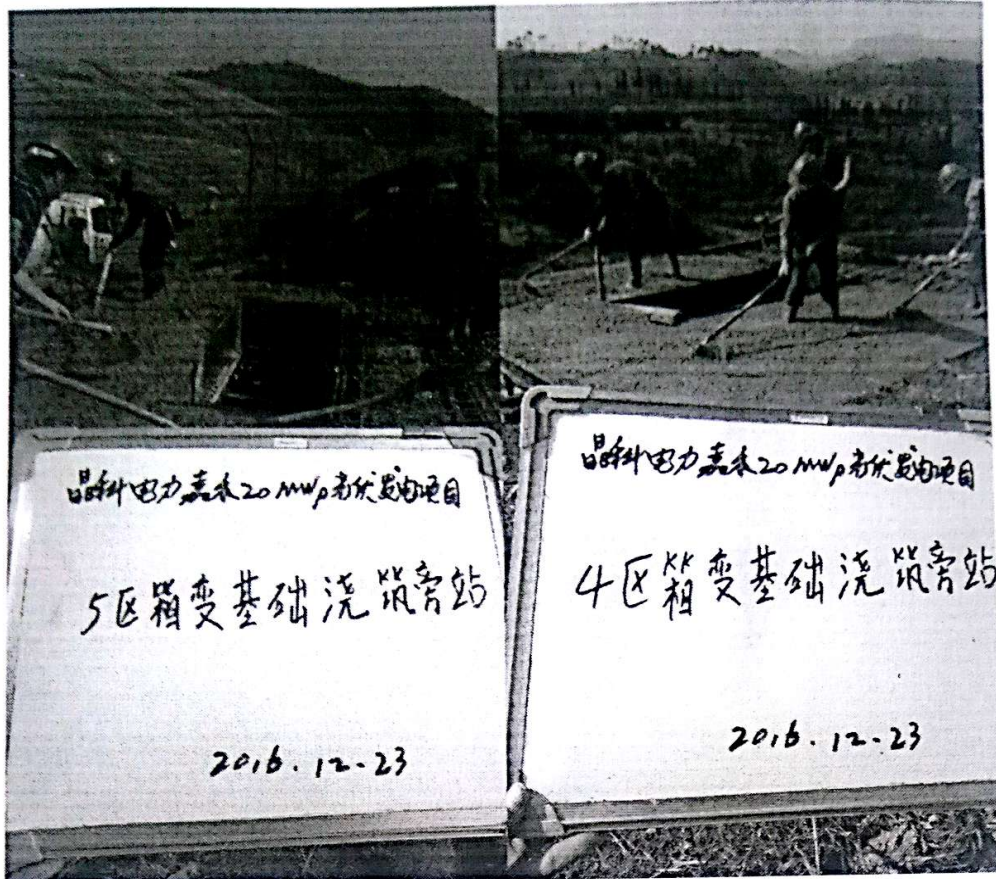

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 05

日期及气候: 2016 年 12 月 28 日 天气: 晴 温度 12~3℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 6、7 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 13: 30		旁站监理结束时间: 16: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>9.0m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> / <u> </u> 组; 试块编号: <u>05</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☒ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u> </u> / <u> </u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u> 质 检 员: <u>罗付有</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 28 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>王海海</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 28 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。



旁站监理记录表


旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 06

日期及气候: 2016 年 12 月 30 日 天气: 晴 温度 15~3℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 8、9 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 14: 30		旁站监理结束时间: 16: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u>有无</u> 钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☒, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑量: <u>9.0m³</u>. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> / <u> </u> 组; 试块编号: <u>06</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☒. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒. 15、其他: <u> </u> / <u> </u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u> 质 检 员: <u>字付有</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 30 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>字付有</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 30 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

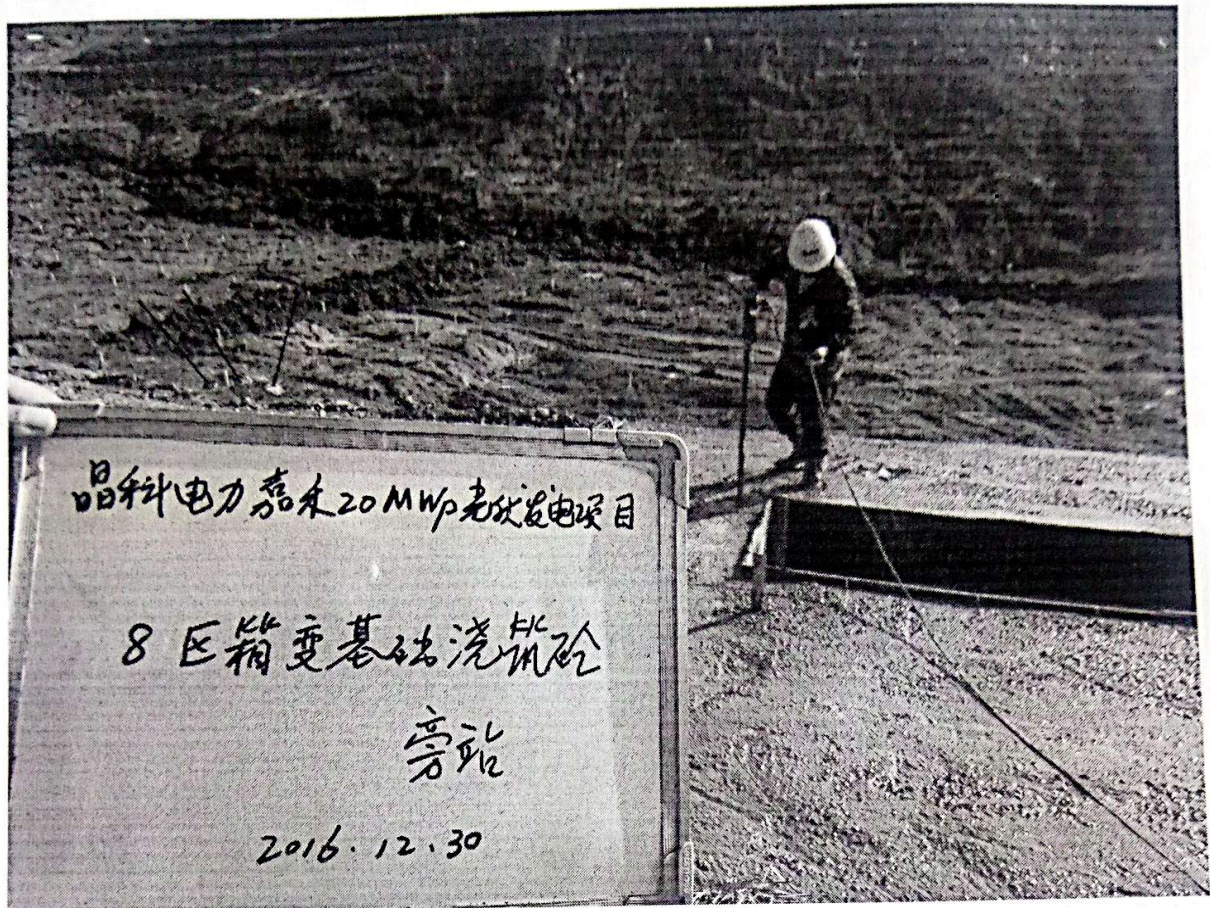



旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 07

日期及气候: 2017 年 1 月 2 日 天气: 晴 温度 18~12℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 10 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 14: 00		旁站监理结束时间: 15: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ .			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑量: <u>4.0m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>/</u> 组; 试块编号: <u>06</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☒ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ .			
15、其他: <u>/</u>			
发现问题: <u>/</u>			
处理意见: <u>/</u>			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>李付有</u>		旁站监理人员: <u>李付有</u>	
日 期: <u>2017 年 1 月 2 日</u>		日 期: <u>2017 年 1 月 2 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

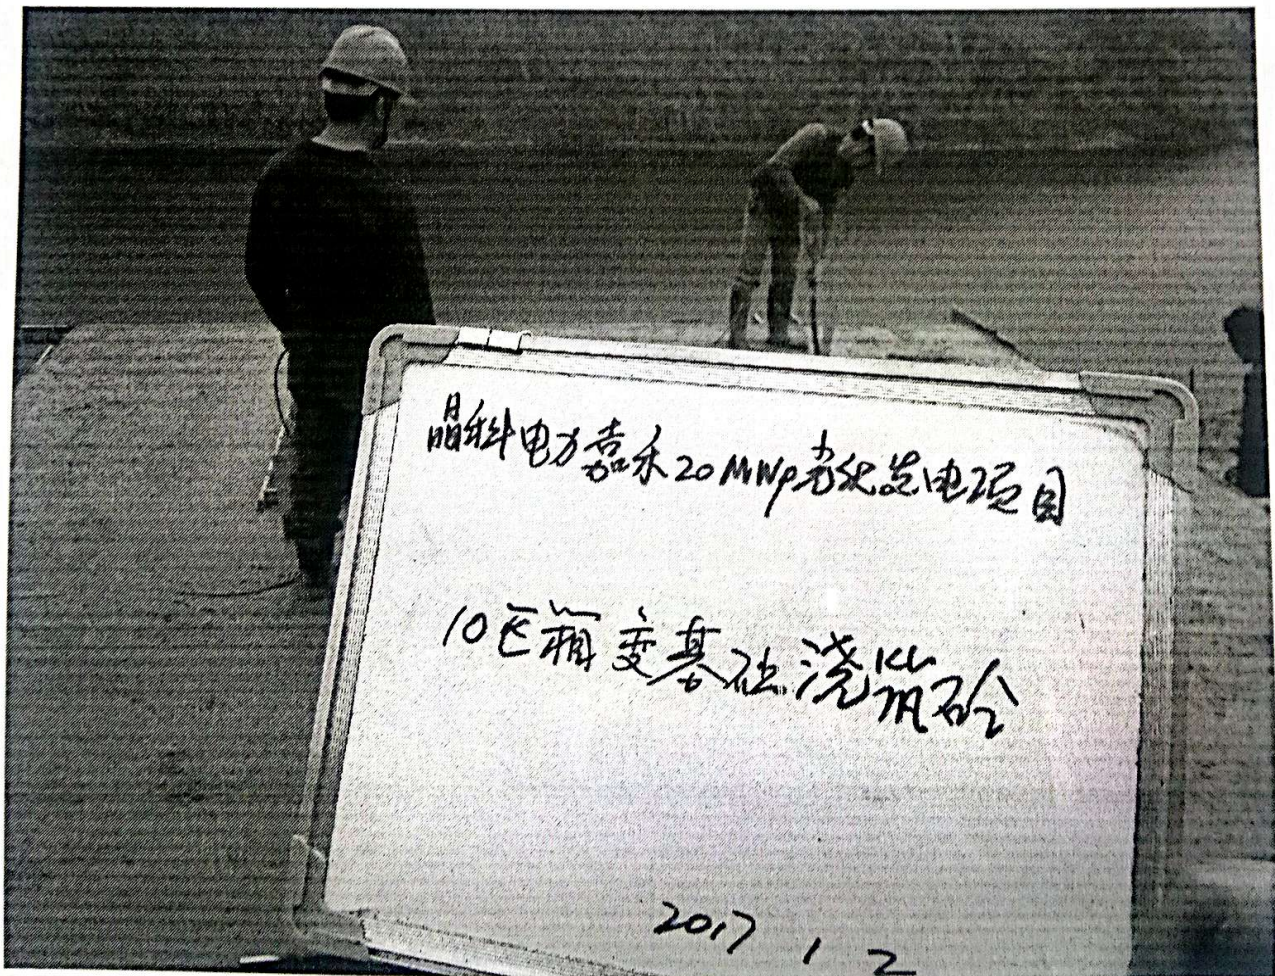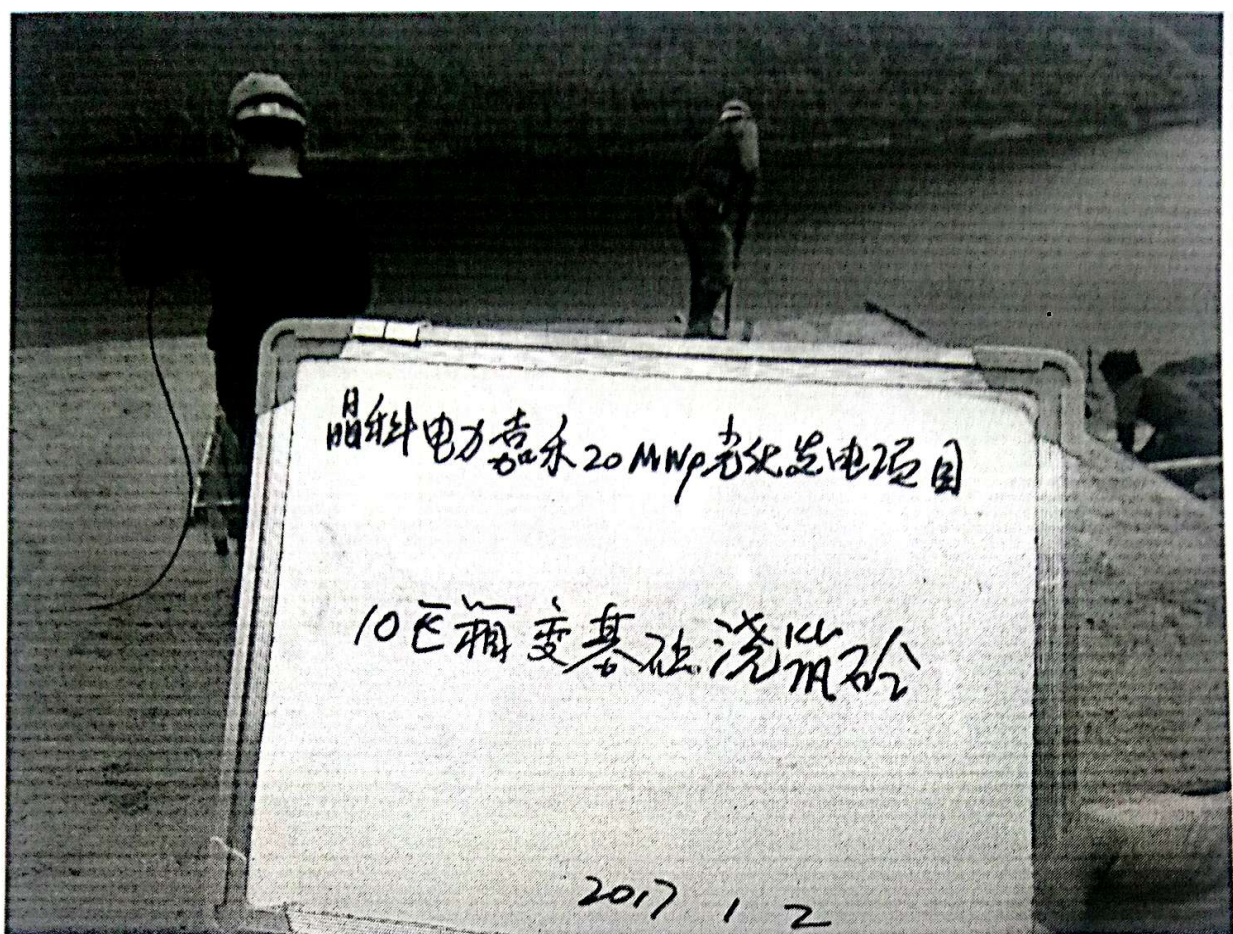

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 08

日期及气候: 2017 年 1 月 3 日 天气: 晴 温度 19~12℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 11 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 13: 00		旁站监理结束时间: 15: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u>有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.</u> 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☒, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>4.0m³</u>. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐. 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>/</u> 组; 试块编号: <u>06</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☒. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒. 15、其他: <u>/</u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u> 质 检 员: <u>罗付存</u> 日 期: <u>2017 年 1 月 3 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李A126</u> 日 期: <u>2017 年 1 月 3 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。





旁站监理记录表



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 09

日期及气候: 2017 年 1 月 3 日 天气: 晴 温度 19~12℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 12、13、14、15 区箱变基础承台浇筑砼			
旁站监理开始时间: 15: 30		旁站监理结束时间: 17: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.</u>			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ .			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑方量: <u>4.5m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> / <u> </u> 组; 试块编号: <u>06</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☒ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☒ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ .			
15、其他: <u> </u> / <u> </u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>李付有</u>		旁站监理人员: <u>李付有</u>	
日 期: <u>2017 年 1 月 3 日</u>		日 期: <u>2017 年 1 月 3 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

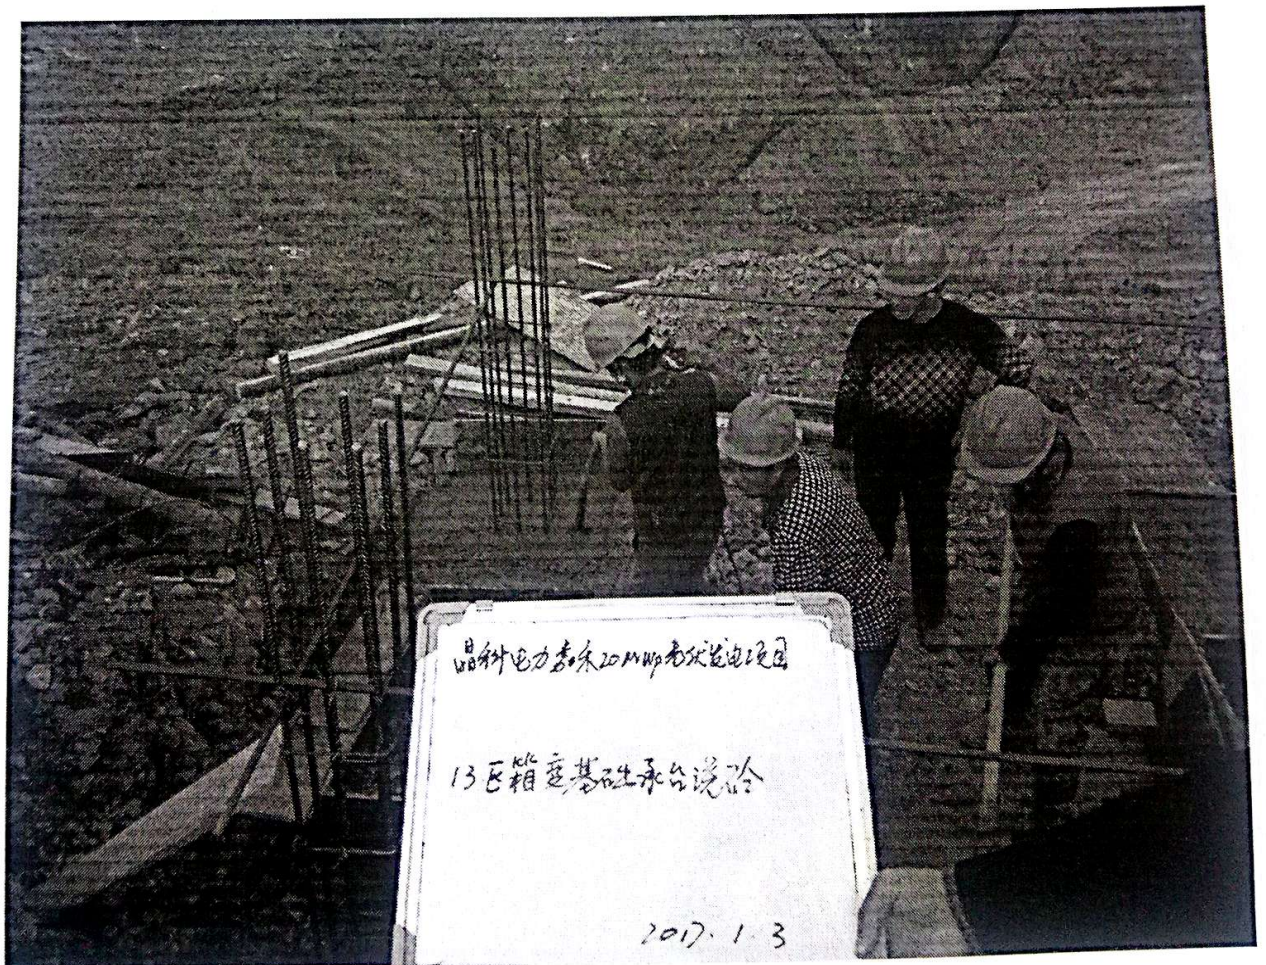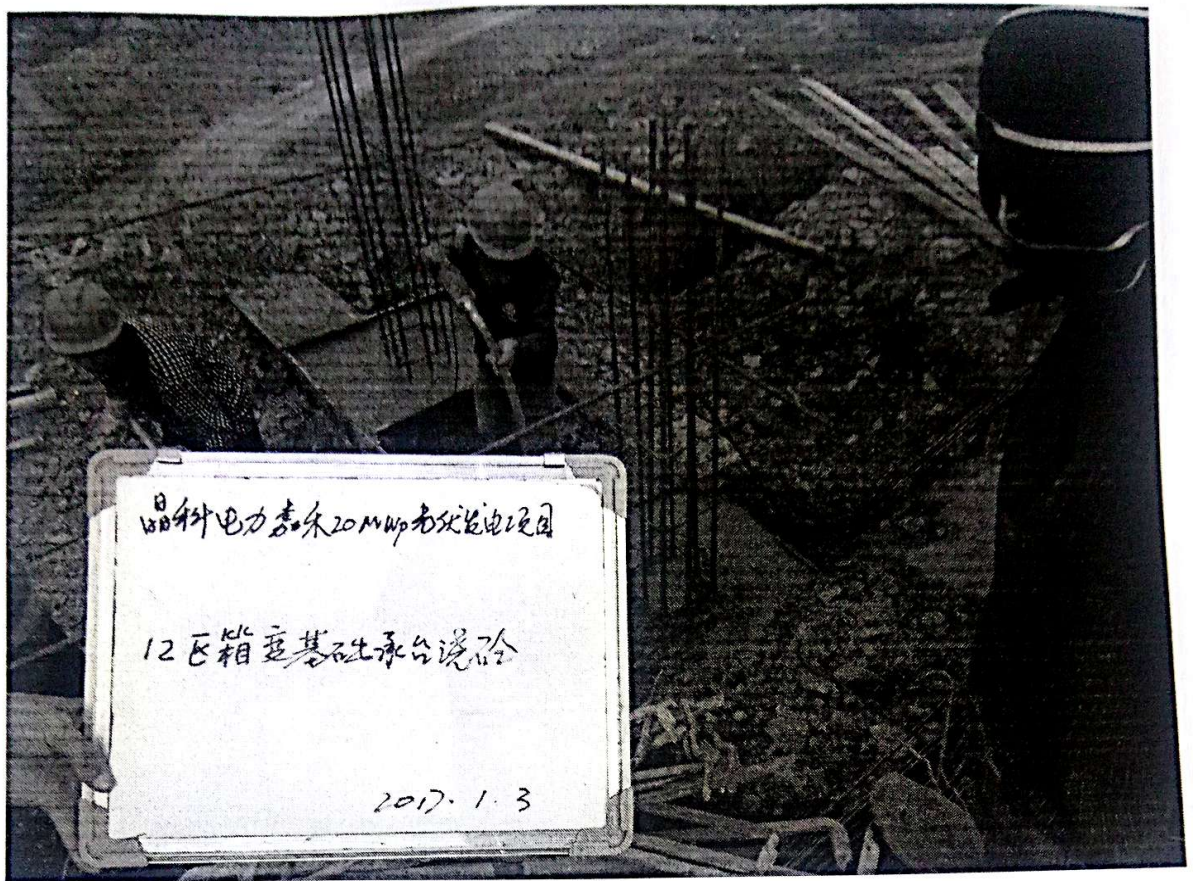

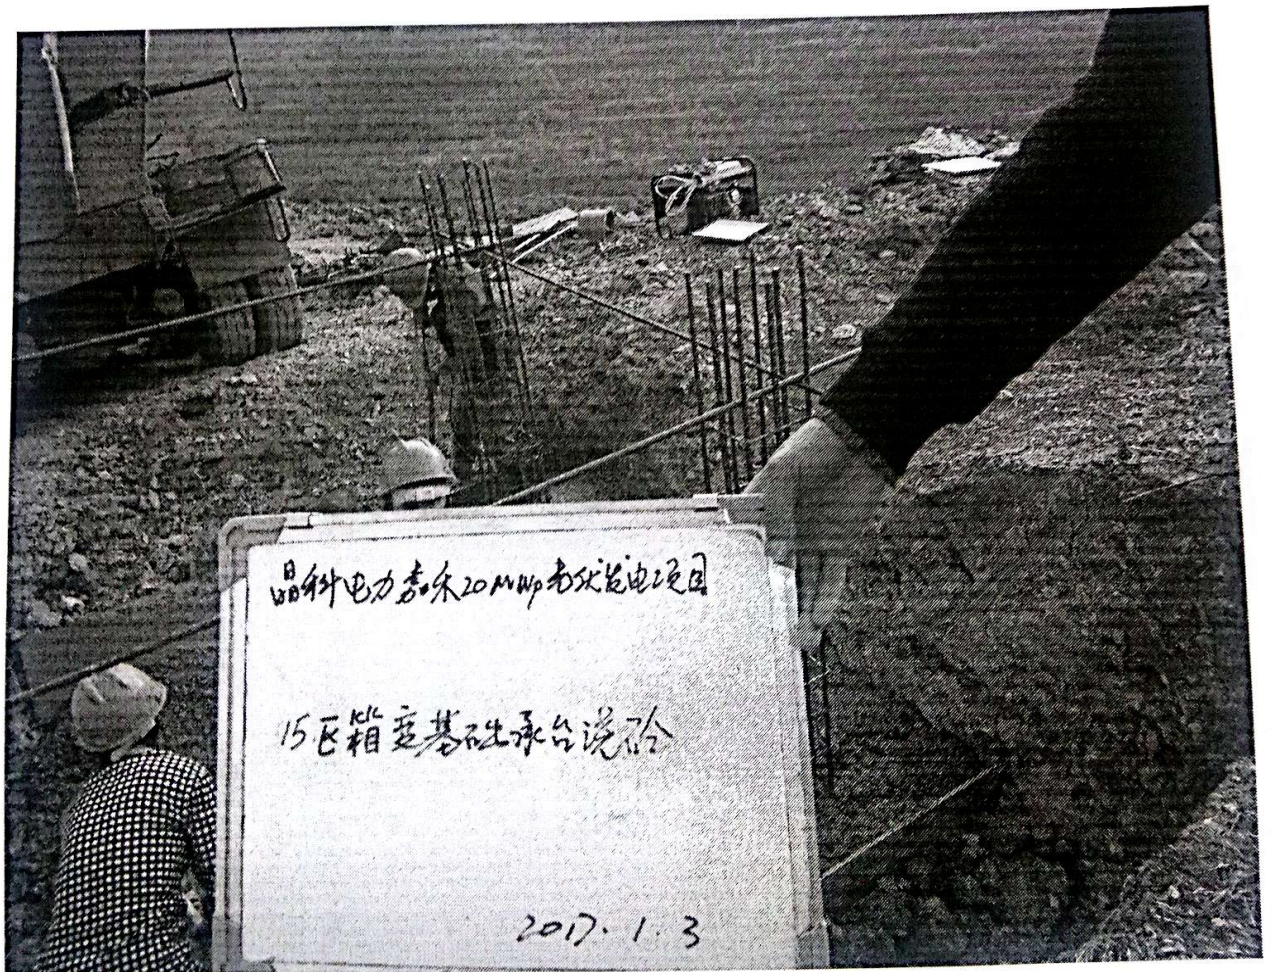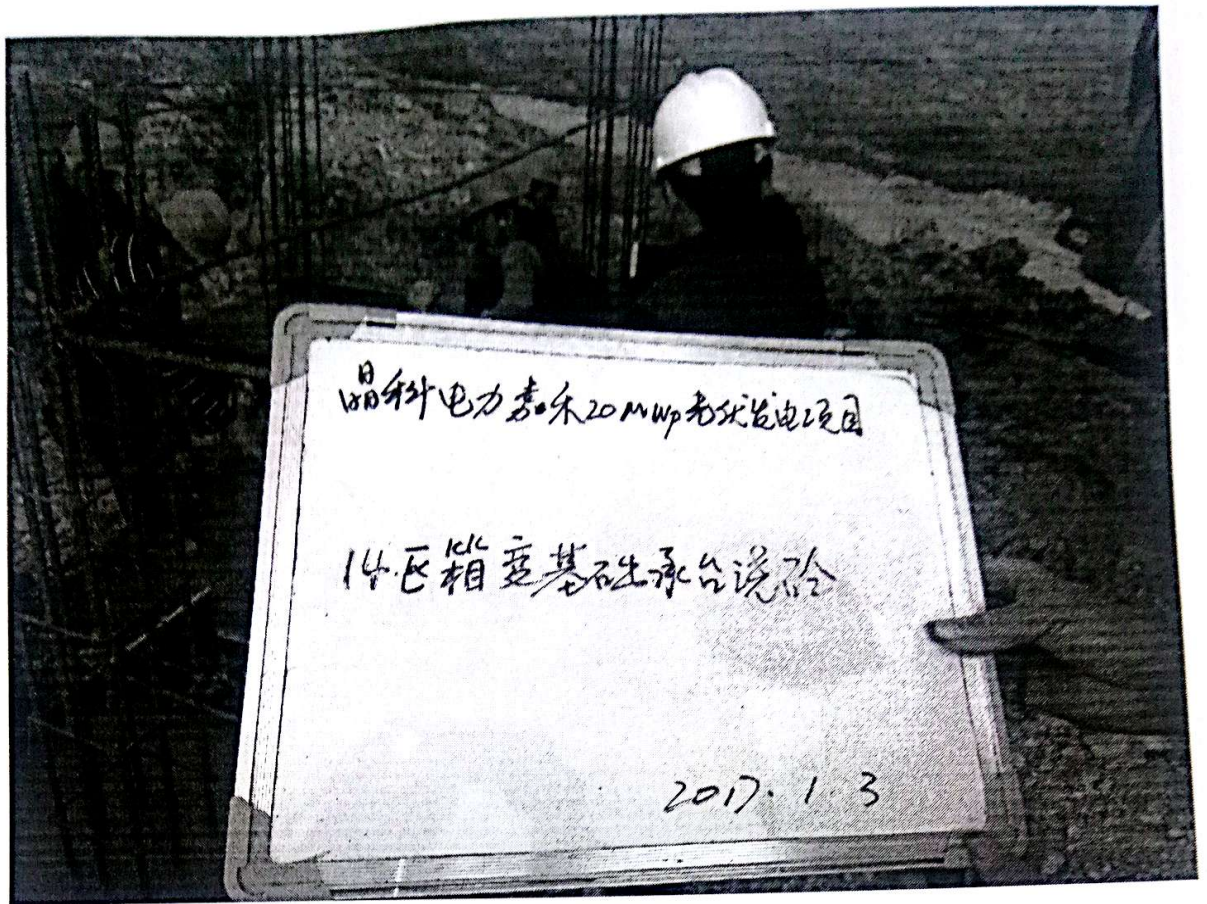

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 10

日期及气候: 2017年1月5日 天气: 多云 温度 24~12℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 12、13、14、15 区箱变基础柱、梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 9: 30		旁站监理结束时间: 17: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u>有无</u> 钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☒, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>16.0m³</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>/</u> 组; 试块编号: <u>10</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☒. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒; 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒. 15、其他: <u>/</u>			
发现问题: /			
处理意见: /			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>江西晶科能源工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李付有</u> 日 期: <u>2017 年 1 月 5 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李大海</u> 日 期: <u>2017 年 1 月 5 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

