

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 001

日期及气候: 2016 年 10 月 30 日 天气: 晴 温度 15~13℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 综合楼基础承台浇筑砼			
旁站监理开始时间: 16: 30		旁站监理结束时间: 20: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>70.00m³</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>综合楼承台 001</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工是 ☒, 否 ☐; 照明是否充足: 是 ☒, 否 ☐. 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 10 月 30 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 10 月 30 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 2 份。




旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 002

日期及气候: 2016 年 11 月 01 日 天气: 小雨 温度 14~12℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 综合楼基础柱浇筑砼			
旁站监理开始时间: 16: 00		旁站监理结束时间: 17: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>6.5m3</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>综合楼基础柱 002</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒. 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 01 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李海</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 01 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

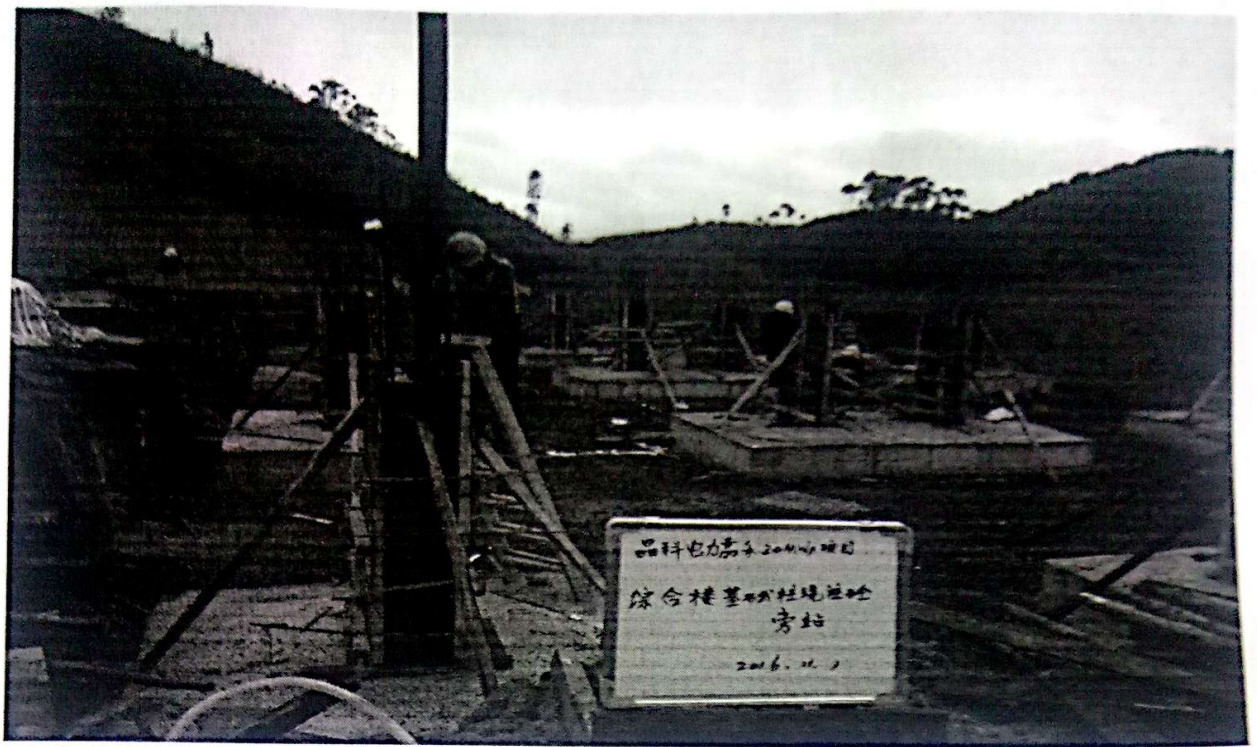


旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 003

日期及气候: 2016 年 11 月 07 日 天气: 多云 小雨 温度 26~15℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 开关站配电房基础承台浇筑砼			
旁站监理开始时间: 16: 00		旁站监理结束时间: 18: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.</u> 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>18.00m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>配电房开关站基础承台 003</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u>		监理单位: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>李淑萍</u>		旁站监理人员: <u>李淑萍</u>	
日 期: <u>2016 年 11 月 07 日</u>		日 期: <u>2016 年 11 月 07 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

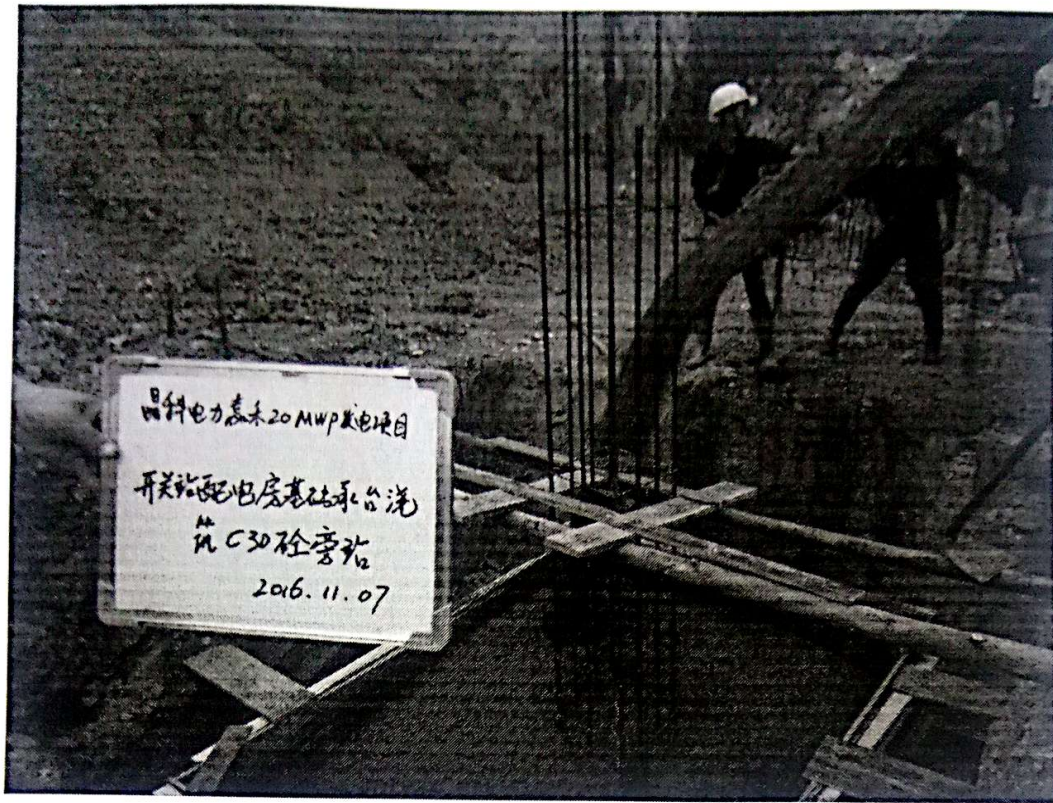

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 004

日期及气候: 2016 年 11 月 08 日 天气: 多云 小雨 温度 14~9℃

工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 开关站配电房基础承台浇筑砼

旁站监理开始时间: 16: 00

旁站监理结束时间: 17: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 合格 , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。
- 2、钢筋绑扎情况: 合格 , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; 有无 钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: C30 ; 混凝土类型: 普通砼 ;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ ;
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: 良好 ;
- 6、混凝土浇筑量: 3.00m3 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 配电房开关站基础柱 004 ;
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ;
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ;
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ 。
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ 。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。
- 14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ;
- 15、其他: 无

发现问题: 无

处理意见: 无

备 注: 附工程照片

施工项目部: 郴州鸿业建筑工程有限公司

质 检 员: 李淑萍

日 期: 2016 年 11 月 08 日



监理项目部: 常州正衡监理

旁站监理人员: 宗丹海

日 期: 2016 年 11 月 08 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。




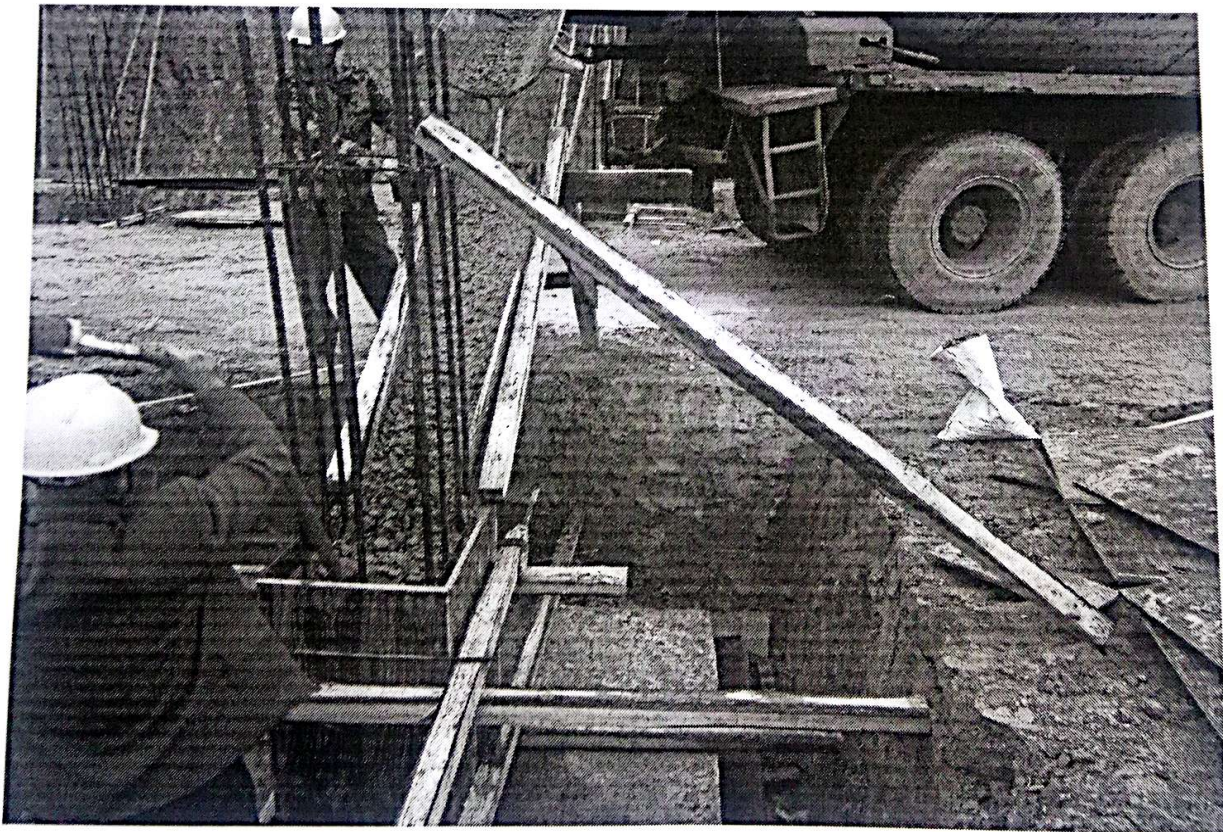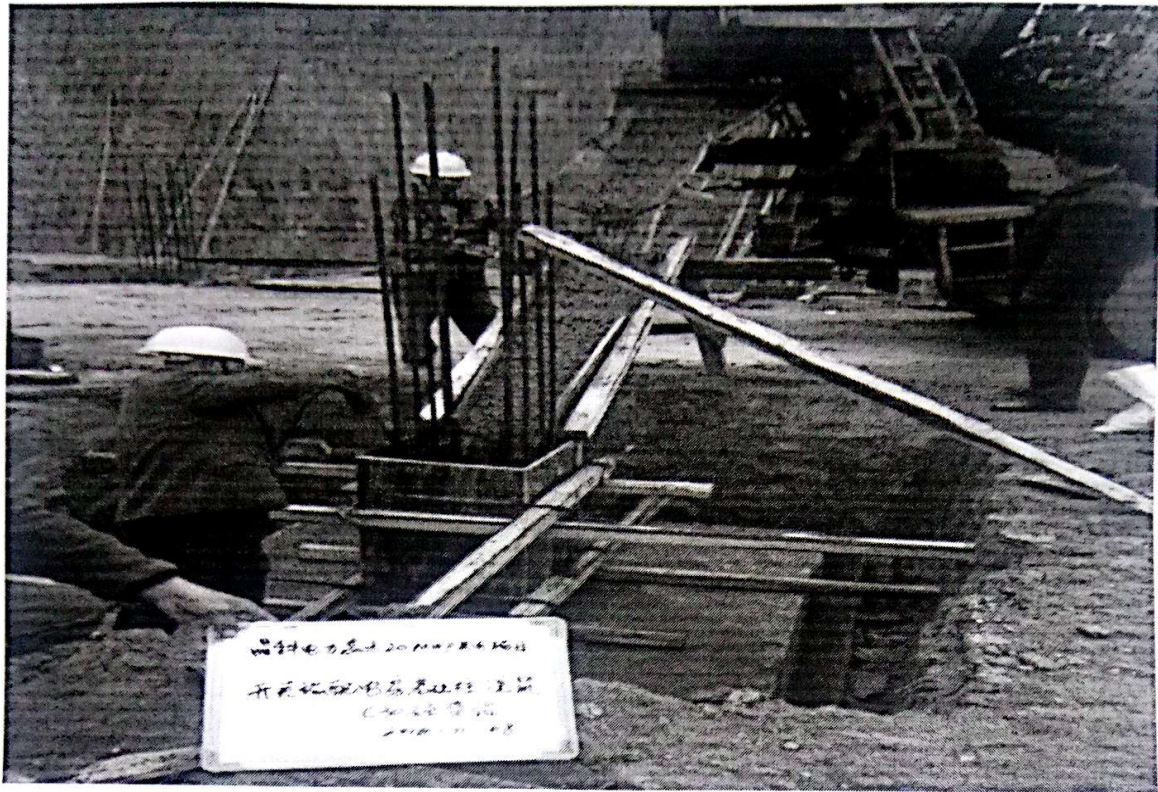

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 005

日期及气候: 2016 年 11 月 10 日 天气: 多云 温度 15~6℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 综合楼基础地梁浇筑砼			
旁站监理开始时间: 9: 30		旁站监理结束时间: 12: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: _____ 合格 _____, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: _____ 合格 _____, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; _____ 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>36.0m³</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>综合楼基础地梁 005</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒. 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 有不戴安全帽现象			
处理意见: 已责令改正			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 10 日</u>		 监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李海</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 10 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。





旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 006

日期及气候: 2016 年 11 月 11 日 天气: 多云 温度 18~14℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 配电房基础地梁浇筑砼			
旁站监理开始时间: 20: 00		旁站监理结束时间: 22: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ;			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑量: <u>12.0m³</u> . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>配电房基础地梁 006</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ;			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工是 ☒ , 否 ☐ ; 照明是否充足: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u>		监理单位: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>李淑萍</u>		旁站监理人员: <u>李淑萍</u>	
日 期: <u>2016 年 11 月 11 日</u>		日 期: <u>2016 年 11 月 11 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

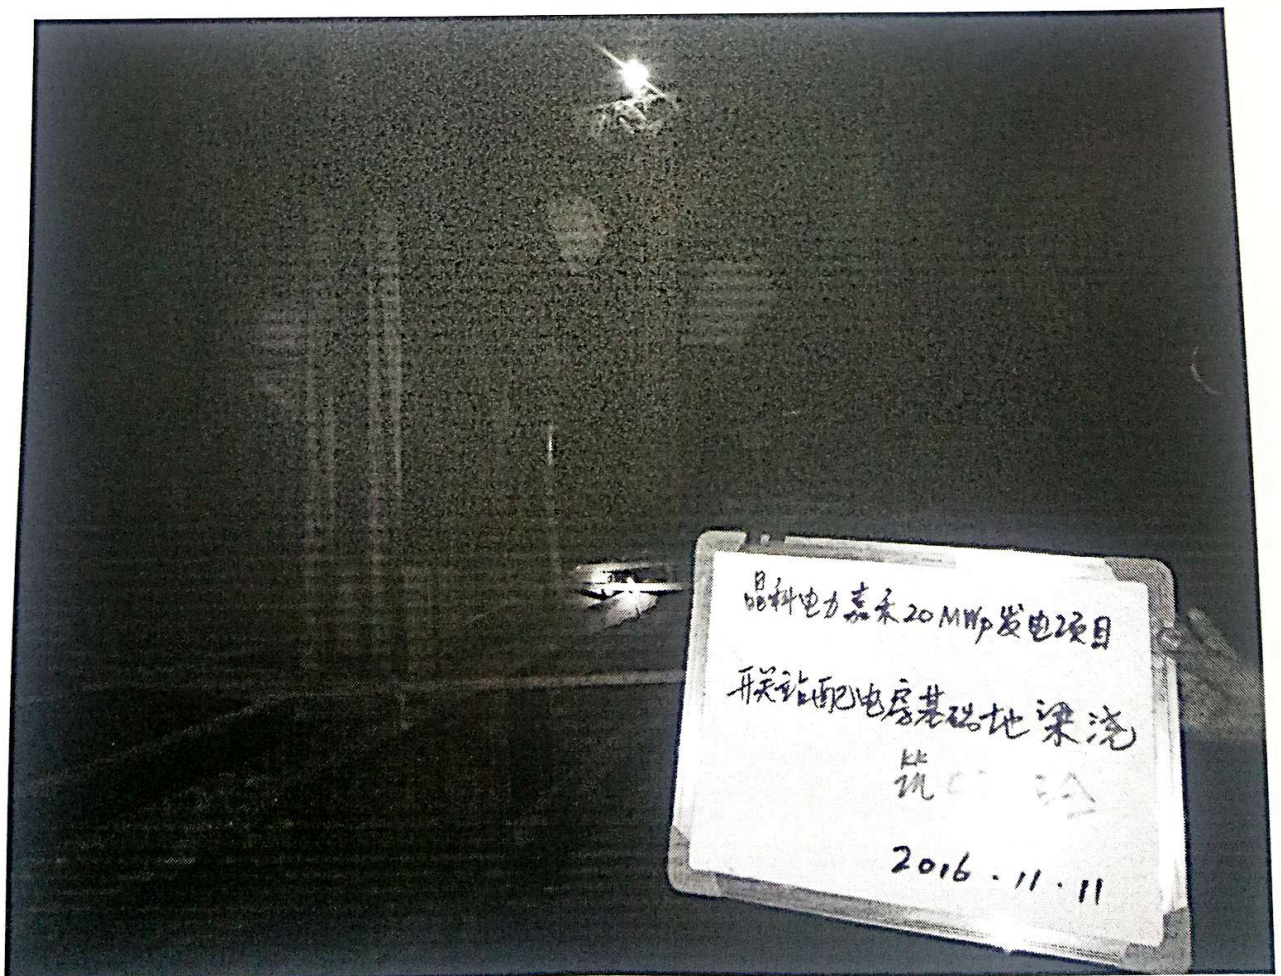



旁站监理记录表

编号: 007

工程名称: 品科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2016 年 11 月 14 日 天气: 小雨多云 温度: 25~16℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 配电房柱浇筑砼			
旁站监理开始时间: 20: 00		旁站监理结束时间: 22: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> ; 6、混凝土浇筑方量: <u>12.0m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>配电房柱 007</u> ; 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☒ , 否 ☐ ; 照明是否充足: 是 ☒ , 否 ☐ ; 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 14 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李海</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 14 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

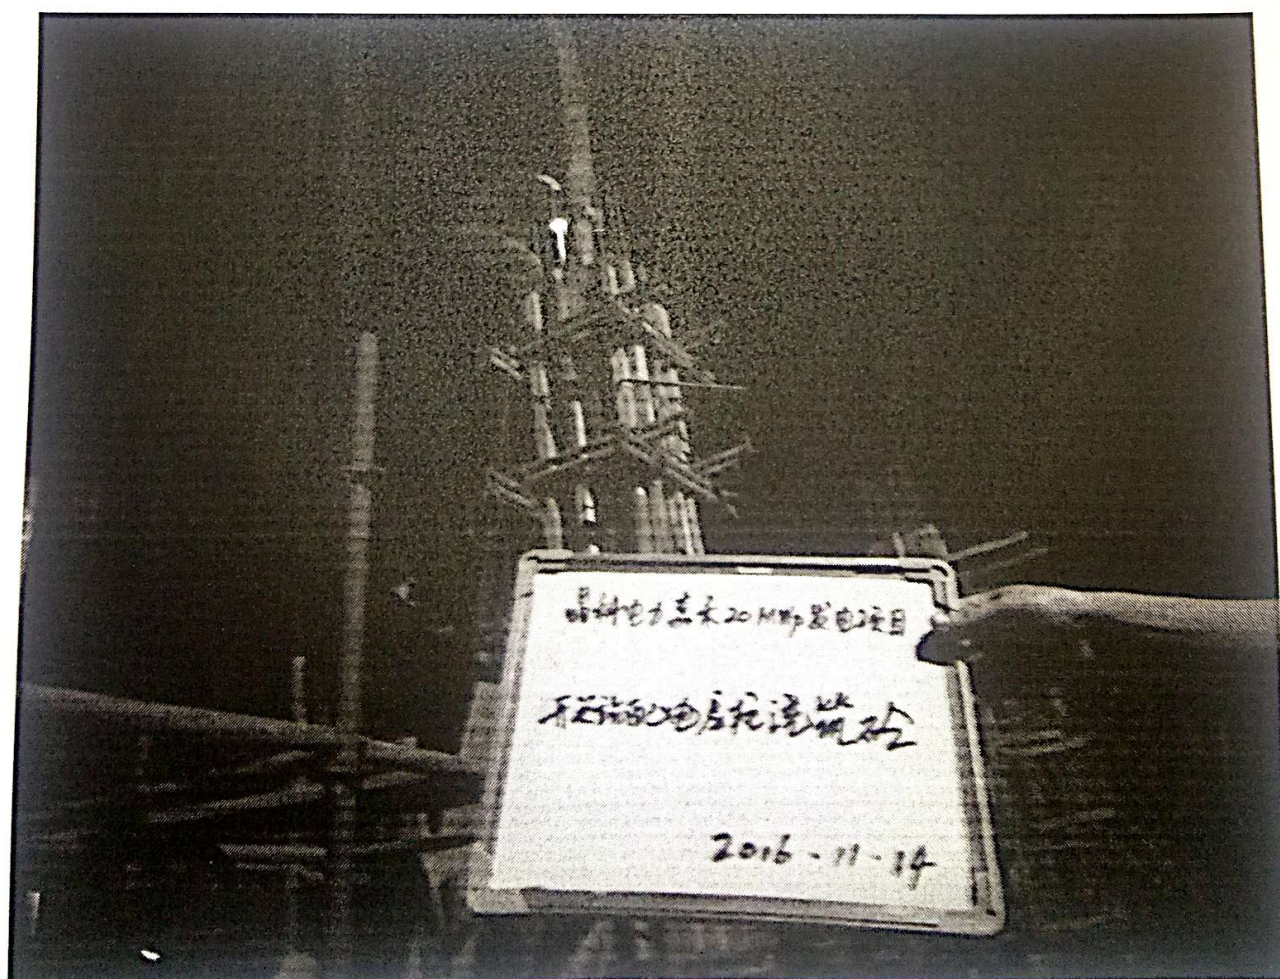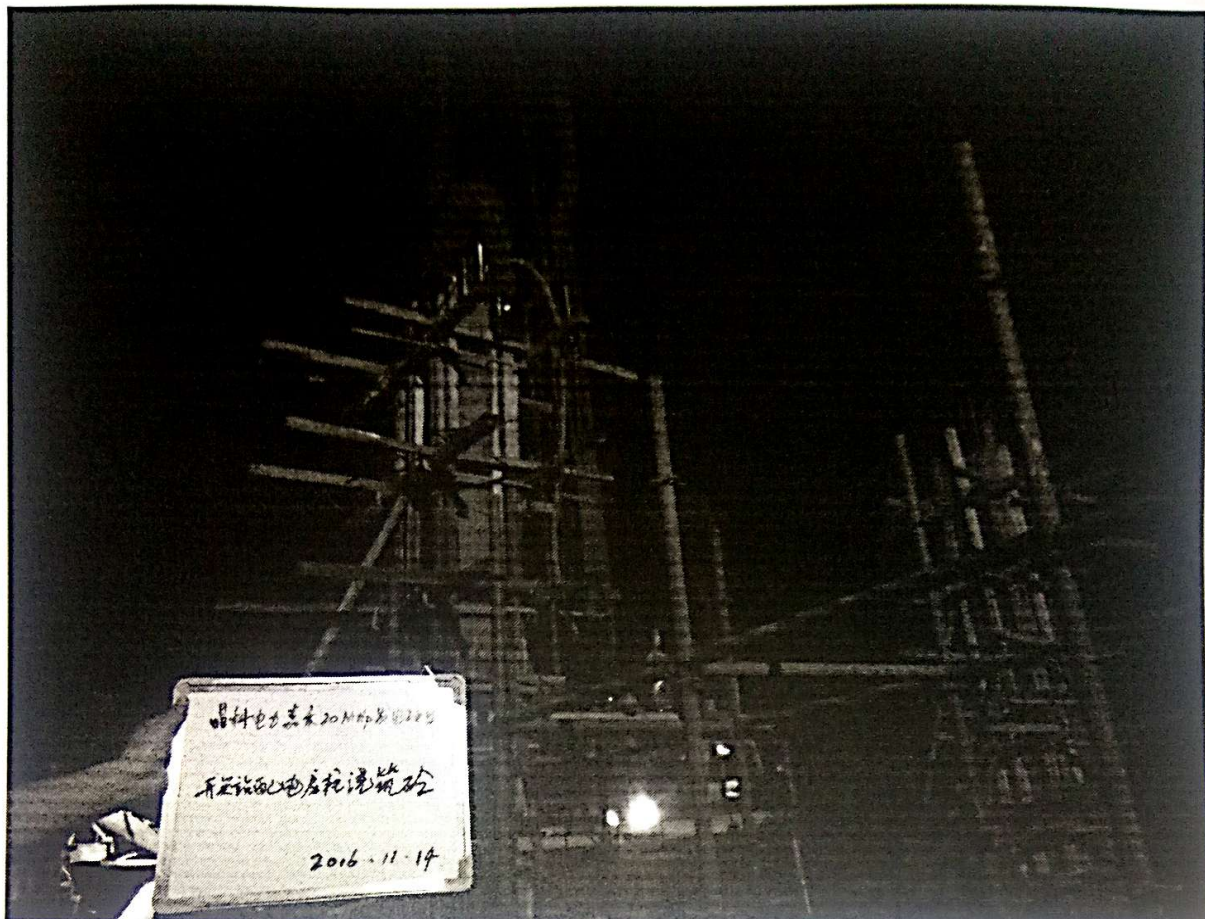

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 008

日期及气候: 2016 年 11 月 20 日 天气: 暴雨 多云 温度 23~17℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 配电房梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 15: 00		旁站监理结束时间: 17: 40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: _____ 合格 _____, 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: _____ 合格 _____, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; _____ 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑量: <u>40.0m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>配电房梁板 008</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 20 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李海</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 20 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。



旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 009

日期及气候: 2016 年 11 月 22 日 天气: 小到中雨 温度: 19~5℃

工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 综合用房一层柱浇筑砼

旁站监理开始时间: 16: 40

旁站监理结束时间: 17: 50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:


- 1、模板安装情况: 合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通砼;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
- 6、混凝土浇筑方量: 8.5m³. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 综合用房一层柱 009
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☒, 否 ☐.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
- 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒.
- 15、其他: 无

发现问题: 无

处理意见: 无

备 注: 附工程照片

施工项目部: 郴州鸿业建筑工程有限公司质 检 员: 李淑萍日 期: 2016 年 11 月 22 日监理项目部: 常州正衡监理旁站监理人员: 李淑萍日 期: 2016 年 11 月 22 日注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

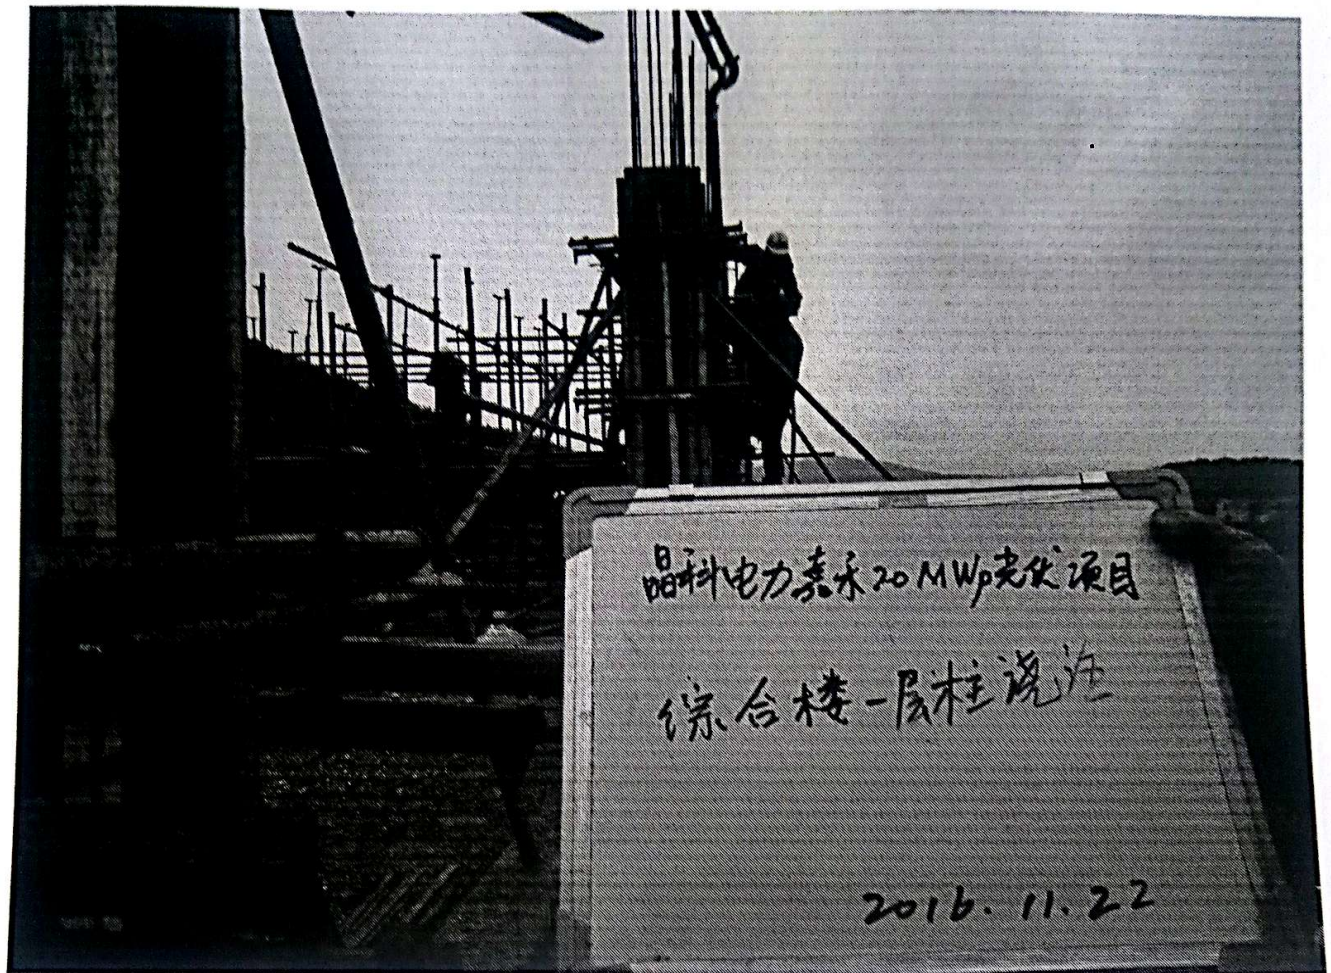


旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 010

日期及气候: 2016 年 12 月 04 日 天气: 多云 温度 20~11℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 综合用房一层梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 17: 00		旁站监理结束时间: 23: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑量: <u>84m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>综合用房一层梁板 010</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工是 ☒ , 否 ☐ ; 照明是否充足: 是 ☒ , 否 ☐ ; 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u>		监理单位: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>李淑萍</u>		旁站监理人员: <u>李淑萍</u>	
日 期: <u>2016 年 12 月 04 日</u>		日 期: <u>2016 年 12 月 04 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

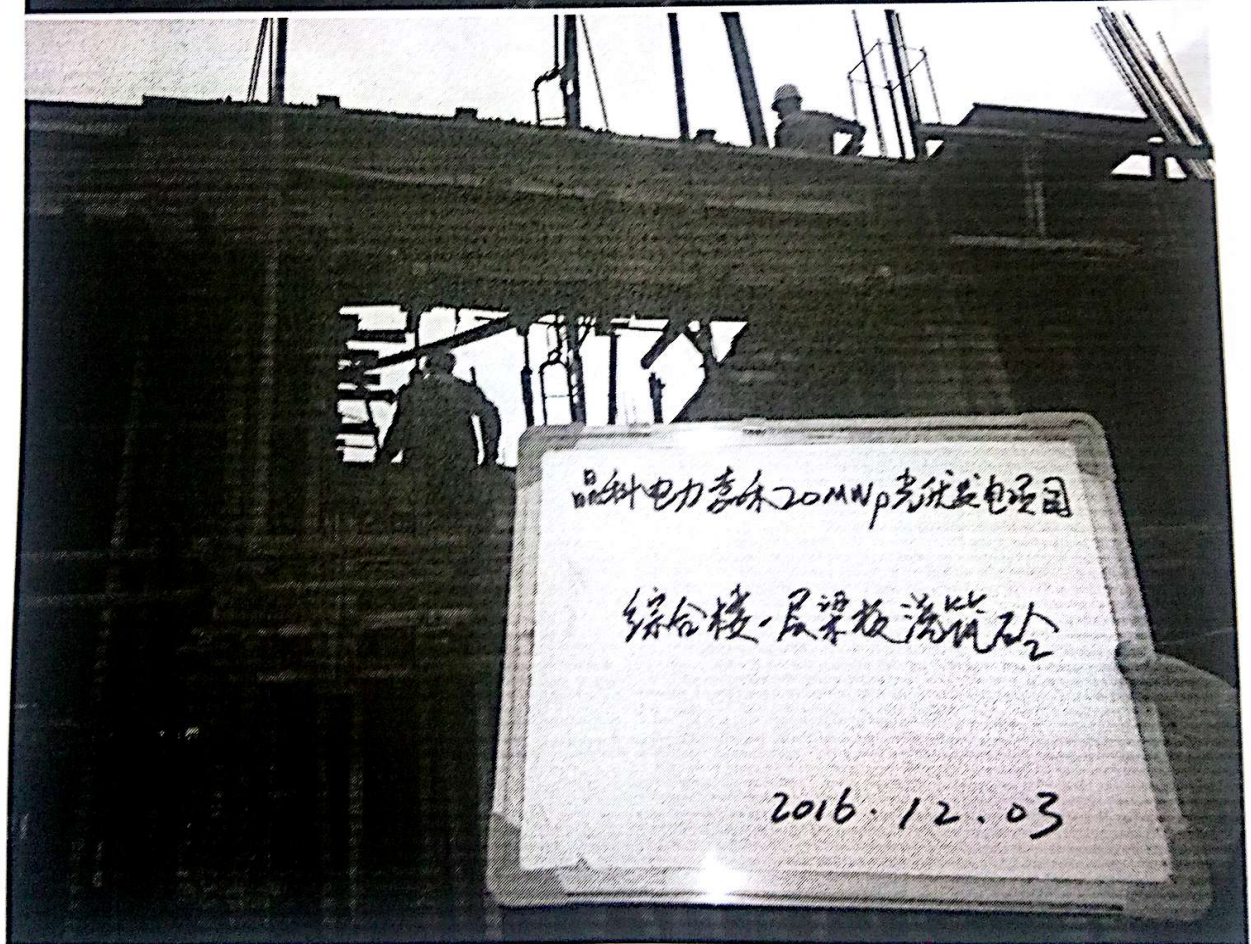



旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 011

日期及气候: 2016 年 12 月 04 日 天气: 多云 温度 20~11℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 接地变基础及 SVG 基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 23: 30		旁站监理结束时间: 24: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: _____ 合格 _____, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: _____ 合格 _____, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; _____ 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>6+18m3</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>接地变基础及 SVG 基础浇筑砼 011</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工是 ☒, 否 ☐; 照明是否充足: 是 ☒, 否 ☐. 15、其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 04 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 04 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

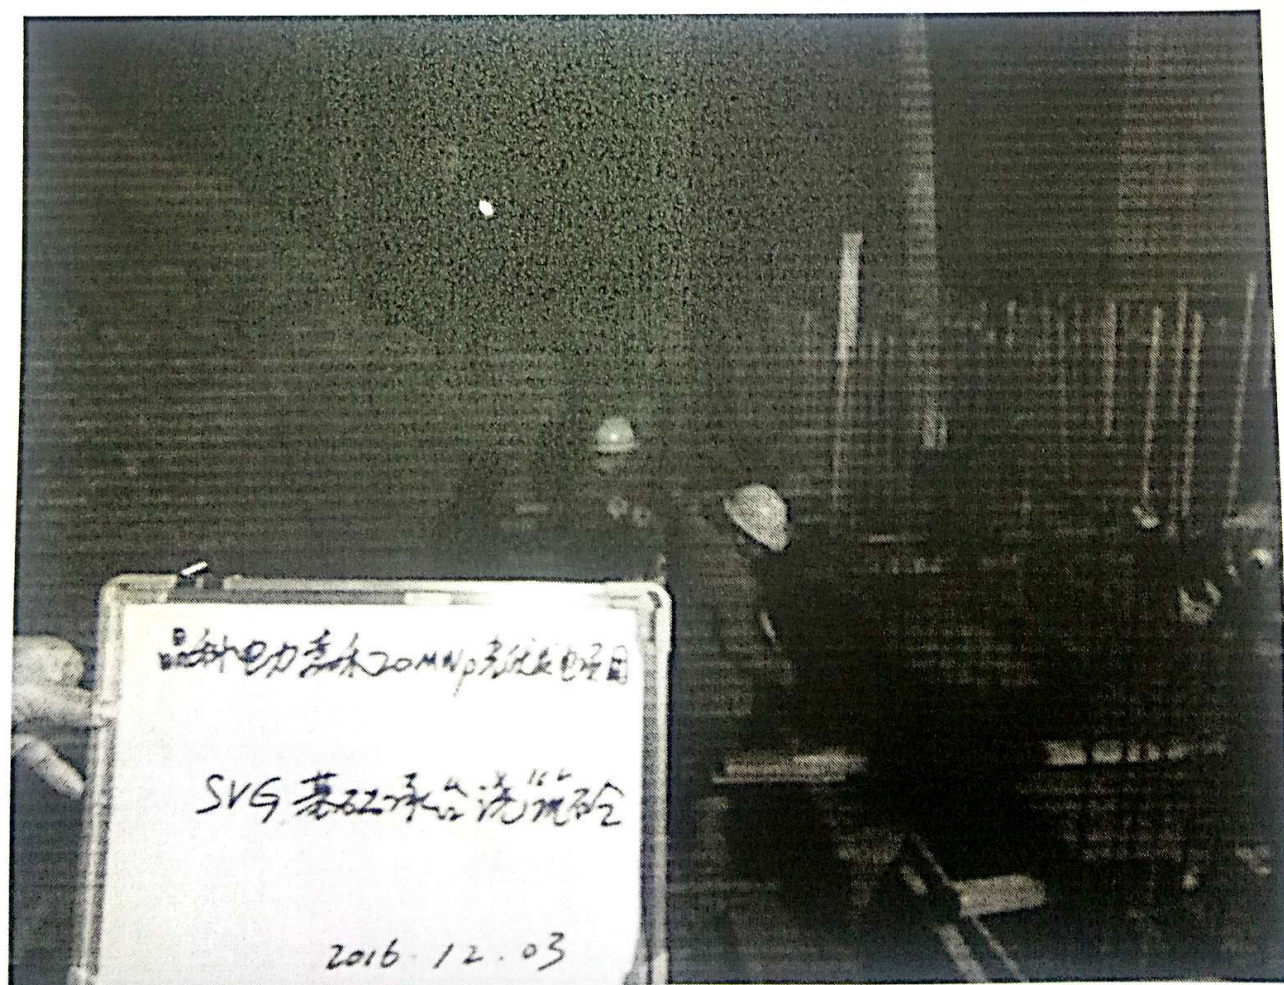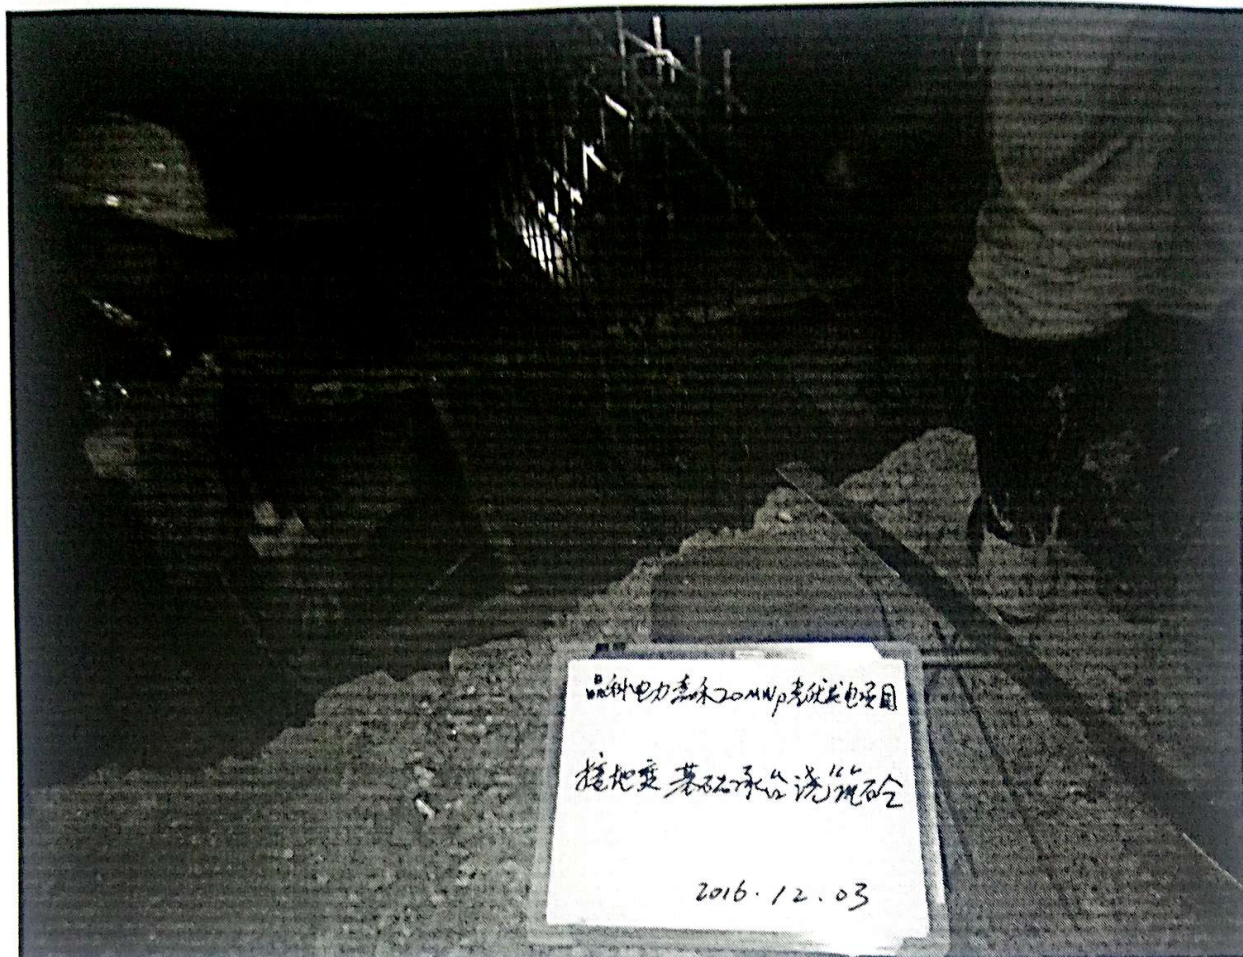

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 012

日期及气候: 2016 年 12 月 20 日 天气: 小雨 温度: 16~12℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 综合用房二层柱梁板浇筑砼			
旁站监理开始时间: 11: 00		旁站监理结束时间: 16: 30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1. 模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2. 钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>无</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3. 混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4. 混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5. 混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6. 混凝土浇筑方量: <u>86m³</u> , 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>综合用房一层梁板 012</u> 7. 混凝土运输、浇筑及同数的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8. 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9. 是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10. 施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ 。 11. 混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ 。 12. 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13. 施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14. 是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15. 其他: <u>无</u>			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州鸿业建筑工程有限公司</u> 质 检 员: <u>李淑萍</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 20 日</u>		监理单位: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李月海</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 20 日</u>	

注 本表由监理单位填写, 监理单位存 份。

