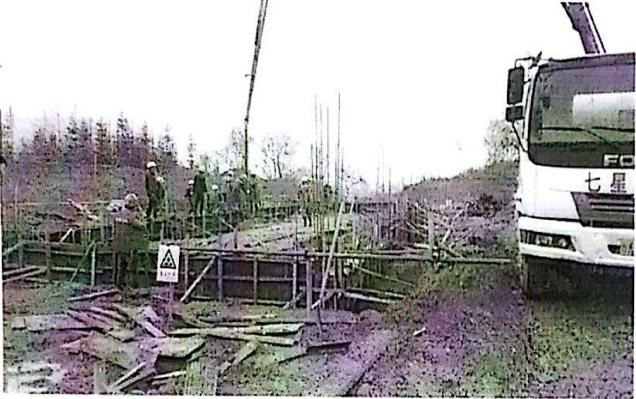


旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：003

日期及气候：2017 年 3 月 19 日 小雨 9-13℃	施工地点：红联 35KV 开关站
旁站监理的部位和工序：配电综合室、综合楼基础梁浇筑	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：16: 30
施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商品混凝土，等级为 C25 ，共计 84m³ 。  4、	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、个别部位表面不平。	
处理意见： 1、让施工人员处理平整	
备注（包括处理结果）： 施工单位已经对表面处理平整。	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u>肖俊明</u> 日 期：2017 年 3 月 19 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>肖俊明</u> 日 期：2017 年 3 月 19 日

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。
