

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: PDS-003

日期及气候: 2016 年 1 月 5 日 小雨 6-11℃

施工地点: 红联村 110KV 汇集站


旁站监理的部位和工序: 综合配电室基础梁浇筑

旁站监理开始时间: 17: 00

旁站监理结束时间: 19: 30

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 9 人, 施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土, 等级为 C30 , 共计 34m³

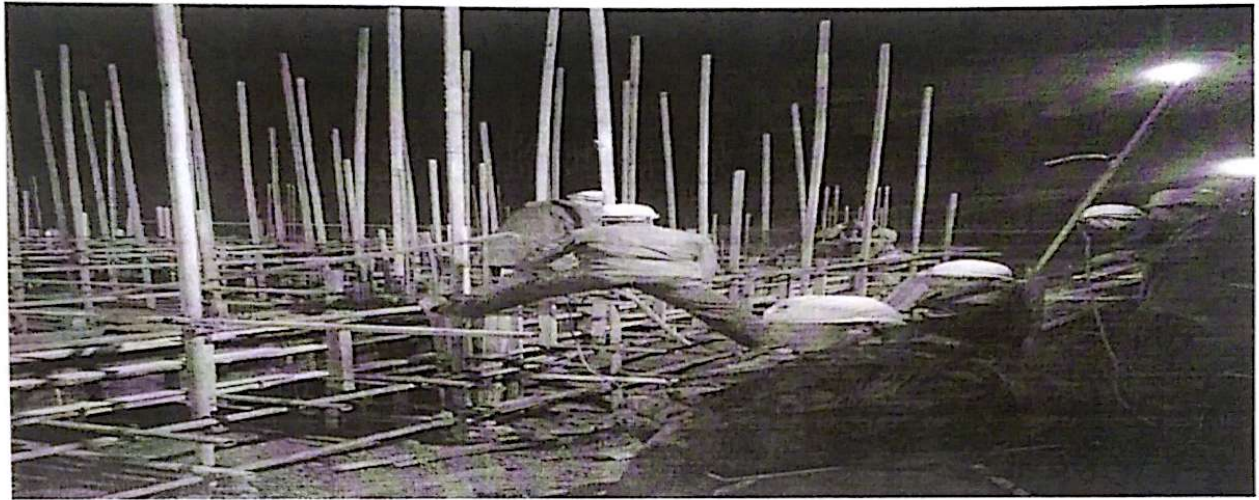

4、。

监理情况:

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。

发现问题:

- 1、部分位置箍筋间距过大
- 2、部分梁与柱钢筋交接位置缺拉筋

处理意见:

- 1、让施工人员处理整改加箍筋与拉筋

备注 (包括处理结果):

施工单位已整改。

承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司

质 检 员: 朱志兵

日 期: 2017 年 1 月 5 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 周守明

日 期: 2017 年 1 月 5 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
