

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：PDS-005

日期及气候：2017 年 1 月 17 日 多云 4-8℃

施工地点：红联村 110KV 汇集站


旁站监理的部位和工序：配电综合室 1-5 周屋面梁板浇筑

旁站监理开始时间：15: 00

旁站监理结束时间：18: 00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土，等级为 C30 ，共计 69m³

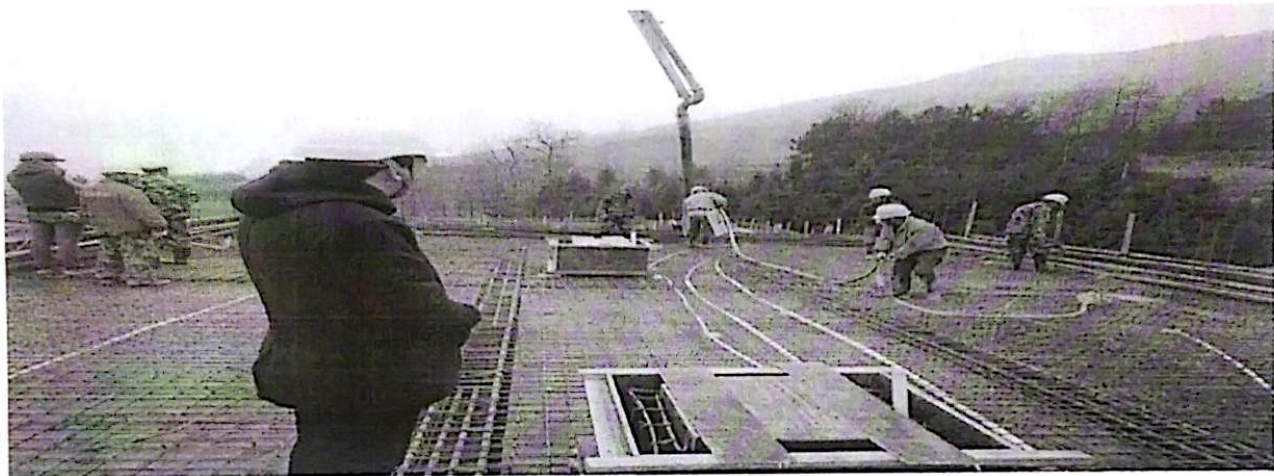

监理情况：

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

部分构造柱倾斜

处理意见：

要求施工人员加固扶正

备注（包括处理结果）：

施工单位已按要求加固扶正整改

承包单位：湖南省工业设备安装有限公司

质检员：朱志兵

日期：2017 年 1 月 17 日

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：马志明

日期：2017 年 1 月 17 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
