

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: GJJC-003

日期及气候: 2017 年 1 月 16 日 多云 3-8℃

施工地点: 红联村 110KV 汇集站


旁站监理的部位和工序: 2#构架基础浇筑

旁站监理开始时间: 15: 00

旁站监理结束时间: 16: 00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 7 人, 施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土, 等级为 C25 , 共计 5m³

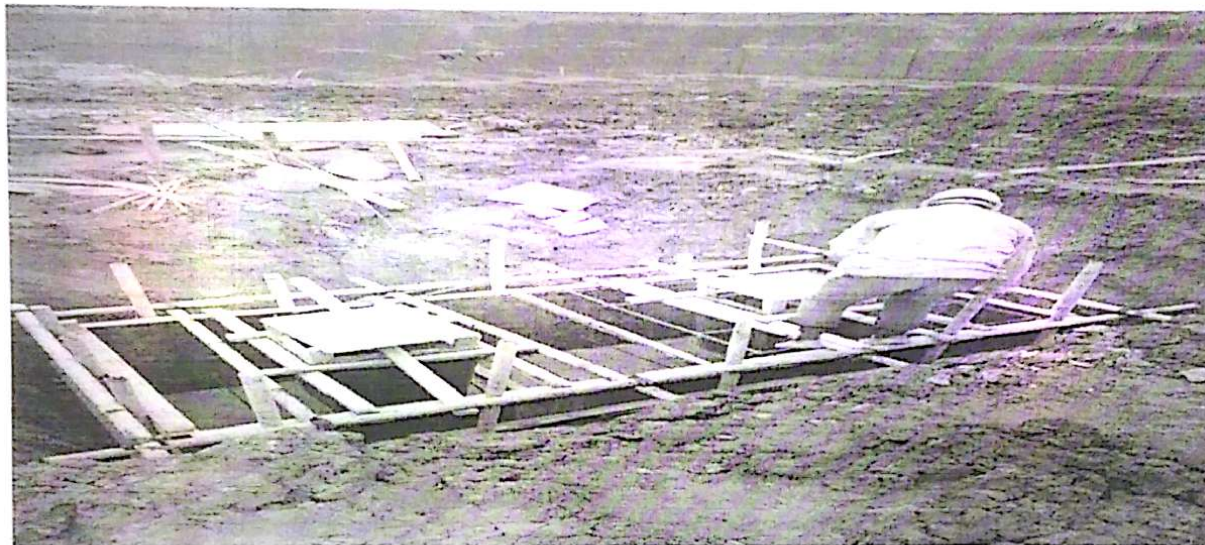

4、

监理情况:

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。

发现问题:

模板未固定牢

处理意见:

要求施工人员加固模板

备注 (包括处理结果):

施工单位已按要求加固模板

承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司

质检员: 朱志兵

日期: 2017 年 1 月 16 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 马守明

日期: 2017 年 1 月 16 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
