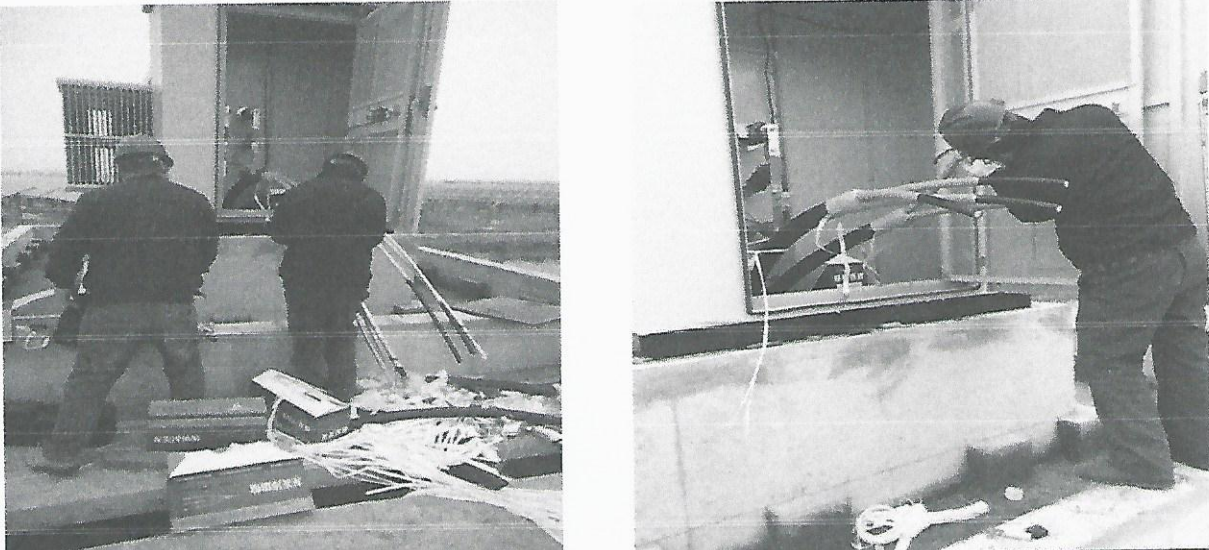


旁站监理记录

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-011

日期及气候: 2017 年 01 月 02 日	工程地点: 3 号塘
旁站监理的部位或工序: 11#箱变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间: 13: 00	旁站监理结束时间: 14:00
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、5 人施工, 监护 1 人, 电缆制作 2 人, 试验 1 人, 记录一人。 4、施工仪器: 对相器、兆欧表铁锯、锉刀、短线钳、钳压机、美工刀。 5、现场设备齐全安全施工。	
	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查设备运转正常。 4、材料型号: 3*300、3*150。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 江苏华能建设工程集团有限 质 检 员: <u>陈超</u> 日 期: 2017 年 01 月 02 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公 旁站监理人员: <u>王石屹</u> 日 期: 2017 年 01 月 02 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。
