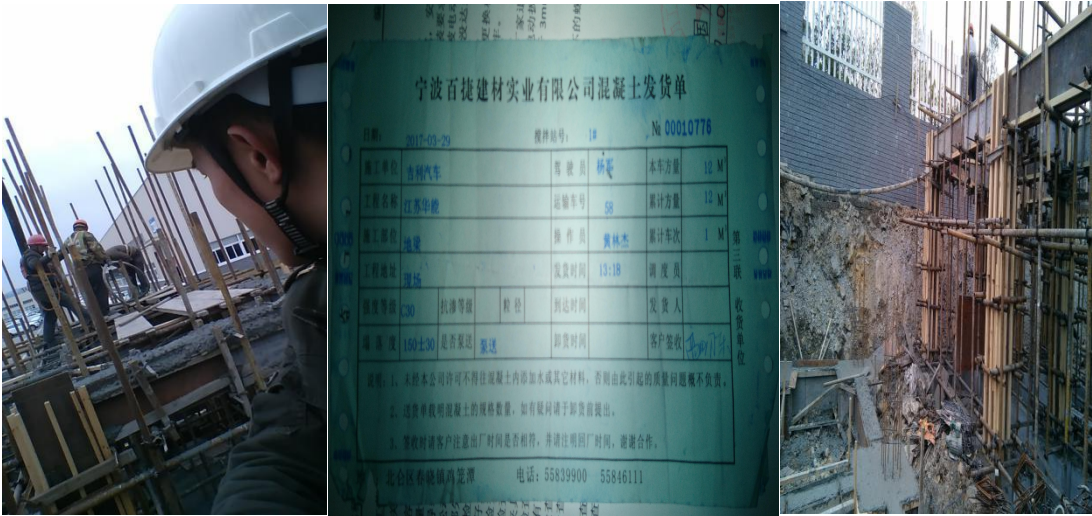


旁站监理记录表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号： 20170329

日期及天气：2017.03.29	晴	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变升压集装箱 1NJX05、1NJX06 打地梁 1NJX01 立柱、圈梁的浇筑		
旁站监理开始时间：2017.03.29. 09: 00		旁站监理结束时间：2017.03.29. 11: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况：采用商混，强度 C30，振捣棒 2 台（1 台备用）。采用混凝土泵车运料，方量 12 立方。 施工员、施工班组长、质检员到岗，木工 2 人、钢筋工 3 人、瓦工 12 人。 1、检查基础钢筋绑扎情况及模板的几何尺寸，均符合要求。2、现场采用商品混凝土，资料齐全，符合要求；塌落度检查，符合要求。3、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动插点均匀。		
		
发现的问题及处理情况： 发现问题： 个别部位模板加固不到位，存在胀模现象。 逆变升压集装箱 1NJX05、1NJX06 打地梁浇筑水平度前后误差 3cm 处理情况： 现场施工人员进行加固处理。 在拆模完成后进行抹灰。		
旁站监理人员（签字）：		2017 年 03 月 29 日
