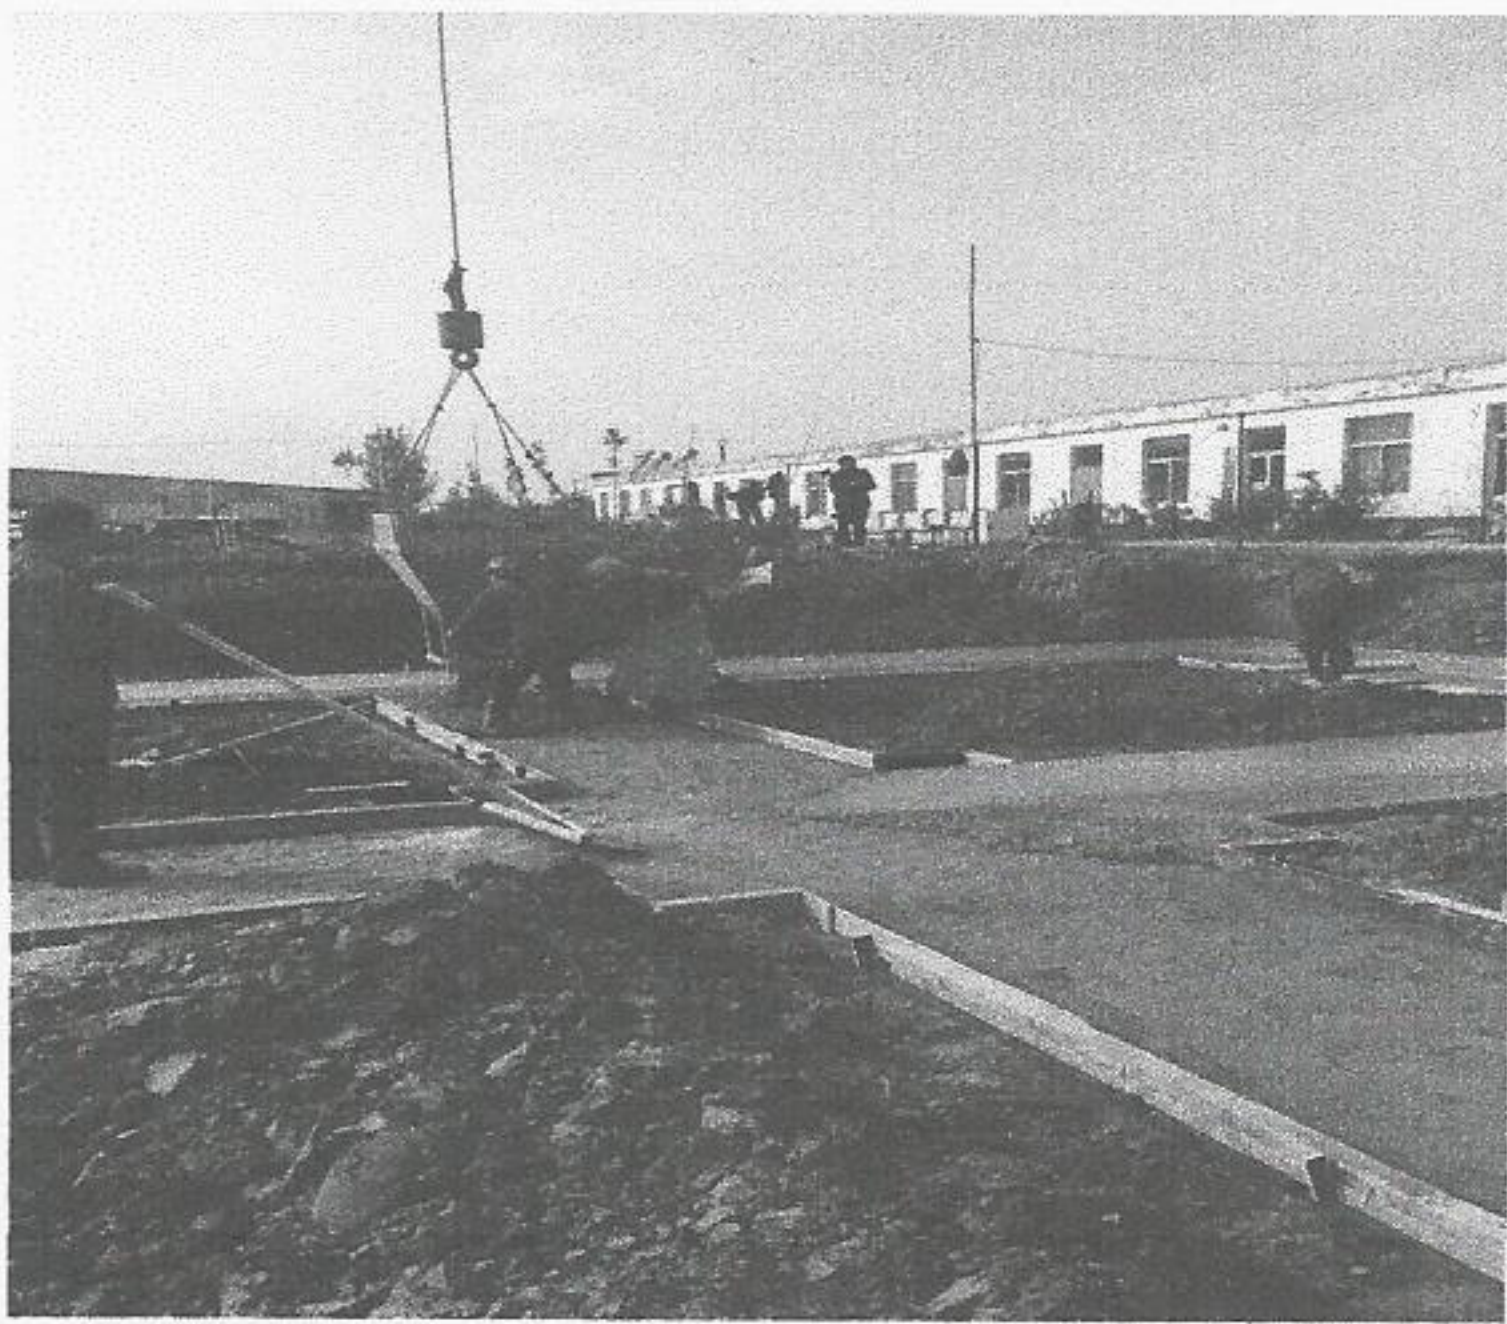
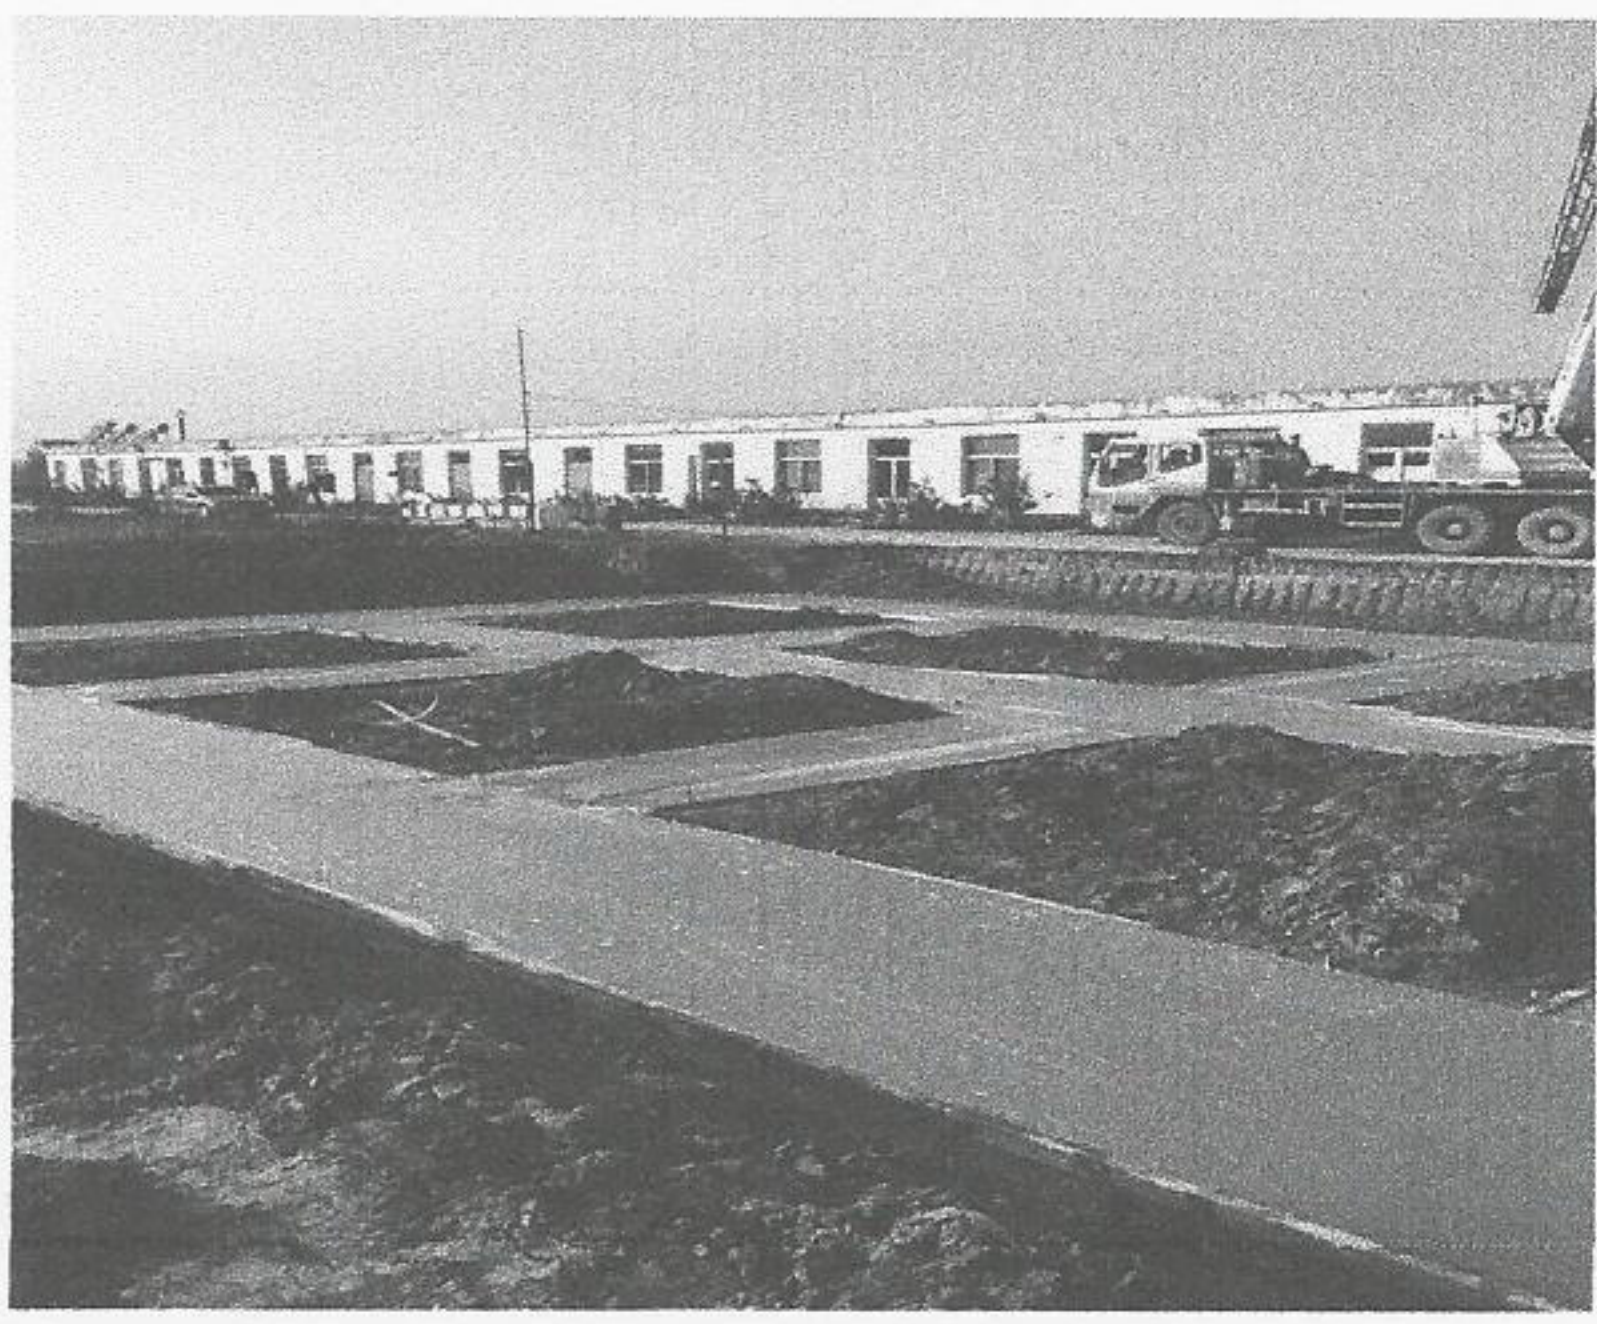


旁站监理记录表

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

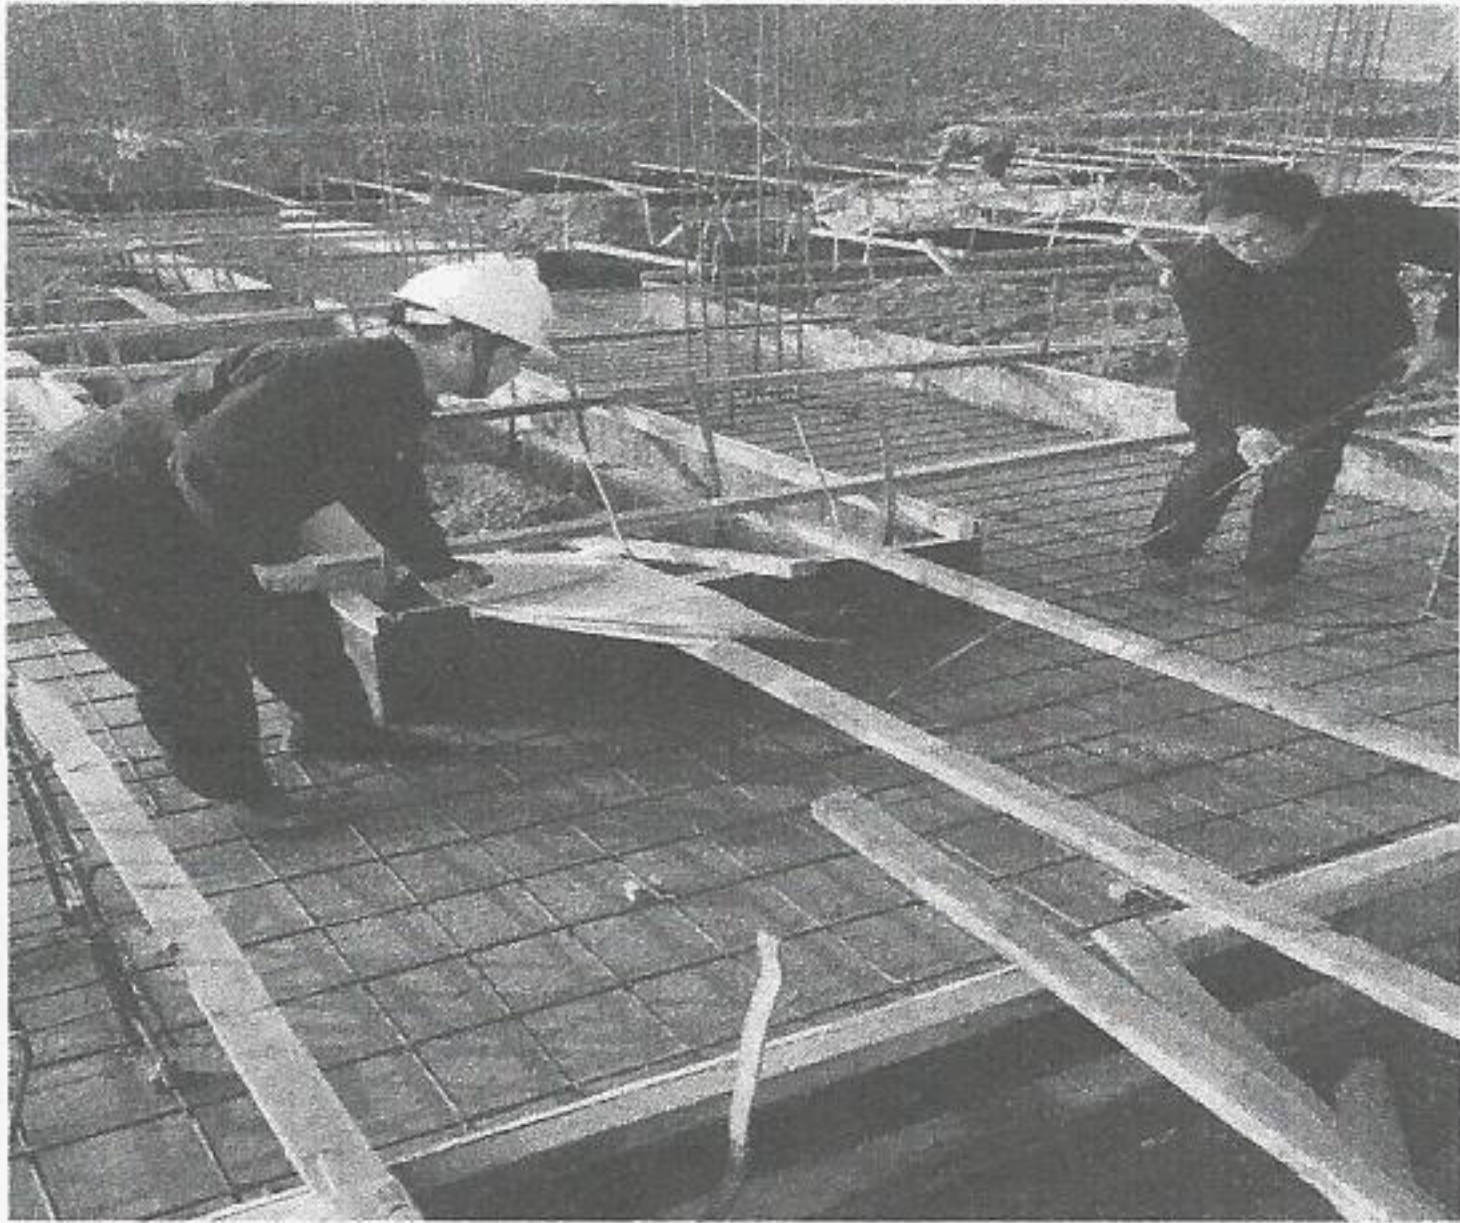
日期及气候: 2016 年 11 月 01 日	工程地点: 山东省淄博市高青县布莱凯特科技新城
旁站监理的部位或工序: 开关站基础垫层混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2016.11.01 13:40	旁站监理结束时间: 2016.11.01 16:20
施工情况: 准备: 1、山东淄博巨能电力工程有限公司施工负责人高山, 施工人员 7 人。2、主要设备: 1 台混凝土罐车、震动棒 1 台、铁抹子、吊车、吊斗、铁锹; 3、砼强度等级 C15 商品砼。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题: 施工作业前, 施工人员未佩戴安全帽	
处理意见: 带施工作业人员佩安全帽后方可进行施工	
备 注:	
施工项目部: 淄博巨能电力工程有限公司 质 检 员: <u>高山</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>01</u> 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>于强</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>01</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-002

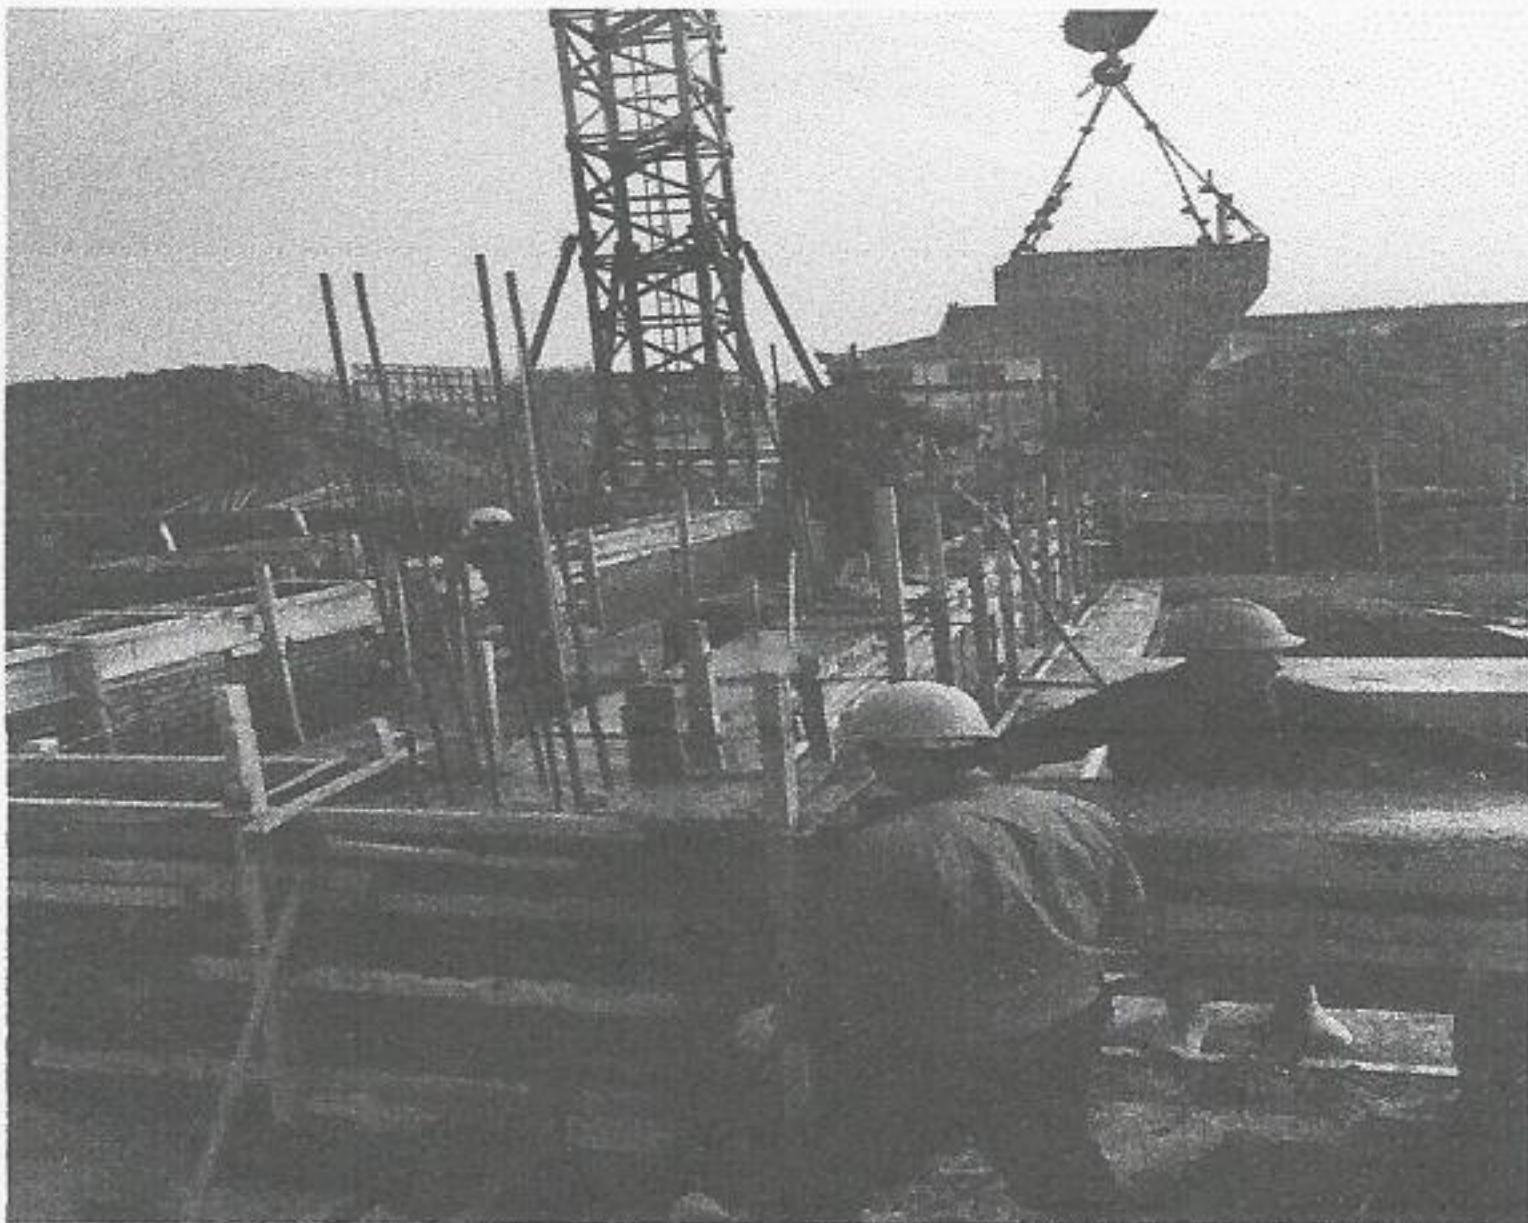
日期及气候: 2016 年 11 月 04 日	工程地点: 山东省淄博市高青县布莱凯特科技新城
旁站监理的部位或工序: 开关站基础承台混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2016.11.04 08:40	旁站监理结束时间: 2016.11.04 11:50
施工情况: 准备: 1、山东淄博巨能电力工程有限公司施工负责人高山, 施工人员 7 人。2、主要设备: 1 台混凝土泵车、震动棒 2 台、铁抹子、吊车、吊斗、铁锹; 3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题: 浇筑基础承台前, 操作面内有杂物未清理干净。	
处理意见: 施工人员将操作面内杂物清理干净后进行施工。	
备 注:	
施工项目部: 淄博巨能电力工程有限公司 质 检 员: <u>高山</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>04</u> 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>王强</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>04</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-003

日期及气候: 2016 年 11 月 10 日	工程地点: 山东省淄博市高青县布莱凯特科技新城
旁站监理的部位或工序: 开关站基础地圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2016.11.10 14:40	旁站监理结束时间: 2016.11.10 17:30
施工情况: 准备: 1、山东淄博巨能电力工程有限公司施工负责人高山, 施工人员 7 人。2、主要设备: 塔吊、1 台混凝土罐车、震动棒 2 台、铁抹子、吊斗、铁锹; 3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题: 混凝土质量不达标。	
处理意见: 要求施工单位现场做塌落度实验, 并且提高混凝土质量。	
备 注: 施工单位现已整改。	
施工项目部: 淄博巨能电力工程有限公司 质 检 员: <u>孙</u> 日 期: 2016 年 11 月 10 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>王</u> 日 期: 2016 年 11 月 10 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-004

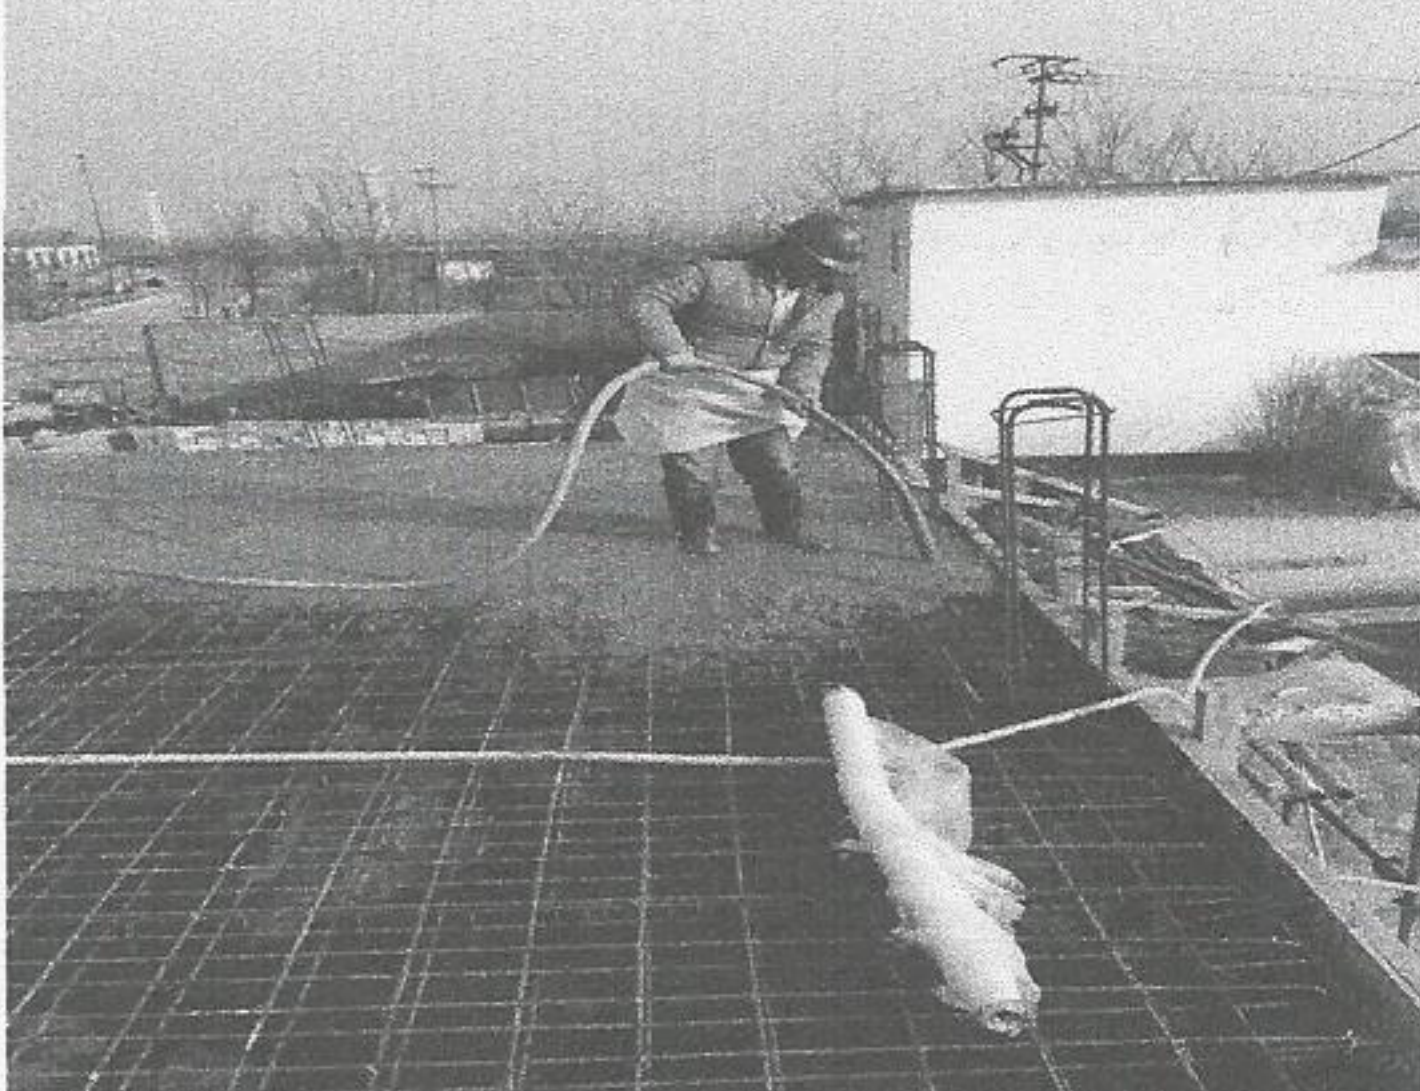
日期及气候: 2016 年 11 月 15 日	工程地点: 山东省淄博市高青县布莱凯特科技新城
旁站监理的部位或工序: 开关站综合楼土方回填	
旁站监理开始时间: 2016.11.15 9:00	旁站监理结束时间: 2016.11.15 11:00
施工情况: 准备: 1、山东淄博巨能电力工程有限公司施工负责人高山, 施工人员 7 人。2、主要设备: 铁锹、打夯机; 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→回填土运输到现场→回填土质量检查→回填→打夯。  	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位;	
发现问题: 1、回填土中杂质较多。2、部分角落打夯不充分。	
处理意见: 要求施工单位将不合格的回填土挖出, 待换为合格回填土后继续施工。打夯需充分。	
备 注: 施工单位已按照监理要求进行整改。	
施工项目部: <u>淄博巨能电力工程有限公司</u> 质 检 员: <u>邵</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>15</u> 日	监理项目部: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>邵</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>15</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-005

日期及气候: 2016 年 12 月 17 日	工程地点: 山东省淄博市高青县布莱凯特科技新城
旁站监理的部位或工序: 综合楼一层顶板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2016.12.17 14:00	旁站监理结束时间: 2016.12.17 18:20
施工情况: 准备: 1、山东淄博巨能电力工程有限公司施工负责人高山, 施工人员 7 人。2、主要设备: 1 台混凝土罐车、震动棒 2 台、铁抹子、塔吊、吊斗、铁锹; 3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部: 淄博巨能电力工程有限公司 质 检 员: <u>高</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>17</u> 日	监理项目部: 德州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>王峰</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>17</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-006

日期及气候: 2016 年 12 月 21 日	工程地点: 山东省淄博市高青县布莱凯特科技新城
旁站监理的部位或工序: 综合楼一层顶板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2016.12.21 13:00	旁站监理结束时间: 2016.12.21 17:20
施工情况: 准备: 1、山东淄博巨能电力工程有限公司施工负责人高山, 施工人员 7 人。2、主要设备: 1 台混凝土罐车、震动棒 2 台、铁抹子、塔吊、吊斗、铁锹; 3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺: 基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部: 淄博巨能电力工程有限公司 质 检 员: <u>高</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>21</u> 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>王</u> 日 期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>21</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。
