

旁站监理记录表

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

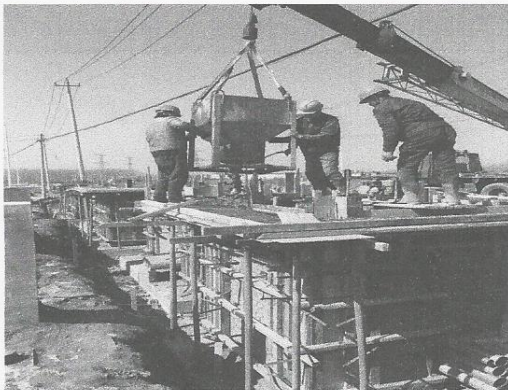
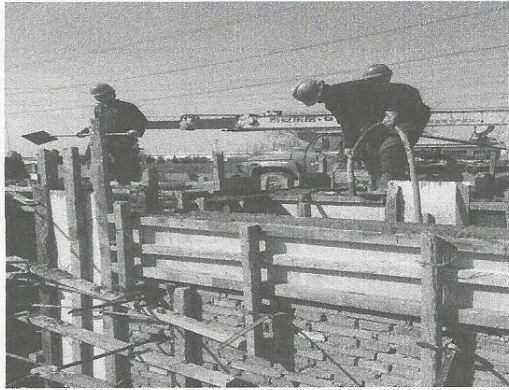
编号:ZHJL-PZJL-001

日期及气候: 2016.11.7 晴 3-13 ℃	施工地点: 华骏物流园
旁站监理的部位或工序: 组件吊装	
旁站监理开始时间: 2016.11.7 08: 30	旁站监理结束时间: 2016.11.7 9: 30
施工情况: 本次施工的是组件吊装。 机械: 吊车一台; 人员: 安全员、施工人员、施工方经理 本次吊装的是十一号厂房, 吊装组件到屋面, 立即拆箱分散, 再将托盘纸箱吊下。 吊装过程由施工方经理进行查看。	
监理情况: 1、监理进行现场技术、安全交底, 全场跟踪。 2、发现吊装出现偏移情况。	
发现问题: 组件吊装偏移,。	
处理意见: 要求施工方落地重新找平后吊装。	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: <u>安徽三建建设工程有限公司</u> 质 检 员: <u>徐思奎</u> 日 期: 2016年11月07日	项目监理机构: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目 项目监理部 旁站监理人员: <u>赵淑庭</u> 日 期: 2016年11月07日

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-002

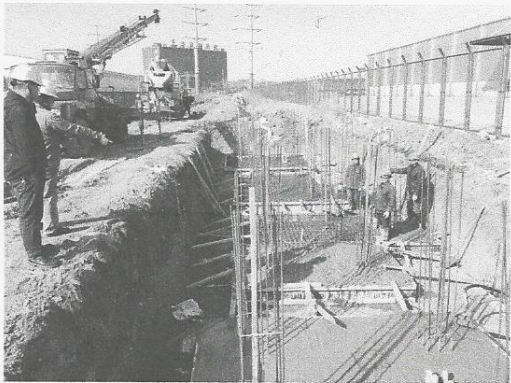
日期及气候：2017 年 03 月 06 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：5、6、7 箱变基础顶板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.03.06 11:00	旁站监理结束时间：2017.03.06 16:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。	
 	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：混凝土振捣不充分	
处理意见：充分振动，使表面产生浮浆为止	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：17 年 03 月 06 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王强 日 期：2017 年 03 月 06 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-003

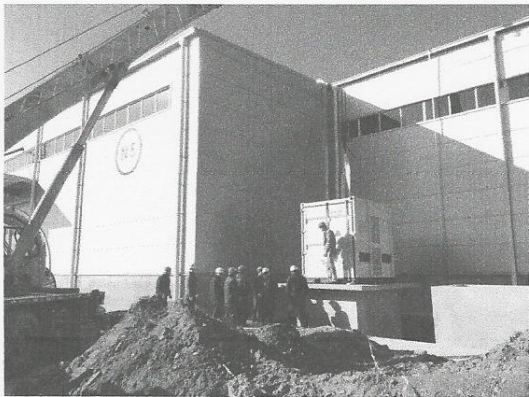
日期及气候：2017 年 03 月 06 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：5、6、7 箱变基础顶板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.03.06 09:00	旁站监理结束时间：2017.03.06 11:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。	
 	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：混凝土振捣不充分	
处理意见：充分振动，使表面产生浮浆为止	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：2017 年 03 月 06 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王研 日 期：2017 年 03 月 06 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-004

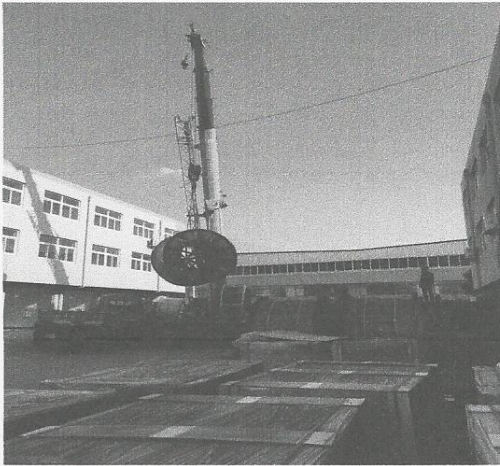
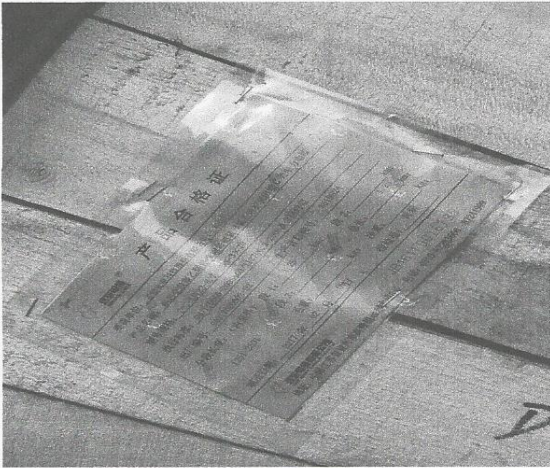
日期及气候: 2017 年 03 月 07 日	工程地点: 华骏物流园
旁站监理的部位或工序: 13、14#箱变逆变基础旁	
旁站监理开始时间: 2017.03.07 10:00	旁站监理结束时间: 2017.03.07 12:50
施工情况: 准备: 1、安徽三三建设工程有限公司负责人徐思奎, 施工人员 8 人。 2、主要设备: 叉车一台  	
监理情况: 1、审查支架出厂资料 and 检查现场支架外观质量是否合格。 2、检查施工单位管理人员及特殊工种人员均已到位, 特殊工种均持证上岗。 3、机械设备已验收合格性能良好。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 安徽三三建设工程有限公司 质 检 员: <u>于军斌</u> 日 期: <u>17</u> 年 <u>03</u> 月 <u>07</u> 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>王保</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>03</u> 月 <u>07</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-005

日期及气候：2017 年 03 月 07 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：电缆卸货现场	
旁站监理开始时间：2017.03.07 16:00	旁站监理结束时间：2017.03.07 16:50
施工情况： 准备：1、安徽三三建设工程有限公司负责人徐思奎，施工人员 6 人。 2、主要设备：叉车一台  	
监理情况： 1、审查支架出厂资料 and 检查现场支架外观质量是否合格。 2、检查施工单位管理人员及特殊工种人员均已到位，特殊工种均持证上岗。 3、机械设备已验收合格性能良好。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：安徽三三建设工程有限公司 质 检 员：徐思奎 日 期：2017 年 03 月 07 日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张喜君 日 期：2017 年 03 月 07 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-006

日期及气候：2017 年 03 月 18 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：15、16#箱变基础顶板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.03.18 8: 20	旁站监理结束时间：2017.03.18 11:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：17 年 03 月 18 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王 斌 日 期：2017 年 03 月 18 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-007

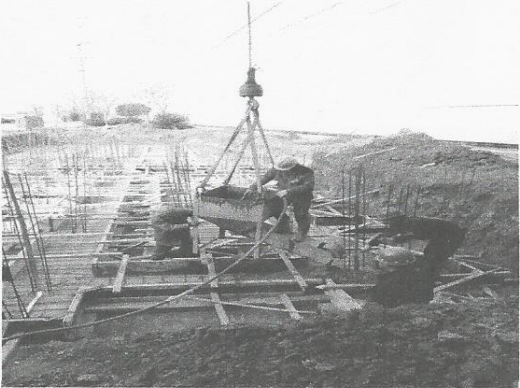
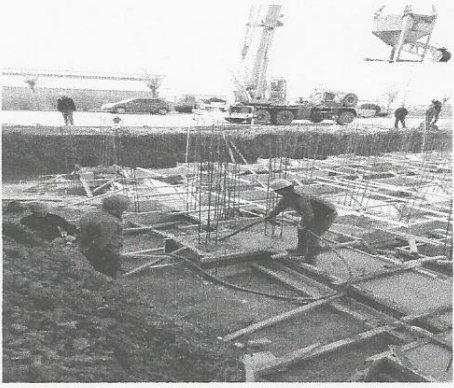
日期及气候：2017 年 03 月 19 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：1#开关站基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2017.03.19 8:00	旁站监理结束时间：2017.03.19 10:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：混凝土振捣不充分	
处理意见：充分振动，使表面产生浮浆为止	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：17 年 03 月 19 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王磊 日 期：2017 年 03 月 19 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-008

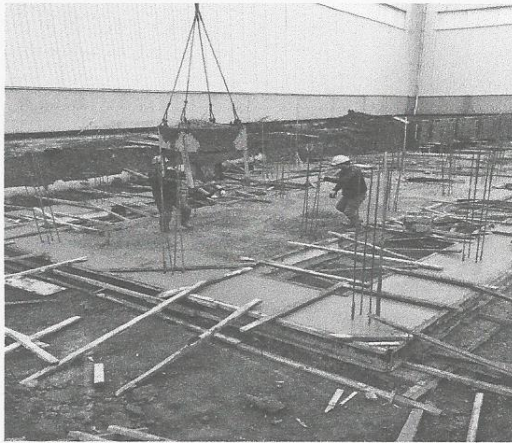
日期及气候：2017 年 03 月 23 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：1#开关站基础承台混凝土浇注	
旁站监理开始时间：2017.03.23 8:00	旁站监理结束时间：2017.03.23 10:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：17 年 03 月 23 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王强 日 期：2017 年 03 月 23 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-009

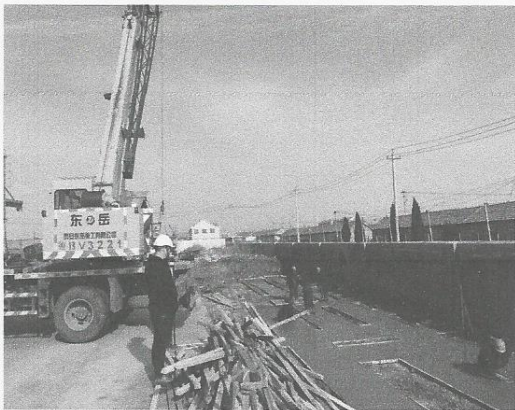
日期及气候：2017 年 03 月 25 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：1#开关站基础承台混凝土浇注	
旁站监理开始时间：2017.03.25 9:10	旁站监理结束时间：2017.03.25 12:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：振捣不充分	
处理意见：充分振捣直至出现浮浆	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：17 年 03 月 25 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王研 日 期：2017 年 03 月 25 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-010

日期及气候：2017 年 04 月 02 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序： 1#开关站基础承台混凝土浇注	
旁站监理开始时间：2017.04.02 14:10	旁站监理结束时间：2017.04.02 16:50
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：现场浇注垫层厚度不达标	
处理意见：按规范设计要求施工	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：17 年 04 月 02 日	 监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王强 日 期：2017 年 04 月 02 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。
