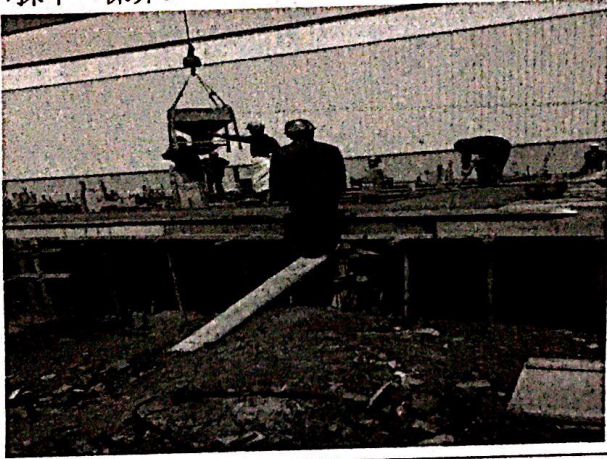


旁站监理记录表

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-012

日期及气候：2017 年 04 月 18 日	工程地点：华骏物流园
旁站监理的部位或工序：2#开关站	
旁站监理开始时间：2017.04.18 7:00	旁站监理结束时间：2017.04.18 17:30
施工情况： 准备：1、青岛良达机电安装有限公司现场负责人于平钦，施工人员 8 人。2、主要设备：1 台混凝土罐车、1 台吊车、1 台震动棒、铁锹、铁抹子；3、砼强度等级 C30 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。	
	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土现场取样同条件 1 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：混凝土振捣不充分	
处理意见：充分振动，使表面产生浮浆为止	
备 注：	
施工项目部：青岛良达机电安装有限公司 质 检 员：于平钦 日 期：2017 年 04 月 18 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王 强 日 期：2017 年 04 月 18 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。
