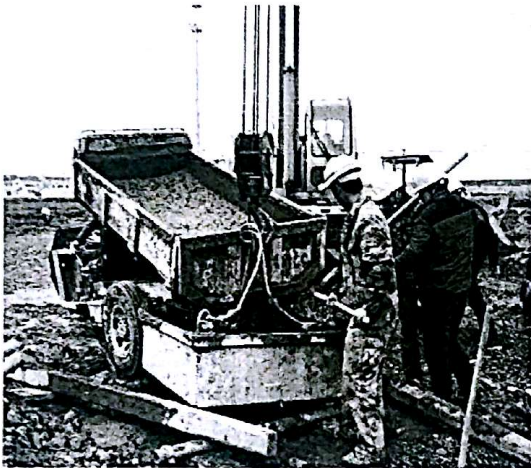
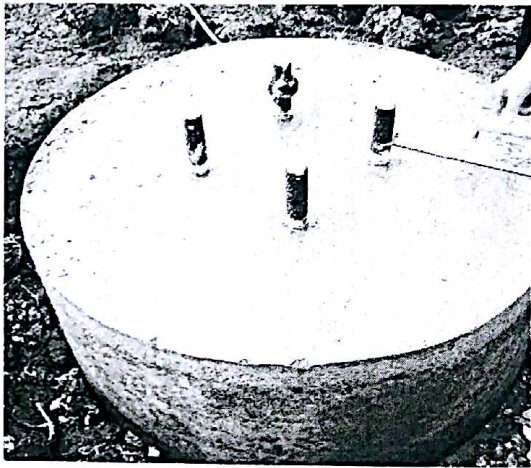


旁站监理记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 (通威 40MWp 渔光一体项目 35Kv 送电线路) 编号: ZHJL-001

日期及天气: 2017. 3. 17 阴	施工单位: 杭州交联电气工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 基础混凝土浇筑 (T14#塔 2、3 号脚浇筑混凝土)	
旁站监理开始时间: 12:30	旁站监理结束时间: 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 浇筑混凝土前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底, 然后开始施工。   监理情况: 监理人员检查钢筋的型号、规格、间距及绑扎情况, 均符合设计要求。商品混凝土运到现场, 检查产品合格证及检验证明。要求制作试块, 标准养护试件作为验证配合比依据。浇筑时要求表面没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后进行保湿养护。 发现的问题及处理情况: 无 旁站监理人员 (签字): 焦春连 2017 年 3 月 17 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
