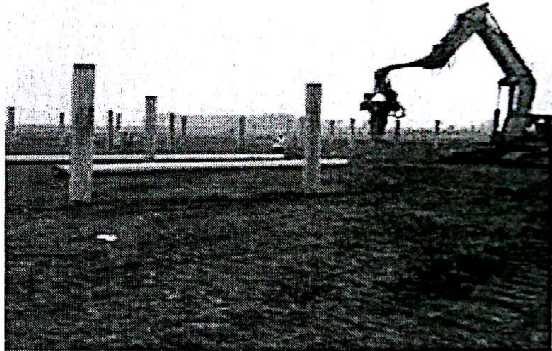


旁站监理记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 编号: ZHJL-002

日期及气候: 2016.10.19 阴	工程地点: 南京市六合区龙袍街道
旁站监理的部位或工序: 预应力管桩安装 (6 区打桩作业)	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人员、机械设备进场, 工器具准备完毕。首先我监理部人员对管桩进行抽查检验合格后, 由施工负责人徐颜作施工交底, 然后开始工作。   监理情况: 现场对预应力管桩进行抽查, 包括长度、直径、观感质量检验合格后开始施工。打桩前以每一个子阵为单位, 对高度、垂直度进行调整立桩, 然后以此桩为基准, 进行打桩作业。施工过程中, 要求施工人员做好安全防护工作, 保障人身安全。 现场施工机械运转正常, 施工工艺等均符合要求。 发现的问题及处理情况: 桩基垂直度偏差大, 影响后期支架、组件安装。 要求施工方立即返工整改, 保证工程质量。	
旁站监理人员 (签字): 王洪光 2016 年 10 月 19 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
