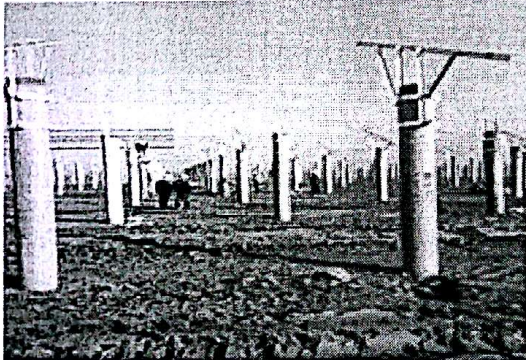
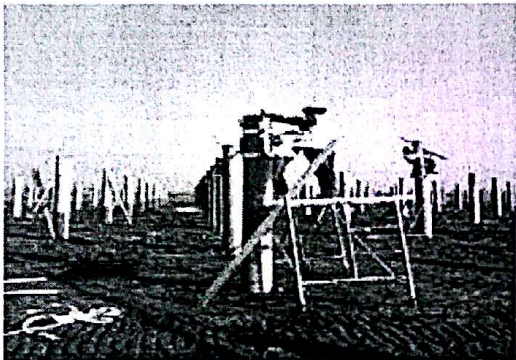


JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 编号: ZHJL-003

日期及气候: 2016.11.1 晴	工程地点: 南京市六合区龙袍街道
旁站监理的部位或工序: 光伏 6 区支架安装	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人员到达现场, 工器具准备完毕 (扳手、钢卷尺、水平尺、小线、角度尺)。监理部人员对桩基轴线及管桩垂直度进行检查, 合格后由施工负责人作施工技术安全交底, 然后开始工作。 	
监理情况: 施工顺序: 安装抱箍、立柱→安装斜撑→安装斜梁→安装檩条→安装加强拉筋 (斜拉)。施工过程采用拉线的方式保持水准度及垂直度。支架外观表面光洁、无毛刺, 倾角度与水平度误差满足要求。各零部件安装可靠牢固, 紧固件已按照一螺栓一螺母、两平垫一弹垫的方式进行安装。经检查, 支架安装符合要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王洪亮 2016 年 11 月 1 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
