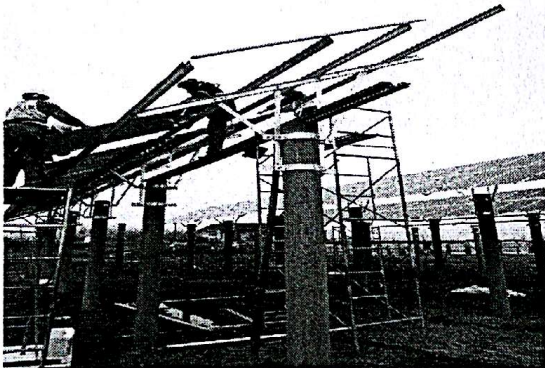
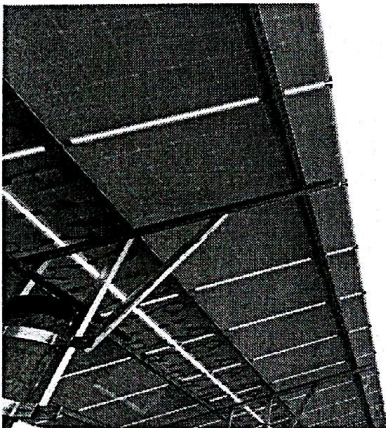



旁站监理记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 编号: ZHJL-008

日期及气候: 2016. 12. 10 晴	工程地点: 南京市六合区龙袍街道
旁站监理的部位或工序: 6 区组件安装	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工安装人员到达现场, 工器具已准备。由施工领班进行安装交底, 然后开始工作。将组件正面朝上放置在支架上, 将组件与支架通过紧固件固定在支架上, 校正方位偏差, 符合要求后, 进行紧固。   监理情况: 现场监理人员要求安装人员做好安全防护, 对支架的平整度及倾角度进行检查, 不合格的要求施工方进行调整, 由于是双玻组件, 要求 4 人一组上下配合进行安装。要求安装人员对组件中的任意部位螺丝要紧固到位, 已安装好的组件, 要求施工单位质检人员进行检查, 有松动的地方要及时调整紧固。经检查安装质量符合要求。 发现的问题及处理情况: 无 旁站监理人员 (签字):  2016 年 12 月 10 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
