

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目园

日期及气候：2017年02月28日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村


旁站监理的部位及工序：主变基础及构架基础砼浇筑旁站

旁站监理开始时间：09:30

旁站监理结束时间：11:40

施工情况：

施工人员按照图纸要求和规范，对现浇板钢筋规格型号、间距及模板加固验收合格后，要求对预埋的钢筋进行焊接加固，对框架主体钢筋、模板进行冲洗，混凝土为商砼站提供，使用泵车输送，混凝土为C30，共计：35m³，现场施工人员8人，管理人员2人。

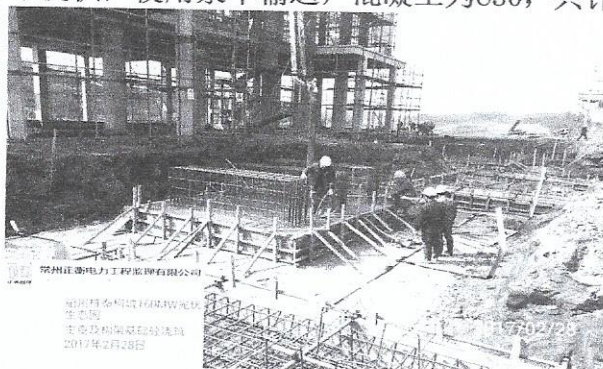

主变基础及构架基础砼浇筑旁站

监理情况：

- 1、浇筑前检查振捣器具齐全；
- 2、要求施工技术、安全管理人员到场，钢筋工、木工配合施工；
- 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全；
- 4、现场检测塌落度140mm~160mm，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程；
- 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。

发生情况：现场检查主变基础以上钢筋未按要求进行加固。

处理意见：对现场主变主体钢筋焊接加固处理，满足施工要求。

施工企业：德京集团股份有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：叶宏斌

项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏发电项目监理项目部

质检员（签字）：朱祥安
2017年02月28日

旁站监理人员（签字）：
2017年02月28日
