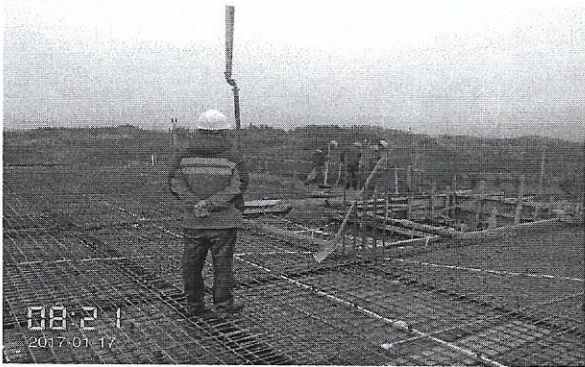
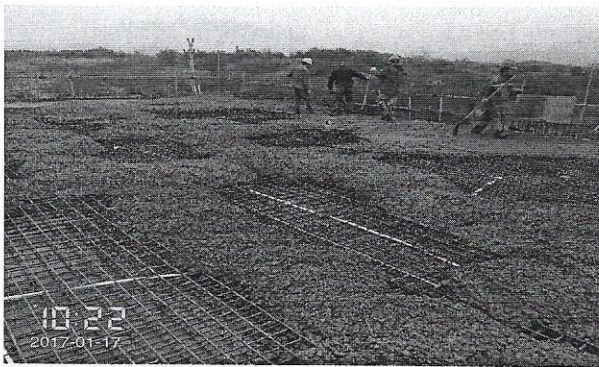


旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候：2017年01月17日 晴		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：主控楼二层柱子三层梁板			
旁站监理开始时间： 8:00		旁站监理结束时间： 13:40	
施工情况： 施工人员按照图纸要求和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，要求用水进行冲洗，现场使用泵车输送（97m³）使用振捣器具两台，采用商混标号C30混凝土浇筑基础框架梁，柱作业。   主控楼二层柱子三层梁板			
监理情况： 现场检查开盘鉴定，做砼养标养同养试块各一组，现场检测塌落度140~160，现场跟踪浇筑过程。			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：德京集团股份有限公司 项目经理部：叶宏斌 质检员（签字）：黄祥安 2017年 1 月 17 日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部 旁站监理人员（签字）：张磊 2017年01月17日	
