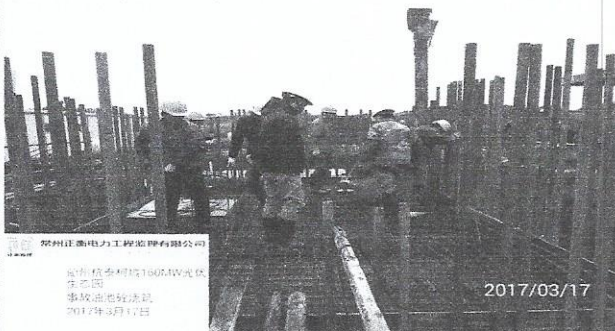
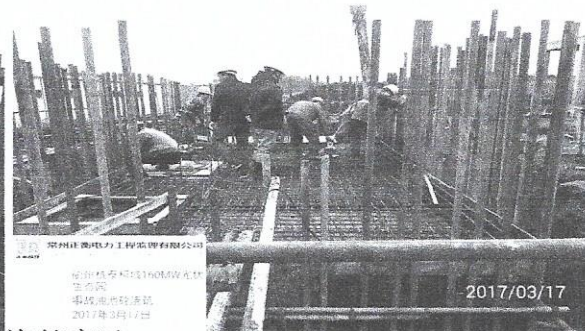


旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目园

日期及气候：2017年03月17日 小雨		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：事故油池砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间：07: 00		旁站监理结束时间： 09 :00	
施工情况： 施工人员按照图纸要求和规范，对现浇钢筋规格型号、模板间距及标高复核验收合格后，要求对现浇的底部钢筋网保护层高度对照设计重新调整，对主体钢筋底板进行冲洗，混凝土为商砼站提供，使用泵车输送，混凝土为C30P6，共计：28m³ p6，现场施工人员8人，管理人员3人。			
 常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 事故油池砼浇筑旁站 2017年03月17日		 常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 事故油池砼浇筑旁站 2017年03月17日	
事故油池砼浇筑旁站			
监理情况： 1、浇筑前检查振捣器具齐全； 2、要求施工技术、安全管理人员到场，钢筋工、木工配合施工； 3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全； 4、现场检测塌落度140mm~160mm，做砼标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程； 5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。			
发生情况：现场检查发现事故油池顶部预留洞口钢筋未按设计要求进行调整。			
处理意见：对现场事故油池底部基础钢筋网重新调整保护层厚度达到设计要求后再浇筑，满足施工要求。			
施工企业：德京集团股份有限公司 项目经理部：叶宏斌 质检员（签字）：黄祥安 2017年 3月 17日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：张顶 2017年03月17日	
