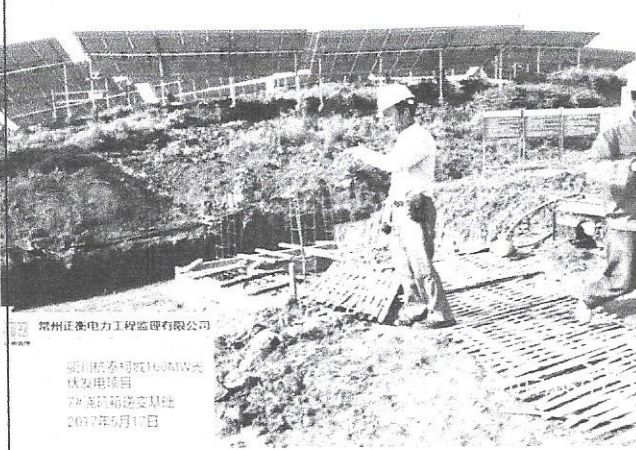


旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年5月17日 晴		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：光伏7区箱逆变基础浇筑			
旁站监理开始时间：13:20		旁站监理结束时间：16:50	
施工情况： 钢筋绑扎验收合格后，模板内杂物清理干净，要求用水进行冲洗，现场使用C30防水混凝土浇筑，施工人员严格振捣。监理旁站监督；有振捣不到位的地方及时指出整改。  			
监理情况： 1、浇筑前检查钢筋的规格尺寸、绑扎间距质量符合规范要求； 2、要求施工技术负责人在现场旁站； 3、检查构造柱绑扎间距；照明线管铺设符合图纸设计要求； 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程； 5、全程跟踪浇筑过程； 6、浇筑厚度符合图纸设计要求。			
发生情况：发现有漏振的地方			
处理意见：及时补振			
施工企业：德京集团股份有限公司 项目经理部：叶家斌 质检员（签字）：费祥安 2017年5月17日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部 旁站监理人员（签字）：徐强生 2017年5月17日	
