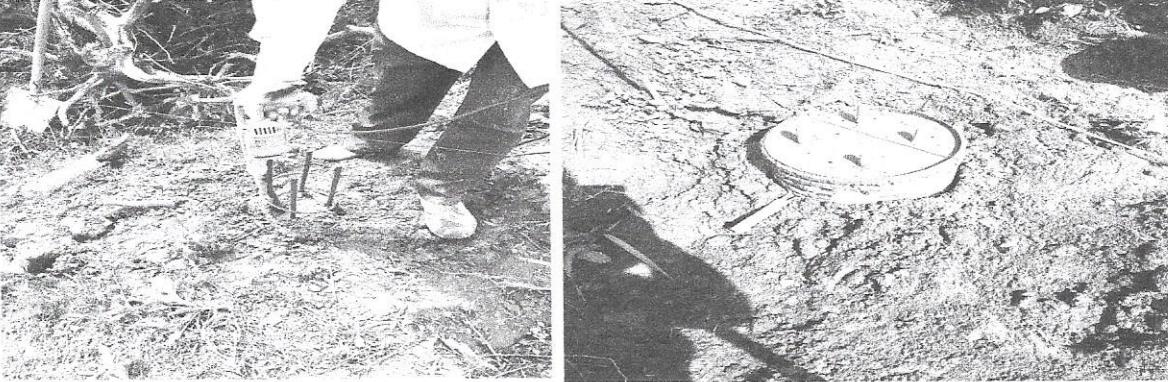


旁站监理记录表

工程名：衢州航泰柯城160MW光伏生态公园

日期及气候：2017年04月23日	工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序：15MW光伏区FZ-013区桩基浇筑	
旁站监理开始时间：13:40	旁站监理结束时间：15:30
<p>施工情况：</p> <p>施工人员按照图纸和规范要求，进行钢筋绑扎，验收合格，要求用水泵把孔内积水抽干后，立即灌注混凝土，现场使用人工运送混凝土，采用砼标号C30混凝土浇筑桩基作业。</p>  <p>15MW光伏FZ-013区桩基浇筑</p>	

监理情况：

- 1、要求施工技术人员到场，对现场工人进行技术交底
- 2、检查钢筋笼焊接及笼标高符合要求
- 3、孔深，孔径检查、孔内无积水无浮土。
- 4、浇筑前检查振捣器具齐全
- 5、现场检测塌落度170，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程
- 6、监理全程旁站跟踪浇筑过程。

发生情况：无

处理意见：无

施工企业：鲲鹏建设集团有限公司

项目经理部：谢军才

质检员（签字）：张虎

2017年4月23日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：衢州航泰柯城160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）：谭绪宝

2017年4月23日
