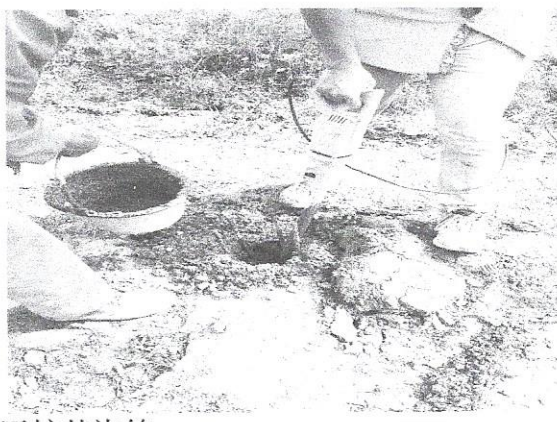





旁站监理记录表

工程名： 衢州航泰柯城160MW光伏生态公园

日期及气候： 2017年04月25日	工程地点： 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序： 15MW光伏区FZ-014区桩基浇筑	
旁站监理开始时间： 08:40	旁站监理结束时间： 11:30
施工情况： 施工人员按照图纸和规范要求，进行钢筋绑扎，验收合格，要求用水泵把孔内积水抽干后，立即灌注混凝土，现场使用人工运送混凝土，采用砼标号C30混凝土浇筑桩基作业。   15MW光伏FZ-014区桩基浇筑	
监理情况： 1、要求施工技术人员到场，对现场工人进行技术交底 2、检查钢筋笼焊接及笼标高符合要求 3、孔深，孔径检查、孔内无积水无浮土。 4、浇筑前检查振捣器具齐全 5、现场检测塌落度172，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程 6、监理全程旁站跟踪浇筑过程。	
发生情况：无	
处理意见：无	
施工企业：鲲鹏建设集团有限公司 项目经理部：  质检员（签字）：  2017年 4月 25日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州航泰柯城160MW光伏生态公园监理项目部 旁站监理人员（签字）：  2017年 4月 25日
