

## 旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-

日期：2017 年 8 月 4 日

工程地点：34 区

气候：晴


旁站监理的部位或工序：光伏 FZ-34 区灌注桩浇筑

旁站监理开始时间：8 时 00 分

旁站监理结束时间：10 时 00 分

施工情况：

施工人员已做好现场技术交底，按照施工图纸及规范要求，进行桩孔清理，绑扎钢筋，桩孔深度测量，经验收，符合标准，施工人员采用人工运送混凝土，采用 C30 强度等级混凝土浇筑桩基作业

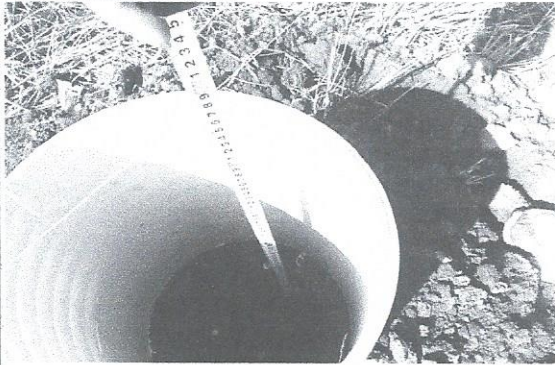

监理情况：

- 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位；
- 3、检查其桩孔深度、孔径
- 4、检查钢筋笼绑扎情况，对桩孔内渣土要求进行清理，均符合标准
- 5、监理全程旁站跟踪浇筑过程

发现问题：浇筑过程中振捣不均匀

处理意见：要求进行重新振捣，对所有桩基浇筑振捣要均匀，

备注：

项目部：中易建设有限公司

项目监理部：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

质检员：宋西月  
17 年 8 月 5 日

旁站监理员：李道春  
2017 年 8 月 5 日
