

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年4月25日 晴 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村


旁站监理的部位及工序：配电楼西侧避雷针基础浇筑

旁站监理开始时间：13:40

旁站监理结束时间：16:00

施工情况：

施工人员安装设计图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，模板内杂物清理干净，要求用水进行冲洗，现场使用搅拌机自拌混凝土，按照一定的水泥、沙、碎石比例，拌成C30混凝土浇筑作业。

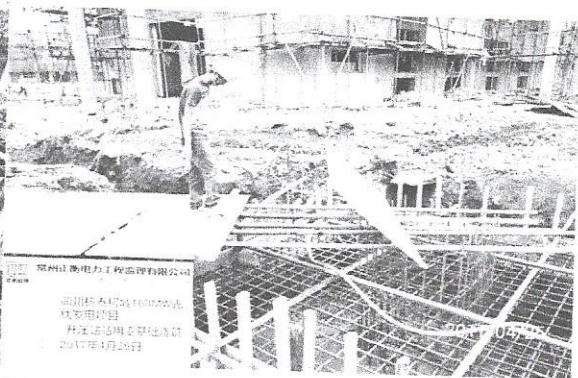

监理情况：

- 1、浇筑前检查钢筋的直径、绑扎间距质量；
- 2、要求施工技术负责人；
- 3、检查钢筋尺寸、绑扎间距；
- 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程；
- 5、全程跟踪浇筑过程；
- 6、浇筑厚度符合设计要求。

发生情况：无

处理意见：无

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：叶宏斌

质检员（签字）：张祥安
2017年4月25日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部

旁站监理人员（签字）：陈永生
2017年4月25日
