

# 旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年5月13日 晴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村


旁站监理的部位及工序：升压站西围墙砼浇筑

旁站监理开始时间：13:20

旁站监理结束时间：16:50

**施工情况：**

钢筋绑扎验收合格后，模板内杂物清理干净，要求用水进行冲洗，现场使用C30防水混凝土浇筑，施工人员严格振捣。监理旁站监督；有振捣不到位的地方及时指出整改。

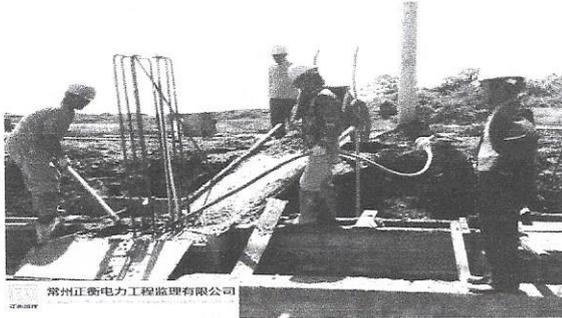

**监理情况：**

- 1、浇筑前检查钢筋的规格尺寸、绑扎间距质量符合规范要求；
- 2、要求施工技术负责人在现场旁站；
- 3、检查构造柱绑扎间距；照明线管铺设符合图纸设计要求；
- 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程；
- 5、全程跟踪浇筑过程；
- 6、浇筑厚度符合图纸设计要求。

发生情况：发现有漏振的地方

处理意见：及时补振

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：蔡永亮

质检员（签字）：[Signature] 2017年5月13日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：监理衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目监理部

旁站监理人员（签字）：[Signature] 2017年5月13日
