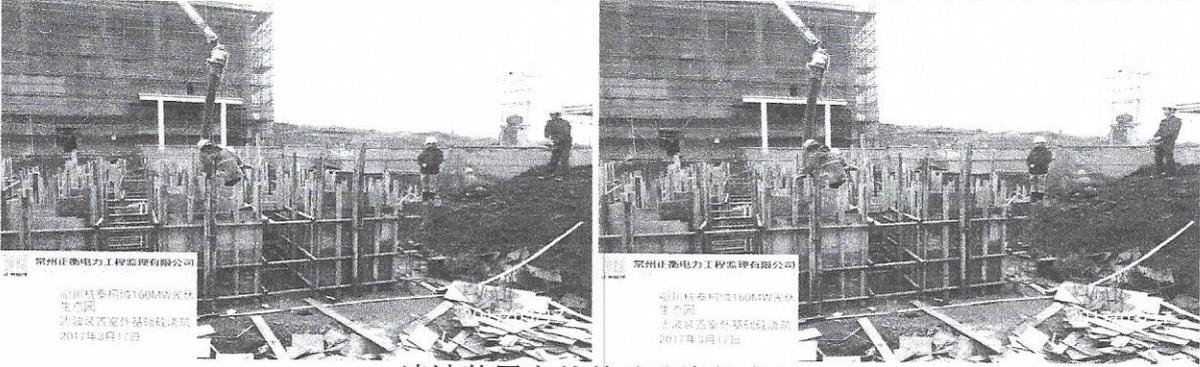


# 旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目园

日期及气候：2017年03月17日 小雨	工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序：滤波装置室外基础砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间： 11:00	旁站监理结束时间： 15 :50
<p><b>施工情况：</b></p> <p>施工人员按照图纸要求和规范，对现浇板钢筋规格型号、间距及模板加固验收合格后，要求对预埋的钢筋进行焊接加固，对框架主体钢筋、模板进行冲洗，混凝土为商砼站提供，使用泵车输送，混凝土为C30，共计：53m<sup>3</sup>，现场施工人员8人，管理人员2人。</p>	
 <p>滤波装置室外基础砼浇筑旁站</p>	
<p><b>监理情况：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑前检查振捣器具齐全；</li> <li>2、要求施工技术、安全管理人员到场，钢筋工、木工配合施工；</li> <li>3、检查混凝土进场开盘鉴定报告齐全；</li> <li>4、现场检测塌落度140mm~160mm，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程；</li> <li>5、对混凝土浇筑过程进行旁站监理。</li> </ol>	
发生情况：现场检查主变基础以上钢筋未按要求进行加固。	
处理意见：对现场主变主体钢筋焊接加固处理，满足施工要求。	
<p>施工企业：德京集团股份有限公司</p> <p>项目经理部：<i>叶永斌</i></p> <p>质检员（签字）：<i>黄祥安</i></p> <p style="text-align: right;">2017年 3 月 17 日</p>	<p>监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏发电项目监理项目部</p> <p>旁站监理人员（签字）：<i>张斌</i></p> <p style="text-align: right;">2017年 03 月 17 日</p>
